

## Settore III Lavori Pubblici AREA VIABILITA'



Provincia di Ancona

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2° Contratto</b><br><b>Applicativo</b> | <b>Oggetto:</b><br><b>2° Adesione all' ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 - RO DI ANCONA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                           | Lavori di riabilitazione della sovrastruttura stradale lungo la S.P. n. 4 "del Vallone" a tratti dal km 2+500 al km 9+000 circa Comune di Ancona, dal km 19+000 al km 19+500 circa nel Comune di Polverigi, dal km 25+000 al km 26+085 nel Comune di Santa Maria Nuova e S.P. n. 26 "di Castelfidardo" dal km 0+000 al km 04+321 nel Comune di Castelfidardo - RO di Ancona. |
|                                           | <b><u>ANNI 2027-2028</u></b><br><br><div style="text-align: right;"><i>Cod. Int. (99.01/3B)</i></div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Data Red.: AGO. 26                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1° Agg.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

**G**

|                                                                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE</p> <p><b>Dott. Ing. Alessia Montucchiari</b></p> | <p>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</p> <p><b>Dott. Ing. Monica Ulissi</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Documento informatico firmato digitalmente  
Ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.  
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

**PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

art. 100 - D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 (art. 1 Legge 3 Agosto 2007, n.123)

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Committente:</b> |                                                    |
| Ragione sociale:    | <b>Provincia di Ancona</b>                         |
| Sede:               | <b>Strada di Passo Varano, 19/A – 60131 Ancona</b> |
| C.F.:               | <b>00369930425</b>                                 |
| P.I.:               |                                                    |
| Tel.:               | <b>071 5894 1</b>                                  |
| PEC:                | <b>provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it</b>   |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cantiere:</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ubicazione cantiere                 | <b>2° Adesione all' ACCORDO QUADRO - LOTTO 3 - RO DI ANCONA</b><br><b>Lavori di riabilitazione della sovrastruttura stradale lungo la S.P. n. 4 "del Vallone" a tratti dal km 2+500 al km 9+000 circa Comune di Ancona, dal km 19+000 al km 19+500 circa nel Comune di Polverigi, dal km 25+000 al km 26+085 nel Comune di Santa Maria Nuova e S.P. n. 26 "di Castelfidardo" dal km 0+000 al km 04+321 nel Comune di Castelfidardo - RO di Ancona.</b><br><b><u>ANNI 2027-2028</u></b><br><div style="text-align: right;"><i>Cod. Int. (99.01/3B)</i></div> |
| Natura dell'opera:                  | <b>Lavori di riabilitazione della sovrastruttura stradale delle strade provinciali. – LOTTO 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inizio presunto dei lavori:         | <b>01/03/2027 primo tratto- 01/03/2028 secondo tratto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fine presunta dei lavori:           | <b>30/05/2027 primo tratto e 30/06/2026 secondo tratto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Importo totale presunto dei lavori: | <b>€ 956.828,24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Documento  | Data       | Piano di Sicurezza e Coordinamento | Tecnico                    |
|------------|------------|------------------------------------|----------------------------|
| Versione 1 | 10/08/2026 | Stesura                            | Dott. Ing. A. Montucchiari |

| Revisione | Data | Oggetto della revisione | Tecnico |
|-----------|------|-------------------------|---------|
| N         |      |                         |         |
| N.        |      |                         |         |
| N.        |      |                         |         |
| N.        |      |                         |         |

## **INDICE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

### **1. - DESCRIZIONE DELL'OPERA**

**1.1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'OPERA E INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

**1.2 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI**

**1.3 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI**

### **2. - PROCEDURE PER LA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DEL PIANO E ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI COINVOLTI**

**2.1 - INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DEL RAPPORTO UOMINI/GIORNI**

**2.2 - PROCEDURE**

**2.3 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COMMITTENTE**

**2.4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE**

**2.5 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

**2.6 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL'IMPRESA ESECUTRICE**

**2.7 - ANAGRAFICA DI CANTIERE**

### **3. - ANALISI DEI RISCHI DEL CANTIERE**

**3.1 – NATURA DEL TERRENO**

**3.2 – SERVIZI ESTERNI**

**3.3 – PRESENZA DI SOTTOSERVIZI**

**3.4 – PRESENZA DI ALTRI CANTIERI**

**3.5 – RISCHI TRASMESSI VERSO L'ESTERNO**

**3.6 – RISCHI PROVENIENTI DALL'ESTERNO**

**3.7 – RUMORE/ADEMPIMENTI PREVISTI**

**3.8 – VIBRAZIONI/ADEMPIMENTI PREVISTI**

#### **4. - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE**

**4.1 - DOCUMENTI CHE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA DOVRÀ TENERE IN CANTIERE**

**4.2 - ORGANIGRAMMA CANTIERE**

**4.3 - GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA DEL CANTIERE**

**4.4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE**

**4.5 - SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL CANTIERE - (LAY-OUT DI CANTIERE)**

**4.6 - PRONTO SOCCORSO/GESTIONE EMERGENZE/NUMERI TELEFONICI UTILI**

**4.7 - MACCHINE E ATTREZZATURE**

**4.8 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/ATTREZZATURE**

**4.9 - D.P.I.**

**4.10 - INFORMAZIONE**

#### **5. - IDENTIFICAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE - RELATIVI PERICOLI INFORTUNISTICI E D'ESPOSIZIONE - MISURE DI PREVENZIONE**

**5.1 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FASI LAVORATIVE**

#### **6. - PROGRAMMA DEI LAVORI**

**6.1 – CRONOPROGRAMMA**

#### **7. - IDENTIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE FASI SOVRAPPOSTE**

**7.1 – IDENTIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE FASI SOVRAPPOSTE**

#### **8. - VALUTAZIONE DEI COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**8.1 - VALUTAZIONE DEI COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

#### **9. - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

**9.1 - CRITERI SEGUITI PER LA REDAZIONE DEL P.S.C.**

**9.2 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

|                        |
|------------------------|
| <b><i>ALLEGATI</i></b> |
|------------------------|

**ALLEGATO 1** – TABELLA INFORMATIVA DI CANTIERE

**ALLEGATO 2** – LAY-OUT DI CANTIERE

**ALLEGATO 3** – FASI LAVORATIVE

**ALLEGATO 4** – ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

**1**

## **DESCRIZIONE DELL'OPERA**

**1.1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'OPERA E  
INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

**1.2 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI**

**1.3 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI**

## **1.1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'OPERA E INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

---

I lavori di riabilitazione interessano alcuni tratti delle strade provinciali denominate SP4 "del Vallone", SP26 "di Castelfidardo" che rientrano all'interno della zona di competenza del R.O. di Ancona per le annualità di finanziamento 2027 e 2028.

Con il sopralluogo effettuato si sono individuati i tratti nei quali è necessario intervenire a causa di avvallamenti, fessurazioni e cedimenti.

La S.P.4 "del Vallone" è una strada soggetta a livelli di traffico durante tutto il corso dell'anno in quanto collega vari Comuni dell'entroterra con il Comune di Ancona

Dal Km 02+500 circa al Km 09+000 si rilevano screpolature e avvallamenti oltre a cedimenti laterali circoscritti in particolare nel tratto tra il Km 2+500 e il Km 6+000.

La S.P. 26 "di Castelfidardo" è una strada mediamente trafficata e collega il centro del Comune di Castelfidardo con la S.S. 16 Adriatica.

Dal Km 0+000 – al Km 1+000 si rilevano screpolature e avvallamenti soprattutto in nei primi metri in corrispondenza dell'intersezione con la S.S. 16 Adriatica e dopo il ponte di recente realizzazione.

Dal Km 1+00 fino al Km 4+321 (fine del tratto di competenza) in corrispondenza delle curve oltre a screpolature e avvallamenti sono evidenti dislivelli dovuti a movimenti franosi.

Queste condizioni favoriscono l'infiltrazione di acqua piovana che è causa di avvallamenti e piccoli movimenti franosi ai margini della strada e la formazione di buche a seguito di piogge intense.

### **DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Per riabilitare i vari tratti di sovrastruttura stradale in oggetto migliorando la planarità del piano viabile e le pendenze trasversali per garantire un miglior smaltimento delle acque meteoriche, sono stati pensati i seguenti interventi in funzione della condizione attuali di ogni strada.

Per quanto riguarda la S.P. 4 "del Vallone" sono state previste alcune ricariche localizzate con conglomerato bituminoso tipo binder in corrispondenza degli avvallamenti più accentuati, mentre le fresature verranno realizzate in corrispondenza degli accessi presenti, delle attaccature e delle canalette laterali. Il tappeto di usura verrà invece realizzato su tutti i tratti oggetto di intervento mediante stesa di conglomerato bituminoso per uno spessore medio di 4 cm.

Per quanto riguarda la S.P.26 "di Castelfidardo" sono state previste alcune ricariche localizzate con conglomerato bituminoso tipo binder in corrispondenza degli avvallamenti più accentuati in presenza di cedimenti, mentre le fresature verranno realizzate in corrispondenza dell'intersezione con la S.S. 16 Adriatica e nel primo tratto dal Km 0+000 per tutta l'ampiezza della strada. Nei tratti successivi le fresature verranno eseguiti in presenza degli accessi, intersezioni e per le attaccature. Il tappeto di usura verrà invece realizzato su tutti i tratti oggetto di intervento mediante stesa di conglomerato bituminoso per uno spessore medio di 4 cm.

**1.2 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI****COMMITTENTE:**

|                 |                              |     |               |       |                                           |
|-----------------|------------------------------|-----|---------------|-------|-------------------------------------------|
| Ragione sociale | <b>PROVINCIA DI ANCONA</b>   |     |               |       |                                           |
| Sede            | Strada di Passo Varano, 19/A |     | CAP           | 60131 |                                           |
| Comune          | Ancona                       | Tel | 071 5894<br>1 | PEC   | provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it |

**PROGETTISTA:**

|            |                           |     |                |       |                                           |
|------------|---------------------------|-----|----------------|-------|-------------------------------------------|
| Nominativo | <b>Geom. Anna Barucca</b> |     |                |       |                                           |
| Sede       | Via Aspigo, 5/d           |     | CAP            | 60020 |                                           |
| Comune     | Offagna                   | Tel | 07172072<br>31 | PEC   | provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it |

**DIRETTORE LAVORI:**

|            |                           |  |                |       |                                           |
|------------|---------------------------|--|----------------|-------|-------------------------------------------|
| Nominativo | <b>Geom. Anna Barucca</b> |  |                |       |                                           |
| Sede       | Via Aspigo, 5/d           |  | CAP            | 60020 |                                           |
| Comune     | Offagna                   |  | 07172072<br>31 | PEC   | provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it |

**RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:**

|            |                                 |     |                 |       |                                           |
|------------|---------------------------------|-----|-----------------|-------|-------------------------------------------|
| Nominativo | <b>Dott. Ing. Monica Ulissi</b> |     |                 |       |                                           |
| Sede       | Strada di Passo Varano, 19/A    |     | CAP             | 60131 |                                           |
| Comune     | Ancona                          | Tel | 071 5894<br>640 | PEC   | provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it |

**COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE:**

|            |                                        |     |                 |       |                                           |
|------------|----------------------------------------|-----|-----------------|-------|-------------------------------------------|
| Nominativo | <b>Dott. Ing. Alessia Montucchiari</b> |     |                 |       |                                           |
| Sede       | Strada di Passo Varano, 19/A           |     | CAP             | 60131 |                                           |
| Comune     | Ancona                                 | Tel | 071 5894<br>419 | PEC   | provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it |

**COORDINATORE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI:**

|            |                                        |     |                 |       |                                           |
|------------|----------------------------------------|-----|-----------------|-------|-------------------------------------------|
| Nominativo | <b>Dott. Ing. Alessia Montucchiari</b> |     |                 |       |                                           |
| Sede       | Strada di Passo Varano, 19/A           |     | CAP             | 60131 |                                           |
| Comune     | Ancona                                 | Tel | 071 5894<br>419 | PEC   | provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it |

**DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE:**

|            |  |     |     |     |  |
|------------|--|-----|-----|-----|--|
| Nominativo |  |     |     |     |  |
| Sede       |  |     | CAP |     |  |
| Comune     |  | Tel |     | PEC |  |

### 1.3 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

---

Compiti dei soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. n. 81/2008).

#### **IL COMMITTENTE O IL RESPONSABILE DEI LAVORI**

- 1) Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere (comma 1 art 90):
  - si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15;
  - al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
- 2) Nella fase di progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) (*piano di sicurezza e coordinamento*) e b) (*fascicolo dell'opera*).
- 3) Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa (comma 3 art. 90) il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.
- 4) Prima dell'affidamento dei lavori, designa (comma 4 art. 90) il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.
- 5) Anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa (comma 9, art. 90):
  - verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  - chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

#### **OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE**

Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione (comma 1, art. 91):

- 1) Redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1 del D.Lgs. 81/08.
- 2) Predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al documento U.E. 26/05/93.

#### **OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Durante la realizzazione dell'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a (comma 1, art. 92):

- 1) Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- 2) Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza del cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.
- 3) Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
- 4) Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
- 5) Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (*obblighi dei lavoratori*

*autonomi*), 95 (*misure generali di tutela*) e 96 (*obblighi dei datori di lavoro*) e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 e proporre:

- la sospensione dei lavori,
- l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,
- o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro.

- 6) Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

### **OSSERVAZIONI E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 95 del D.Lgs. 81/08, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare (comma 1, art. 96):

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: (comma 1, art. 96):

- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se nel caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/08.

## **2**

### **PROCEDURE PER LA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DEL PIANO E ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI COINVOLTI**

**2.1 - INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DEL RAPPORTO UOMINI/GIORNI**

**2.2 - PROCEDURE**

**2.3 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COMMITTENTE**

**2.4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE**

**2.5 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

**2.6 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL'IMPRESA ESECUTRICE**

**2.7 - ANAGRAFICA DI CANTIERE**

## 2.1 - INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DEL RAPPORTO UOMINI/GIORNI

La stima fatta individua in 283 uomini/giorni (UU/GG) la manodopera necessaria, relativamente all'opera in oggetto.

Tale valutazione è ovviamente di stima, resta comunque un elemento base per l'attivazione delle procedure contemplate dal D.Lgs. n. 81/08.

Si traccia l'individuazione uomini/giorni attraverso dei parametri di natura economica, per tale ipotesi vengono considerati i seguenti valori:

- **Valore A :** *Importo di ogni singola categoria dei lavori;*
- **Valore B :** *Incidenza in % dei costi della mano d'opera di ogni singola categoria dei lavori.*
- **Valore C :** *Costo medio di un uomo per ogni giorno lavorativo (per l'occorrenza si prende in considerazione i costi di un operaio specializzato).*

$$\text{Rapporto UOMINI/GIORNI (UU/GG)} = \frac{A \times B}{C}$$

| CATEGORIA DEI LAVORI | Valore A<br>[€] | Valore B<br>[%] | Valore C<br>[€/giorno] | RAPP.<br>UU/GG |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Lavori stradali      | 956.828,24      | 7,00            | 210,00                 | 319            |
|                      | 848.305,28      |                 |                        | 319            |

## 2.2 - PROCEDURE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI | NO | ANNOTAZIONI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| <b>Screening preliminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |             |
| Prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea                                                                                                                                                                                                                                                       | X  |    |             |
| Durata lavori > a 200 uu/gg                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X  |    |             |
| Lavori con rischi particolari (allegato XI D.Lgs. 81/08)                                                                                                                                                                                                                                                           | X  |    |             |
| <b>Rischi particolari (allegato XI D.Lgs. 81/08)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |             |
| Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 ml o di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 ml, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera |    | X  |             |
| Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria                                                                                                    | X  |    |             |
| Lavori che espongono ad un rischio di annegamento                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | X  |             |
| Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | X  |             |
| Lavori comportanti l'impiego di esplosivi                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | X  |             |
| Lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati pesanti                                                                                                                                                                                                                                                 |    | X  |             |
| <b>Applicazione del D.Lgs n. 81/08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | X  |    |             |
| <b>Assunzione in prima persona da parte del Committente dell'applicazione del D.Lgs. n. 81/08</b>                                                                                                                                                                                                                  | X  |    |             |
| <b>Nomina Responsabile dei Lavori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | X  |             |
| <b>Nomina del Coordinatore della Progettazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | X  |    |             |
| <b>Nomina del Coordinatore dell'Esecuzione dei lavori</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | X  |    |             |
| <b>Adempiere all'obbligo di Notifica preliminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | X  |    |             |
| <b>Verifica dei requisiti tecnici professionali del Coordinatore della progettazione</b>                                                                                                                                                                                                                           | X  |    |             |
| <b>Verifica dei requisiti tecnici professionali del Coordinatore dell'Esecuzione dei lavori</b>                                                                                                                                                                                                                    | X  |    |             |

## 2.3 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COMMITTENTE

|                                                                                                                                                | SI | NO | ANNOTAZIONI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| Incarico a Responsabile dei lavori                                                                                                             |    | X  |             |
| Incarico a Coordinatore alla Progettazione                                                                                                     | X  |    |             |
| Incarico a Coordinatore dell'Esecuzione dei lavori                                                                                             | X  |    |             |
| Predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento                                                                                         | X  |    |             |
| Invio Notifica preliminare                                                                                                                     | X  |    |             |
| Inoltro all'impresa di copia della notifica preliminare per l'affissione della stessa in cantiere                                              | X  |    |             |
| Inoltro dei Piani di Sicurezza alle imprese invitate a presentare l'offerta                                                                    | X  |    |             |
| Comunicazione alle imprese dei nominativi dei Coordinatori                                                                                     | X  |    |             |
| Richiesta alle imprese esecutrici delle:                                                                                                       |    |    |             |
| a) iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o Albo Artigiani                                                                                               | X  |    |             |
| b) indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti                                                                     | X  |    |             |
| c) organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce effettuate all'INPS, INAIL, e Casse Edili. | X  |    |             |
| Verifica sulla messa a disposizione, da parte dell'impresa del Piano di Sicurezza e Coordinamento al:                                          |    |    |             |
| RLS dell'azienda.                                                                                                                              | X  |    |             |
| RLST (Rappresentante Dei Lavoratori Territoriale).                                                                                             |    | X  |             |

## 2.4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

---

|                                                                              | SI | NO | ANNOTAZIONI |
|------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| Redazione del <b>Piano di Coordinamento e Sicurezza</b>                      | X  |    |             |
| Predisposizione del <b>Fascicolo Tecnico</b>                                 | X  |    |             |
| Presa visione (se già esistente) del <b>Fascicolo Tecnico</b>                |    | X  |             |
| Stima dei <b>costi</b> per il <b>Piano di Sicurezza</b>                      | X  |    |             |
| Identificazione delle <b>fasi lavorative</b>                                 | X  |    |             |
| Identificazione delle <b>fasi lavorative che si svolgono simultaneamente</b> | X  |    |             |
| Identificazione della durata delle <b>fasi lavorative</b>                    | X  |    |             |

## 2.5 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

(da compilare a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)

|                                                                                                            | SI | NO | ANNOTAZIONI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| Presa visione del <b>Piano di Sicurezza e Coordinamento</b>                                                |    |    |             |
| Presa visione del <b>Fascicolo Tecnico</b>                                                                 |    |    |             |
| Azioni di coordinamento per l'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento                          |    |    |             |
| Adeguamento del <b>Piano di Coordinamento e Sicurezza</b>                                                  |    |    |             |
| Adeguamento del <b>Fascicolo Tecnico</b>                                                                   |    |    |             |
| <b>Informazione e coordinamento delle imprese</b> esecutrici e dei <b>lavoratori autonomi</b>              |    |    |             |
| Verifica l'affissione nel cantiere della copia della notifica preliminare inviata alla ASUR                |    |    |             |
| Verifica la presenza di regolare cartello di cantiere con le indicazioni previste dai disposti legislativi |    |    |             |
| Verifica degli accordi tra le parti sociali finalizzati al <b>coordinamento dei RLS</b>                    |    |    |             |
| Disposizioni impartite dal <b>Coordinatore</b>                                                             |    |    |             |

**2.6 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL'IMPRESA ESECUTRICE**

(da compilare ad appalto aggiudicato)

|                                                                                                                                  | SI | NO | ANNOTAZIONI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| Presa visione del <b>Piano di Sicurezza e Coordinamento</b>                                                                      |    |    |             |
| Presa visione del <b>Fascicolo Tecnico</b>                                                                                       |    |    |             |
| Messa a disposizione del <b>Piano di Sicurezza e Coordinamento</b> e/o del <b>Piano Generale di Sicurezza</b> nei confronti del: |    |    |             |
| – RLS dell'azienda                                                                                                               |    |    |             |
| – RLS territoriale                                                                                                               |    |    |             |
| Presa visione dei costi previsti dal <b>Piano di Sicurezza e Coordinamento</b>                                                   |    |    |             |
| Prequalificazione delle imprese di subappalto e/o di subfornitura art. 26 D.Lgs. n. 81/08                                        |    |    |             |
| Informazione delle imprese di subappalto e/o di subfornitura sui rischi presenti in cantiere                                     |    |    |             |
| Affissione nel luogo di lavoro della Notifica Preliminare                                                                        |    |    |             |
| Affissione del cartello di cantiere con indicati i nomi dei Coordinatori e dell'eventuale Responsabile dei lavori                |    |    |             |

## 2.7 - ANAGRAFICA DI CANTIERE

(da compilare ad appalto aggiudicato)

|                                |                                                                                                                                                                |          |                      |         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------|
| <b>Impresa aggiudicataria:</b> | <b>CONSORZIO STABILE COIM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (C.F. E P.IVA: 02780750416) in ATI con GRANCHI S.R.L. (C.F. E P.IVA: 01248990507)</b> |          |                      |         |
| Sede legale                    |                                                                                                                                                                |          |                      |         |
| Recapito telefonico            | Tel.                                                                                                                                                           |          | Fax                  |         |
| Rappresentante legale          |                                                                                                                                                                |          |                      |         |
| Lavorazioni da eseguire        |                                                                                                                                                                |          |                      |         |
| N. occupati in cantiere        | Operai:                                                                                                                                                        | Tecnici: | Altro:               | Totale: |
| 1° Aggiornamento del           |                                                                                                                                                                |          | 2° Aggiornamento del |         |

|                               |         |          |                      |         |
|-------------------------------|---------|----------|----------------------|---------|
| <b>Impresa di subappalto:</b> |         |          |                      |         |
| Sede legale                   |         |          |                      |         |
| Recapito telefonico           | Tel.    |          | Fax                  |         |
| Rappresentante legale         |         |          |                      |         |
| Lavorazioni da eseguire       |         |          |                      |         |
| N. occupati in cantiere       | Operai: | Tecnici: | Altro:               | Totale: |
| 1° Aggiornamento del          |         |          | 2° Aggiornamento del |         |

|                               |         |          |                      |         |
|-------------------------------|---------|----------|----------------------|---------|
| <b>Impresa di subappalto:</b> |         |          |                      |         |
| Sede legale                   |         |          |                      |         |
| Recapito telefonico           | Tel.    |          | Fax                  |         |
| Rappresentante legale         |         |          |                      |         |
| Lavorazioni da eseguire       |         |          |                      |         |
| N. occupati in cantiere       | Operai: | Tecnici: | Altro:               | Totale: |
| 1° Aggiornamento del          |         |          | 2° Aggiornamento del |         |

|                               |         |          |                      |         |
|-------------------------------|---------|----------|----------------------|---------|
| <b>Impresa di subappalto:</b> |         |          |                      |         |
| Sede legale                   |         |          |                      |         |
| Recapito telefonico           | Tel.    |          | Fax                  |         |
| Rappresentante legale         |         |          |                      |         |
| Lavorazioni da eseguire:      |         |          |                      |         |
| N. occupati in cantiere:      | Operai: | Tecnici: | Altro:               | Totale: |
| 1° Aggiornamento del          |         |          | 2° Aggiornamento del |         |

|                               |         |          |                      |         |
|-------------------------------|---------|----------|----------------------|---------|
| <b>Impresa di subappalto:</b> |         |          |                      |         |
| Sede legale                   |         |          |                      |         |
| Recapito telefonico           | Tel.    |          | Fax                  |         |
| Rappresentante legale         |         |          |                      |         |
| Lavorazioni da eseguire       |         |          |                      |         |
| N. occupati in cantiere       | Operai: | Tecnici: | Altro:               | Totale: |
| 1° Aggiornamento del          |         |          | 2° Aggiornamento del |         |

**3**

**ANALISI DEI RISCHI DEL CANTIERE**

**3.1 – NATURA DEL TERRENO**

**3.2 – SERVIZI ESTERNI**

**3.3 – PRESENZA DI SOTTOSERVIZI**

**3.4 – PRESENZA DI ALTRI CANTIERI**

**3.5 – RISCHI TRASMESSI VERSO L'ESTERNO**

**3.6 – RISCHI PROVENIENTI DALL'ESTERNO**

**3.7 – RUMORE/ADEMPIMENTI PREVISTI**

**3.8 – VIBRAZIONI/ADEMPIMENTI PREVISTI**

### 3.1 – NATURA DEL TERRENO

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Morfologia del terreno</b> | Pianeggiante/Collinare |
| <b>Presenza di falda</b>      | Ininfluyente           |

#### PARTICOLARI RISCHI

| <b>Tipo di rischio</b>                                | <b>Misure di prevenzione e protezione da adottare</b>                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericoli di incidenti collegati ai flussi di traffico | La circolazione stradale sarà regolamentata mediante gli schemi di segnaletica allegati.<br>(vedi Allegato 2- Lay out di cantiere) |

### 3.2 – SERVIZI ESTERNI

| <b>OPERE</b>       | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>DESCRIZIONE E INTERVENTI DI PREVENZIONE DA EFFETTUARE</b> |
|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Linee aeree</b> |           |           |                                                              |
| Elettriche         |           | <b>x</b>  | Eventuale comunicazione all'ente interessato                 |
| Telefoniche        |           | <b>x</b>  | Eventuale comunicazione all'ente interessato                 |

### 3.3 – PRESENZA DI SOTTOSERVIZI

| <b>OPERE</b>               | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>DESCRIZIONE E INTERVENTI DI PREVENZIONE DA EFFETTUARE</b> |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Linee di sottosuolo</b> |           |           |                                                              |
| Elettriche                 | <b>X</b>  |           | Eventuale comunicazione all'ente interessato                 |
| Telefoniche                | <b>X</b>  |           | Eventuale comunicazione all'ente interessato                 |
| <b>Rete</b>                |           |           |                                                              |
| D'acqua                    | <b>X</b>  |           | Eventuale comunicazione all'ente interessato                 |
| Gas                        | <b>X</b>  |           | Eventuale comunicazione all'ente interessato                 |
| Fognaria                   | <b>X</b>  |           | Eventuale comunicazione all'ente interessato                 |

L'impresa dovrà farsi carico di prendere le dovute informazioni presso gli Enti Gestori circa la presenza dei servizi attualmente presenti e/o segnalati sull'area oggetto dell'intervento e quindi dovrà concordare con gli stessi Enti Gestori, le modalità operative affinché si garantisca la funzionalità di esercizio delle suddette condotte nel rispetto delle norme di sicurezza per le lavorazioni previste nel presente appalto

**3.4 – PRESENZA DI ALTRI CANTIERI**

| OPERE                                            | SI | NO | DESCRIZIONE E INTERVENTI DI PREVENZIONE DA EFFETTUARE                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interferenza con altri cantieri limitrofi</b> |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gru interferenti                                 |    | X  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Recinzioni                                       |    | X  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Accessi                                          | X  |    | Si dovranno adottare tutte le misure di sicurezza per garantire la continuità di utilizzo dei vari accessi carrabili posti lungo i tratti interessati dal cantiere. Si dovrà fare particolare attenzione ai mezzi in entrata ed uscita regolandone il transito a mezzo movieri. |

**3.5 – RISCHI TRASMESSI VERSO L'ESTERNO**

## MEZZI DA CANTIERE

| Lavorazione                                                                                       | Misure di sicurezza da adottare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Polveri derivanti da scavi, transito mezzi, carico e scarico di terreno e ghiaia</b>           | Bagnare per asperione le superfici per eliminare o quantomeno contenere la formazione di polvere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rumore derivante da macchine movimento terra, sega circolare, compressori, ecc</b>             | Si dovranno adottare apparecchiature silenziate e a norma CE. Per lavorazioni che prevedono l'utilizzo di macchinari con superamento temporaneo degli 85 db (compressori, martelli pneumatici, seghe circolari, ecc) o in ogni caso delle soglie di rumore imposte dal regolamento d'igiene del luogo, l'impresa dovrà avanzare domanda alle autorità competenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Caduta materiali dai mezzi utilizzati in cantiere</b>                                          | Evitare qualsiasi permanenza di personale sotto i carichi sospesi o al di sotto di zone dove si eseguono lavorazioni in quota (saldatura, bullonatura, molatura, etc.). Si ricorda che, soprattutto in fase di realizzazione dei collegamenti, è molto frequente la caduta di bulloni, rondelle o altri materiali utilizzati per il montaggio. Eventualmente, disporre reti a maglia sottile o altri mezzi di protezione collettiva. Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche (segregare la zona sottostante); se ciò non è evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni per l'allontanamento delle persone sotto il carico. L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico. Porre particolare cura a eventuali materiali rilasciati dai mezzi in ingresso ed in uscita dal cantiere sulla sede stradale. |
| <b>Incidenti causati da mezzi impiegati nel cantiere durante le manovre di ingresso ed uscita</b> | I conduttori degli automezzi dovranno fare attenzione alle manovre di entrata ed uscita dal cantiere e dovranno mantenere la velocità "a passo d'uomo". Il livello di rischio verrà ridotto ad un grado accettabile con idonea cartellonistica ed eventuali segnalazioni semaforiche, con compartimentazione della zona con recinzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 3.6 – RISCHI PROVENIENTI DALL'ESTERNO

#### ANALISI DELLE OPERE CONFINANTI

| Tipo di rischio           | Misure di prevenzione e protezione da adottare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strade provinciali</b> | Particolare attenzione dovrà essere posta all'ingresso - uscita dei mezzi dalla zona di cantiere, segnalati con apposita cartellonistica, ed alle operazioni di pulizia e rimozione dei materiali, in corrispondenza dell'accesso, ove anche i mezzi esterni possono aver rilasciato materiali. La sede stradale, di volta in volta, verrà sottoposta ad un regime di traffico regolamentato secondo gli schemi di segnaletica allegati. |

### 3.7 – RUMORE/ADEMPIMENTI PREVISTI

#### 3.7.1 - Premessa

La valutazione preventiva del rischio rumore, riportata nelle relative schede delle singole fasi lavorative, è stata effettuata sulla base degli studi e misurazioni condotti dal Comitato Paritetico Territoriale - Prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro - di Torino, pubblicati nel volume: "Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili", Torino anno 1994.

Per ogni fase di lavoro sono stati indicate le qualifiche degli operai che intervengono nella lavorazione stessa, e per ogni di loro è stato riportato il livello standard di esposizione al rumore del personale.

Il datore di lavoro, secondo l'art. 17 del D.Lgs. 81/08, non può in alcun modo delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 dello stesso decreto, per la valutazione e prevenzione dei rischi da rumore.

#### 3.7.2 – Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione al rumore

##### Valori limite di esposizione e valori di azione (art. 189 D.Lgs. 81/08)

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

a) valori limite di esposizione rispettivamente  $LEX,8h = 87 \text{ dB(A)}$  e  $p_{peak} = 200 \text{ Pa}$  (140 dB(C) riferito a  $20 \mu\text{Pa}$ );

b) valori superiori di azione: rispettivamente  $LEX,8h = 85 \text{ dB(A)}$  e  $p_{peak} = 140 \text{ Pa}$  (137 dB(C) riferito a  $20 \mu\text{Pa}$ );

c) valori inferiori di azione: rispettivamente  $LEX,8h = 80 \text{ dB(A)}$  e  $p_{peak} = 112 \text{ Pa}$  (135 dB(C) riferito a  $20 \mu\text{Pa}$ ).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di  $87 \text{ dB(A)}$ ;

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

##### Valutazione del rischio (art. 190 D.Lgs. 81/08)

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
- d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.

6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è documentata in conformità all'articolo 28, comma 2.

#### Misure di prevenzione e protezione (art. 192 D.Lgs. 81/08)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182 il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:

- a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
- b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
- c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
- d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
- e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
  - 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
  - 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
- f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

#### Uso dei dispositivi di protezione individuali (art. 193 D.Lgs. 81/08)

1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II ed alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

### **3.8 – VIBRAZIONI/ADEMPIMENTI PREVISTI**

---

#### **3.8.1 – Premessa**

Il datore di lavoro, secondo l'art. 17 del D.Lgs. 81/08, non può in alcun modo delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 dello stesso decreto, per la valutazione e prevenzione dei rischi da esposizione alle vibrazioni meccaniche.

Ai fini del presente paragrafo si valutano :

- a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- b) vibrazioni trasmesse al corpo
- c) esposizione giornaliera alle vibrazioni suddette.

#### **3.8.2 – Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione alle vibrazioni**

##### Valori limite di esposizione e valori di azione (art. 201 D.Lgs. 81/08)

1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s<sup>2</sup>; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s<sup>2</sup>;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s<sup>2</sup>.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

- 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,0 m/s<sup>2</sup>; mentre su periodi brevi e' pari a 1,5 m/s<sup>2</sup>;
- 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s<sup>2</sup>.

2. Nel caso di variabilita' del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

#### Valutazione dei rischi (art. 202 D.Lgs. 81/08)

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entita' delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature.

Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.

4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la' delle ore lavorative, in locali di cui e' responsabile;

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidita' o il biomeccanico degli arti superiori e del rachide;

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

#### Misure di prevenzione e protezione (art. 203 D.Lgs. 81/08)

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

- a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
- b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
- c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
- d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
- e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
- f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
- g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
- i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità'.

2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

# 4

## ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

- 4.1 - DOCUMENTI CHE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA DOVRÀ TENERE IN CANTIERE**
- 4.2 - ORGANIGRAMMA CANTIERE**
- 4.3 - GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA DEL CANTIERE**
- 4.4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE**
- 4.5 - SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL CANTIERE**
- 4.6 - PRONTO SOCCORSO/GESTIONE EMERGENZE/NUMERI TELEFONICI UTILI**
- 4.7 - MACCHINE E ATTREZZATURE**
- 4.8 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**
- 4.9 - D.P.I.**
- 4.10 - INFORMAZIONE**

#### 4.1 - DOCUMENTI CHE L'IMPRESA AGGIUDICATARIA DOVRÀ TENERE IN CANTIERE

| <b>DOCUMENTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NOTE</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SICUREZZA/PROGETTO<br/>(impresa appaltatrice e subappaltatori)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Piano di sicurezza e coordinamento ed aggiornamenti o proposte integrative dell'impresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Piano operativo della sicurezza redatto dall'impresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Copia della notifica preliminare inviata alla ASL dal committente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Verbali delle riunioni di coordinamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Copia degli elaborati progettuali (architettonici-strutture-impianti-particolari in genere) e relative autorizzazioni/concessioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Copia nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Copia nomina del medico competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Copia nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Denuncia dell'apertura del cantiere agli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (INPS, INAIL, CASSA EDILE ed ISPETTORATO DEL LAVORO)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Copia iscrizione alla CCIAA impresa affidataria e subappaltatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Indicazione dei contratti collettivi applicati ai dipendenti e del regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Copia del libro matricola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Registro infortuni per il cantiere, regolarmente vidimato dalla ASL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Valutazione dei rischi da rumore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Registro di consegna dei DPI ai dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Denuncia ISPESL per l'impianto di messa a terra (Mod. B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Denuncia ISPESL per l'impianto di messa a terra contro scariche atmosferiche (Mod. A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Certificato di conformità quadri elettrici (Quadri ASC - CEI 17-13/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico L. 37/08, rilasciato dall'impresa esecutrice dell'impianto<br>Accordo con l'Ente gestore di linee elettriche (ENEL, FF.SS., Aziende di Servizi) per l'esecuzione di lavori che si intendono eseguire a distanza inferiori a 7,00 m dalle linee aeree stesse e segnalazioni/autorizzazioni per tutti gli altri enti gestori di sottoservizi per definire le modalità operative dei lavori |             |
| Schede tecniche tossicologiche e di sicurezza per sostanze chimiche adoperate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Tesserino di vaccinazione antitetanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Piano sanitario redatto dal Medico Competente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Certificati degli estintori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| <b>PONTEGGIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Autorizzazione Ministeriale e libretto del ponteggio della ditta con copia del disegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| PIMUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Progetto dei castelli di servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>ATTREZZATURE/MACCHINE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Libretti d'uso e di manutenzione delle attrezzature/macchine utilizzate in cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Dichiarazioni di conformità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Libretto di omologazione e libretti di verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuale > 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Verifica trimestrale funi e catene degli apparecchi di sollevamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

|                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento                                                                                                                                 |  |
| Certificato di corretta installazione della gru                                                                                                                                      |  |
| Dichiarazione di stabilità dell'impianto di betonaggio                                                                                                                               |  |
| Dichiarazione di stabilità dei Silos per malte premiscelate                                                                                                                          |  |
| Libretto e omologazione degli apparecchi a pressione di capacità > 25 litri                                                                                                          |  |
| <b>Verbalì delle verifiche effettuate dal datore di lavoro (appaltatore) come previsto dall'art. 2 comma 4-quater del D.Lgs. 359/99 per le attrezzature di cui al D. Lgs. 81/08.</b> |  |

## 4.2 - ORGANIGRAMMA CANTIERE

(Compiti e responsabilità ai fini della sicurezza)  
(da compilare ad appalto aggiudicato)

| FIGURA | MANSIONI E COMPITI                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sig.   | Direttore Tecnico di cantiere:<br><i>Dirigente sovrintende alla costruzione dell'opera</i>                                               |
| Sig.   | Capo Cantiere:<br><i>Dirigente/Preposto responsabile del processo costruttivo dell'opera</i>                                             |
| Sig.   | Assistente di cantiere:<br><i>Preposto assiste il Capo cantiere nel processo costruttivo dell'opera</i>                                  |
| Sig.   | Capo Squadra n.1:<br><i>Preposto addetto all'organizzazione tecnico procedurale della singola squadra occupata nelle fase lavorativa</i> |
| Sig.   | Capo Squadra n.2:<br><i>Preposto addetto all'organizzazione tecnico procedurale della singola squadra occupata nelle fase lavorativa</i> |
| Sig.   | Capo Squadra n.3:<br><i>Preposto addetto all'organizzazione tecnico procedurale della singola squadra occupata nelle fase lavorativa</i> |
| Sig.   | Meccanico/Elettricista:<br><i>Addetto alla Manutenzione delle macchine e impianti</i>                                                    |
| Sig.   | Addetto a rappresentante per la sicurezza dei lavoratori                                                                                 |
| Sig.   | Addetto a                                                                                                                                |
| Sig.   | Addetto a                                                                                                                                |
| Sig.   | Addetto a                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                          |

**4.3 - GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA DEL CANTIERE**

(da compilare ad appalto aggiudicato)

| <b>FIGURA</b> | <b>MANSIONI E COMPITI</b>                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sig.          | <b>Coordinatore per l'esecuzione dei lavori:</b><br><i>Verifica l'applicazione del piano di sicurezza e coordinamento, da indicazioni tecniche, procedurali e organizzative</i>                            |
| Sig           | <b>Direttore Tecnico di cantiere:</b><br><i>Dirigente sovrintende alla costruzione dell'opera dispone l'attuazione delle indicazioni fornite dal coordinatore dell'esecuzione dei lavori</i>               |
| Sig.          | <b>Capo Cantiere:</b><br><i>Dirigente/Preposto responsabile del processo costruttivo dell'opera attua quanto disposto dal Direttore Tecnico su indicazione del coordinatore dell'esecuzione dei lavori</i> |
| Sig.          | <b>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:</b><br><i>È consultato preventivamente e periodicamente sul Piano di coordinamento e sicurezza e sulle eventuali modifiche apportate</i>                |

## 4.4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

---

### 4.4.1 – COMPLESSITA' DELL'OPERA / FASI CRITICHE

Per garantire al meglio la fluidità di scorrimento del transito veicolare, trovandosi il cantiere in un'area fortemente trafficata, l'intervento dovrà essere realizzato per tratti di lunghezza tali da essere sempre transitabili a senso unico alternato.

Nessun tratto di strada ed in nessun momento potrà essere interdetto al transito veicolare.

In questo tipo di intervento non esistono particolari fasi critiche e comunque per tutte le lavorazioni si deve far riferimento alle relative schede di lavorazione come da ALLEGATO 3.

### 4.4.2 - RECINZIONE/DELIMITAZIONE DELL'AREA

Il cantiere, va delimitato con barriere sia frontali che longitudinali limitatamente alle zone oggetto dell'intervento. Tali barriere sono obbligatorie sui lati frontali e sulle testate di approccio del cantiere, mentre lungo i lati longitudinali possono essere sostituite da recinzione colorate in rosso o arancione, costituite da teli, reti o altri materiali approvati dal Min. dei LL.PP., tale recinzione dovrà essere provvista di idonei sostegni verticali in acciaio o in legno atti a garantire l'invalicabilità all'interno del cantiere. Le delimitazioni con nastro colorato si devono intendere solo come di richiamo di attenzione, ma non hanno valore come barriera. Ogni zona di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie o sostanze pericolose, dovrà essere opportunamente delimitata.

### 4.4.3 - TABELLA INFORMATIVA DEL CANTIERE

In prossimità di ogni cantiere si deve porre una tabella lavori conforme alle indicazioni della **Circ. Min. LL.PP. 1/6/90 n. 1729/UL**, inoltre in tale cartello ai sensi dell'art.90 comma 7 D.Lgs 81/08 si dovranno indicare i nominativi dei Coordinatori per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori.

Il cartello ed il sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto decoroso.

### 4.4.4 - ACCESSI

Gli accessi previsti nel cantiere sono posizionati alle testate della zona dei lavori e saranno dotati di regolare serratura o lucchetto di chiusura.

### 4.4.5 - VIABILITÀ/CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI MEZZI DI CANTIERE/PARCHEGGI

La viabilità interna al cantiere deve conseguire lo scopo di evitare le interferenze con le attività lavorative, per questo motivo sarà ridotta allo stretto necessario.

La velocità massima consentita dei mezzi in cantiere sarà di 15 Km/h e si deve assicurare sufficiente visibilità ai tracciati stradali.

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs.81/08, la viabilità delle persone e dei veicoli durante i lavori nei cantieri deve essere assicurata conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII :

- Le rampe di accesso degli scavi di splanteamento o sbancamento devono avere una carreggiata, solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alle possibilità dei mezzi stessi. La larghezza deve essere tale da consentire un franco di almeno cm 70 oltre la sagoma d'ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.
- Tutte le vie di circolazione pedonali che siano poste ad un'altezza maggiore di 2,00 ml devono essere provviste su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costruito secondo le modalità dell'art. 126 D.Lgs.81/08
- Alle vie d'accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate (art.110 D.Lgs.81/08).

Gli oneri di tali opere sono da considerarsi inclusi nei prezzi delle rispettive lavorazioni di cantiere e pertanto all'Impresa non spetta nessun compenso aggiuntivo per la realizzazione di queste barriere di protezione.

### 4.4.6 - ILLUMINAZIONE

Non sono previste opere atte per l'illuminazione notturna del cantiere.

#### 4.4.7 - SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza sarà conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione. In cantiere sono da prevedersi seguenti cartelli:

1. Segnale tradizionale di «Lavori» come da fig. II 383 art.31 DPR 495/92, con fondo giallo, da installarsi sulle testate del cantiere. Se il cantiere è più lungo di 100 ml, il segnale Lavori deve essere integrato da pannello indicante la lunghezza della zona interessata dai lavori.
2. Le barriere di testata ed il segnale Lavori devono essere muniti di luce rossa fissa. Eventuali sbarramenti obliqui che incanalano il traffico devono essere segnalati con luci gialle intermittenti e, qualora necessario, segnalati anche con «Delineatori modulari di curva provvisoria» fig. II 395 art.33 DPR 495/92. I margini longitudinali della zona di lavoro devono essere integrati con dispositivi a luce gialla fissa. Le bocce e le lanterne a fiamma libera sono vietate.
3. Chi opera in prossimità alla delimitazione di un cantiere stradale o che comunque è esposto al traffico, deve essere munito di indumenti fluorescenti e rifrangenti, solo in caso di interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con materiale rifrangente (art.37 DPR 495/92)
4. Sul retro di ogni macchina operante sulla strada deve essere posto il pannello «Passaggio obbligatorio per veicoli operativi» (fig. II 398 art. 38 DPR 495/92) con la freccia bianca inclinata di 45° dal lato nel quale la macchina deve essere superata. Se il veicolo è particolarmente lento deve essere aggiunta una luce gialla lampeggiante.
5. Se la carreggiata disponibile resta inferiore a 5,60 ml occorre istituire il «Senso unico alternato» con l'apposizione del segnale «Dare precedenza nei sensi unici alternati» (fig. II 41 art. 110) dal lato di chi deve dare precedenza ed il segnale «Diritto di precedenza nei sensi unici alternati» (fig. II 45 art. 114) dal lato di chi ha la corsia continua. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 ml per la presenza di lavori può essere regolato nei seguenti modi:
  - a) Transito alternato a vista, mettere i cartelli «Dare precedenza nei sensi unici alternati» e «Diritto di precedenza nei sensi unici alternati»;
  - b) Transito alternato da movieri muniti di apposita paletta o uso di bandiere di colore arancio fluorescente per segnalare il rallentamento del traffico;
  - c) Transito alternato a mezzo semafori, funzionanti per l'intera giornata, dove la fase di rosso non deve superare i 2', tale utilizzo del semaforo è obbligatorio quando la strettoia supera i 50 ml o i cui imbocchi non sono visibili uno dall'altro.

I segnali da posizionarsi prima della strettoia per lavori in corso sono i seguenti (indicati nel verso di avvicinamento alla zona del cantiere):

PERICOLO TEMPORANEO SEMAFORO (fig. II 404 art.42)

(in caso di installazione del semaforo)

PERICOLO TEMPORANEO STRETTOIA (fig. II 384/385/386 art.42)

SEGNALE LAVORI (fig. II 383 art.31) con il pannello integrativo indicante la estesa del cantiere quando il tratto interessato è più lungo di 100 ml;

DIVIETO DI SORPASSO (fig. II 48/52 art.31)

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' non inferiore a 30 km/h (fig. II 50 art.116)

DARE PRECEDENZA IN SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II 41 art.110) e DIRITTO DI PRECEDENZA IN SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II 45 art.114) – *(nel caso di transito alternato a vista)*

DAI MOVIERI *(nel caso di transito alternato dai movieri)*

SEMAFORO *(nel caso di transito alternato a mezzo semaforico)*

PASSAGGIO OBBLIGATORIO (fig. II 82 art.122)

BARRIERA (fig. II 392 art.32)

SEGNALE DI FINE PRESCRIZIONE (fig. II 70/71/72/73 art.119)

Nelle ore notturne o in giorni di scarsa visibilità si installino:

- luce rossa fissa, sopra il segnale di lavori
- luce rossa fissa, sulle barriere poste alle testate del cantiere
- luce gialla lampeggiante, sopra le direzioni obbligatorie
- luce gialla fissa, sul lato longitudinale del cantiere
- luce gialla lampeggiante, nel triangolo di preavviso semaforo.

**La segnaletica stradale dovrà essere installata conformemente agli schemi di segnaletica allegati.**

**Vedi ALLEGATO 2 - LAY-OUT di cantiere**

**Tutta la segnaletica di sicurezza impiegata, ad eccezione di quella utilizzata per regolare il traffico stradale, dovrà essere conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dall'allegato XXIV al XXXIII.**

L'impresa aggiudicatrice dei lavori dovrà mantenere in condizione di buona visibilità e sostituire tutti i segnali

che si deteriorano con il proseguo dei lavori, e rimuovere quelli per cui non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

La forma e i colori dei cartelli in funzione del loro oggetto specifico, e i pittogrammi utilizzati dovranno corrispondere a quelli definiti al punto 3 dell'allegato XXV del D.Lgs. 81/08.

Le dimensioni dei segnali devono essere tali da renderli riconoscibili fino ad almeno 50 metri di distanza, e comunque si raccomanda di osservare la formula  $A > L^2/2000$ , dove A è la superficie del cartello espressa in mq ed L è la distanza misurata in m alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile.

Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si raccomanda di ricorrere alla normativa di buona tecnica UNI.

I cartelli vanno sistemati ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, in un posto ben illuminato e facilmente accessibile e visibile, in particolare all'ingresso di una zona a rischio generico o nelle immediate adiacenze ad un rischio specifico o all'oggetto che si intende segnalare. In caso di cattiva illuminazione naturale andranno utilizzati materiali riflettenti e colori fosforescenti o illuminazione artificiale.

Nei luoghi in cui esiste pericolo di urto o investimento, inciampo o caduta, ecc., la segnalazione va fatta mediante strisce inclinate a 45° di colore giallo e nero alternati o rosso e bianco alternati.

L'impresa in prossimità di ogni macchina, attrezzatura o all'interno dell'officina, dovrà installare la seguente segnaletica:

- cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto,
- divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto,
- divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza,
- divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti,
- cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri, etc. ...).

| TIPO DI CARTELLO                                                                            | INFORMAZIONE TRASMESSA DAL CARTELLO | COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL CARTELLO                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vietato fumare                                                                              | Divieto                             | Locali di lavoro                                                                                              |
| Vietato fumare o usare fiamme libere                                                        | Divieto                             | Locali di lavoro<br>depositi di bombole, di solventi, vernici, di lubrificanti e altri materiali infiammabili |
| Vietato l'ingresso agli estranei e alle persone non autorizzate                             | Divieto                             | Ingresso cantiere pedonabile e carrabile                                                                      |
| Vietato il superamento della velocità massima consentita ai mezzi di cantiere (es. 15 km/h) | Divieto                             | Ingresso carrabile e lungo le vie di circolazione interna del cantiere                                        |
| Divieto di accesso a tutti i veicoli                                                        | Divieto                             | Ai cancelli del cantiere riservati alla sola uscita degli automezzi                                           |
| Divieto di gettare materiali dall'alto                                                      | Divieto                             | Area di cantiere ponteggi                                                                                     |
| Pericolo generico entrare adagio                                                            | Avvertimento                        | Ingresso del cantiere carrabile                                                                               |
| Passaggio veicoli                                                                           | Avvertimento                        | Lungo le vie della circolazione interna del cantiere                                                          |
| Materiale infiammabile                                                                      | Avvertimento                        | Area di cantiere                                                                                              |
| Materiale esplosivo                                                                         | Avvertimento                        | Area di cantiere                                                                                              |
| Sostanze velenose                                                                           | Avvertimento                        | Area di cantiere                                                                                              |
| Sostanze corrosive                                                                          | Avvertimento                        | Area di cantiere                                                                                              |
| Carichi sospesi                                                                             | Avvertimento                        | Area di cantiere<br>raggio di azione apparecchi di sollevamento ed in prossimità dei ponteggi                 |
| Tensione elettrica pericolosa / divieto di spegnere eventuali incendi con l'acqua           | Avvertimento/Divieto                | Area di cantiere<br>quadri elettrici e nelle linee elettriche interrate o aeree                               |
| Materiale comburente                                                                        | Avvertimento                        | Area di cantiere                                                                                              |
| Pericolo di inciampo                                                                        | Avvertimento                        | Area di cantiere                                                                                              |
| Caduta con dislivello                                                                       | Avvertimento                        | Area di cantiere<br>in prossimità degli scavi                                                                 |
| Protezione obbligatoria degli occhi                                                         | Prescrizione                        | Uso di Macchine/Attrezzature                                                                                  |
| Casco di protezione obbligatorio                                                            | Prescrizione                        | Area di cantiere                                                                                              |
| Protezione obbligatoria dell'udito                                                          | Prescrizione                        | Uso di Macchine/Attrezzature                                                                                  |
| Protezione obbligatoria delle vie respiratorie                                              | Prescrizione                        | Uso di Macchine/Attrezzature                                                                                  |
| Calzature di sicurezza obbligatorie                                                         | Prescrizione                        | Area di cantiere                                                                                              |
| Guanti di protezione obbligatorie                                                           | Prescrizione                        | Uso di Macchine/Attrezzature                                                                                  |
| Protezione obbligatoria del corpo                                                           | Prescrizione                        | Uso di Macchine/Attrezzature                                                                                  |
| Protezione obbligatoria del viso                                                            | Prescrizione                        | Uso di Macchine/Attrezzature                                                                                  |
| Protezione obbligatoria contro le cadute                                                    | Prescrizione                        | Lavori con caduta dall'alto                                                                                   |
| Passaggio obbligatorio per pedoni                                                           | Prescrizione                        | In particolari condizioni                                                                                     |
| Direzione obbligatoria                                                                      | Salvataggio                         | Area di cantiere                                                                                              |
| Pronto soccorso                                                                             | Salvataggio                         | Ubicazione Pacchetto di Medicazione                                                                           |
| Telefono per salvataggio e pronto soccorso                                                  | Salvataggio                         | Ufficio di cantiere                                                                                           |
| Lancia antincendio                                                                          | Attrezzatura antincendio            | Area di cantiere                                                                                              |
| Scala antincendio                                                                           | Attrezzatura antincendio            | Area di cantiere                                                                                              |
| Cartello identificativo dell'estintore                                                      | Attrezzatura antincendio            | Area di cantiere<br>luogo di ubicazione degli estintori                                                       |
| Direzioni obbligatorie                                                                      | Attrezzatura antincendio            | Area di cantiere vie di esodo ed uscite di emergenza                                                          |

#### 4.4.8 - EMISSIONI INQUINANTI/MATERIALE DI RISULTA/RIFIUTI

Nel cantiere non sono previste né emissioni inquinanti né rifiuti. Gli unici materiali di risulta prevedibili sono i terreni derivanti dalle operazioni di scavo, ovvero materiali inerti, che saranno portati a discariche autorizzate se non autorizzati al loro riutilizzo in cantiere, gli oneri del carico, trasporto e di scarico sono addossati all'Impresa.

**Comunque l'Impresa dovrà rispettare i termini di legge contenuti nel D. Lgs. 5/2/97 n. 22 in quanto essa stessa è individuata come produttrice di rifiuti.**

E' vietata l'accensione di fiamme libere e falò utilizzando materiali di scarto di qualsiasi natura.

E' vietata la dispersione nel terreno di combustibili e solventi.

#### 4.4.9 - INSTALLAZIONE DEI DEPOSITI

I depositi di materiale in cataste, pile, mucchi sono da effettuare in modo razionale e tali da evitare crolli o cedimenti. Ai sensi dell'art.120 D.Lgs. 81/08 è vietato costituire depositi di materiale presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari, si dovrà provvedere alle necessarie puntellature.

Per questo cantiere la distanza minima dal ciglio degli scavi all'inizio del deposito deve essere pari a  $H + \text{franco}$  dove  $H$ =altezza in metri dello scavo e il franco è posto pari a 2.00 ml.

#### 4.4.10 - SERVIZI IGIENICO-SANITARI E ASSISTENZIALI

All'interno del cantiere si provvederà a scegliere i luoghi di lavoro fissi nonché il luogo d'installazione delle attrezzature di cantiere e delle baracche (uffici, servizi e depositi) mirando all'ottimizzazione delle condizioni di sicurezza relative alla movimentazione orizzontale e verticale dei carichi.

Ogni baracca sarà dotata di finestra apribile, nella misura del possibile, per consentire un'adeguata superficie aero-illuminante del locale. I pavimenti, le pareti e i soffitti sanno tali da poter essere pulite. La posizione, il numero e le dimensioni delle porte saranno determinati dalla natura e dall'uso dei locali. I locali saranno riscaldati nella stagione fredda.

Gli impianti interni alle baracche dovranno essere realizzati in conformità a quanto stabilito dal D..Lgs. 37/08 e dalla normativa tecnica (CEI 64-8).

I servizi igienico-assistenziali al servizio dei cantieri dovranno rispondere alle prescrizioni dell'allegato XIII del D.Lgs. 81/08 ed in particolare:

- Spogliatoi o armadi per il vestiario : ciascun lavoratore deve poter chiudere a chiave i propri indumenti;
- Docce : il numero minimo è di 1 ogni 10 lavoratori, locali dotati di acqua calda e fredda, mezzi detergenti e per asciugarsi, riscaldamento nella stagione fredda, e mantenuti in buone condizioni igieniche;
- Gabinetti e lavabi : servizi igienici devono essere tali da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti; i lavabi devono essere in numero minimo di 1 ogni 5 lavoratori, mentre i gabinetti 1 ogni 10 lavoratori; in caso di utilizzo di bagno chimico, questo dovrà garantire il minimo rischio sanitario,

In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti ed in prossimità di idonee strutture aperte al pubblico, l'Impresa potrà attivare delle convenzioni con tali strutture e copia di tali convenzioni deve essere portata a conoscenza dei lavoratori e tenuta in cantiere.

In cantiere, comunque, si dovranno garantire:

- acqua potabile in quantità sufficiente al fabbisogno dei lavoratori previsti in cantiere, tanto per uso potabile che per lavarsi

pacchetto di medicazione, costituito da quanto disposto dall'allegato I del DM 15 luglio 2003, art. 2.

**N.B. Nel periodo emergenziale COVID -19 le misure igienico-sanitarie dovranno essere adeguate alle vari direttive impartite dal Ministero della salute e dai DPCM relativi all'emergenza in corso.**

#### 4.4.11 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

L' impianto sarà realizzato attenendosi alle norme CEI (L. 186/68).

Si procederà preventivamente alla determinazione dei carichi, al calcolo delle sezioni dei conduttori e alla stesura degli schemi elettrici.

L' impianto sarà costituito da quadri principali e secondari (di zona) costruiti in serie per cantieri (ASC), muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformità alle norme (CEI 17.13/4).

Tutti i componenti dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP44, ad eccezione delle prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67 (protette contro l'immersione) e degli apparecchi illuminanti, che avranno un grado di protezione IP55.

Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con  $I_{dn}$  non inferiore a 30 mA (CEI 64-8/7 art. 704.471). Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggerà al massimo 6 prese (CEI 17-13/4 art. 9.5.2).

Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante l'esecuzione di lavori elettrici o per manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2).

Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7 704.537:

- del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a chiave;

- coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave.

Per le linee saranno utilizzati i seguenti cavi:

- N1VV-K o FG7R o FG7OR per la posa fissa e interrata;
- H07RN-F o FG1K 450/750 V o FG1OK 450/750 V per posa mobile.

Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree - qualora queste intralcino la circolazione saranno opportunamente protette contro il danneggiamento meccanico (CEI 64-8/7 art. 704.52) - e in parte interrate - anche queste opportunamente protette e segnalate contro i danneggiamenti meccanici.

Sarà vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano temperature inferiori a zero gradi.

Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24 V tramite trasformatore di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta, cunicoli, serbatoi metallici, saranno utilizzate lampade a bassissima tensione di sicurezza (CEI 64-8/7 art. 706.471.2b). In alternativa saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma.

Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, saranno alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) oppure saranno protetti con separazione elettrica (mediante trasformatore d'isolamento 220 - 220 V). In alternativa saranno utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma.

Sarà proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza o quelli alimentati da trasformatore d'isolamento (CEI 64-8/4 artt. 411.1.4.1 e 413.2.7). In ogni caso il trasformatore d'isolamento o di sicurezza sarà mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto.

#### **4.4.12 - IMPIANTO DI TERRA DEL CANTIERE (SISTEMA TT)**

L'impianto di terra sarà realizzato all'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici.

Questo avrà lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le masse e le masse estranee.

L'impianto di terra sarà coordinato con l'interruttore generale posto a protezione dell'impianto elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra ( $R_t$ , espressa in Ohm) sia non inferiore al rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale d'intervento o di regolazione ( $I_{dn}$ , in ampere) dello stesso interruttore generale.

Il numero dei dispersori sarà calcolato in modo tale che  $n=R/R_t$ , dove  $R$  è la resistenza del singolo dispersore in funzione della resistività (in Ohm m) del terreno in cui viene infisso ed  $R_t$  la resistenza di terra (valutata con l'espressione precedente). I picchetti saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle loro lunghezze. I dispersori di terra di protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i dispersori di terra di protezione dalle scariche atmosferiche.

La sezione minima dei conduttori di protezione ( $S_p$ ) sarà determinata in funzione della sezione del conduttore di fase ( $S$ ) in base alla seguente tabella:

- $S_p=S$ , per  $S$  minore o uguale a 16 mmq;
- $S_p=16$  mmq, per  $S$  compreso tra 16 e 35 mmq;
- $S_p=S/2$ , per  $S$  maggiore a 35 mmq.

La sezione minima del conduttore di terra sarà :

- determinata in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16 mmq se isolato e direttamente interrato;
- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, se isolato e posato entro tubo in PVC pesante;
- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmq, in rame, o 50 mmq, in ferro zincato, se nudo e direttamente interrato.

Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una resistenza verso terra inferiore a 200 Ohm.

Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la corrosione (CEI 64-12 art.3.6).

#### **4.4.13 - IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE**

In cantiere, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sarà realizzato affinché gli edifici, gli impianti e le attrezzature siano protetti con sistemi realizzati secondo le norme di buona tecnica (art. 84 del D.Lgs. 81/08). In base alla norma CEI 81-1, si definiscono di grandi dimensioni le strutture per le quali  $N_f > N_{el}$ , con  $N_f$  numeri di fulmini che statisticamente può colpire la struttura nella zona di ubicazione del cantiere e  $N_{el}$  numeri di fulmini ammessi, in relazione al danno medio che un fulmine può determinare. Se  $N_f$  è minore o uguale a  $N_{el}$ , la struttura non sarà dotata di impianto di protezione, sarà considerata autoprotetta. I dispersori per la protezione contro le scariche atmosferiche saranno collegati all'impianto di terra per la protezione contro i contatti indiretti (CEI 81-1 art. 2.4.01).

#### **4.4.14 - DIREZIONE CANTIERE/SORVEGLIANZA LAVORI/VERIFICHE E CONTROLLI**

L'organizzazione del lavoro e della sicurezza è articolata in diversi momenti di responsabilizzazione e di

formazione dei vari soggetti interessati al processo produttivo così a fianco di chi esercisce l'attività (datore di lavoro), in ogni unità produttiva, vi sono anche le figure di coloro che dirigono le attività (dirigenti) e di coloro che le sorvegliano (preposti).

**Compiti del datore di lavoro (impresa):**

- disporre affinché siano attuate le misure di sicurezza relative all'igiene ed ambiente di lavoro che assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti normative, mettendo a disposizione i mezzi necessari;
- rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti e gli stessi lavoratori, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sulle esigenze di sicurezza di cantiere e sulle normative di attuazione con riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia.

**Compiti dei dirigenti (direttore tecnico dell'impresa o direttore di cantiere):**

- programmare le misure di sicurezza relative all'igiene ed all'ambiente di lavoro che assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative e mettere a disposizione i mezzi necessari allo scopo
- illustrare ai preposti i contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei sistemi di protezione previsti sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono esposti i lavoratori;
- rendere edotte le ditte subappaltatrici sui contenuti di quanto programmato e sui sistemi di protezione previsti;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione con i mezzi a disposizione;
- mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e disporre che i singoli lavoratori osservino Le norme di sicurezza;
- verificare ed esigere che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure programmate ai fini della sicurezza collettiva ed individuale;
- predisporre affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza siano mantenuti in buona ed efficiente condizione, provvedendo altresì a fare effettuare le verifiche ed i controlli previsti.

**Compiti dei preposti (responsabile del cantiere o assistente del direttore di cantiere):**

- attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza;
- esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi personali di protezione messi a loro disposizione;
- aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza in relazione ai rischi specifici cui sono esposti.

L'impresa dovrà incaricare un responsabile per lo svolgimento della sorveglianza dello stato dell'ambiente esterno e di quello interno con valutazione dei diversi fattori ambientali: delle recinzioni, delle vie di transito e dei trasporti, delle opere preesistenti e di quelle costruende, fisse o provvisorie, delle reti di servizi tecnici, di macchinari, impianti, attrezzature, dei diversi luoghi e posti di lavoro, dei servizi igienico-assistenziali e di quanto altro possa influire sulla sicurezza del lavoro degli addetti ai lavori e terzi.

Dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche notevoli e dopo interruzioni prolungate dei lavori, la ripresa dei lavori è preceduta dal controllo della stabilità dei terreni, delle opere provvisorie, delle reti dei servizi e di quanto altro suscettibile di averne avuta compromessa la sicurezza.

#### **4.4.15 - VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE/SORVEGLIANZA SANITARIA**

Ove richiamato dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori vengono sottoposti a visite mediche specifiche preventive e periodiche. Quando le attività svolte comportano la sorveglianza sanitaria l'Impresa dovrà indicare il nominativo del medico competente.

#### **4.5 - SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL CANTIERE (LAY-OUT)**

---

Nell'elaborato grafico dell'ALLEGATO 2, è individuato lo schema organizzativo generale del cantiere.

Le indicazioni si riferiscono a possibili ipotesi di soluzione ed è facoltà di ciascuna impresa presentare modifiche, varianti o aggiunte in relazione alla propria organizzazione aziendale.

Ovvero, tale disposizione dovrà essere rivista sulla scorta delle scelte autonome sia nell'organizzazione del cantiere che nell'esecuzione dei lavori che spetta all'impresa aggiudicatrice dei lavori nella redazione del **Piano Operativo di Sicurezza**.

## 4.6 - PRONTO SOCCORSO/GESTIONE EMERGENZE

### NUMERI TELEFONICI UTILI

---

Nel cantiere l'impresa deve mettere a disposizione il materiale di pronto soccorso e deve dare le opportune informazioni sul comportamento da tenere in caso di incidente al proprio personale preposto.

L'impresa con 3 o più addetti nel cantiere o quella rientrante nel gruppo A del D.M. 388 del 15 luglio 2003 è obbligata a tenere la **cassetta del pronto soccorso**, mentre nei cantieri di modesta entità con meno di 3 lavoratori e non appartenenti al gruppo A, basta il **pacchetto di medicazione**, conformi a quanto disposto dagli allegati I e II del DM 15 luglio 2003, art. 2.

Qualora non venga disposto diversamente dal contratto di affidamento dei lavori, la gestione dell'emergenza è a carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell'opera, i quali dovranno designare preventivamente gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione (art. 18, comma 1, lettera b, D. Lgs. n. 81/08).

I datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori devono adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato.

Nel Piano Operativo di Sicurezza l'impresa dovrà definire e dettagliare la gestione delle emergenze correlandola con le proprie scelte autonome di organizzazione aziendale.

Di seguito si riportano i principi generali

- si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, consistenti essenzialmente nelle designazioni ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi;
- il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di un'emergenza.

#### **Compiti e procedure Generali**

- 1) Il capo cantiere è l'incaricato che dovrà dare l'ordine d'evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.
- 2) il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda "numeri utili" inserita nel piano di sicurezza e coordinamento);
- 3) gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo più sicuro (ingresso cantiere);
- 4) il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

#### **Procedure di Pronto Soccorso**

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività :

- 1) garantire l'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, V.V.F., negli uffici (scheda "numeri utili");
- 2) predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento) ;
- 3) cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;
- 4) in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;
- 5) in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso ;
- 6) prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti;
- 7) controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

#### **Come si può assistere l'infortunato**

- Valutare quanto prima se la situazione necessaria di altro aiuto oltre al proprio ;
- evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose ecc.) prima d'intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;
- spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'è pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi ;

- accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);
- accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione ecc.) ;
- porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure ;
- rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia ;
- conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e controllare le sensazioni di sconcerto o disagio che possono derivare da essi.

## PROCEDURA PER RICHIESTA DI INTERVENTO DI SOCCORSO

| DATI DA COMUNICARE AI VIGILI DEL FUOCO                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NOME DELL'IMPRESA DEL CANTIERE RICHIEDENTE                                       |
| 2. INDIRIZZO PRECISO DEL CANTIERE RICHIEDENTE                                       |
| 3. TELEFONO DEL CANTIERE RICHIEDENTE (o di un telefono cellulare)                   |
| 4. TIPO DI INCENDIO (PICCOLO – MEDIO – GRANDE)                                      |
| 5. PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO (SI – NO – DUBBIO)                               |
| 6. LOCALE O ZONA INTERESSATA ALL'INCENDIO                                           |
| 7. MATERIALE CHE BRUCIA                                                             |
| 8. NOME DI CHI STA' CHIAMANDO                                                       |
| 9. FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE                                               |
| 10. NOTARE L'ORA ESATTA DELLA CHIAMATA                                              |
| 11. PREDISPORRE TUTTO L'OCCORRENTE PER L'INGRESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN CANTIERE |

**SERVIZI DI EMERGENZA - PREVENZIONE INCENDI**

| <b>SOSTANZE<br/>ATTREZZATURE</b>                                   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>INDICAZIONI E MISURE<br/>DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vengono usate sostanze infiammabili (se sì quali)</b>           |           |           |                                                                                                                                                                                                        |
| • Benzina                                                          |           | <b>X</b>  | Stoccaggio vietato                                                                                                                                                                                     |
| • Gasolio                                                          |           | <b>X</b>  | Stoccaggio vietato                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mezzi e sistemi di prevenzione degli incendi</b>                |           |           |                                                                                                                                                                                                        |
| • Estintori                                                        | <b>X</b>  |           | - a schiuma (sui mezzi da cantiere)<br>- ad anidride carbonica (quadri e motori elettrici, gruppo elettrogeno)<br>- a polvere (nelle baracche, depositi o stoccaggi infiammabili, e mezzi da cantiere) |
| • Idranti                                                          |           | <b>X</b>  |                                                                                                                                                                                                        |
| E' stato nominato il responsabile del servizio Antincendio         |           |           | Da definire ad appalto aggiudicato                                                                                                                                                                     |
| E' stato nominato il responsabile del servizio di Evacuazione      |           |           | Da definire ad appalto aggiudicato                                                                                                                                                                     |
| E' stato nominato il responsabile del servizio del Pronto Soccorso |           |           | Da definire ad appalto aggiudicato                                                                                                                                                                     |

**NUMERI TELEFONICI UTILI**

( da compilare a cura dell'impresa che si aggiudica l'appalto )

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Polizia</b>                                  | <b>113</b>          |
| <b>Carabinieri</b>                              | <b>112</b>          |
| <b>Pronto Soccorso Ambulanze</b>                | <b>118</b>          |
| <b>Vigili del Fuoco VV.F.</b>                   | <b>115</b>          |
| <b>AST ANCONA</b>                               | <b>071 8705551</b>  |
| <b>ISPESL territoriale di Ancona</b>            | <b>071 201 41</b>   |
| <b>Ispettorato del Lavoro di Ancona</b>         | <b>071 2867 161</b> |
| <b>Acqua e gas</b>                              | <b>071 2893330</b>  |
| <b>Elettricità ENEL</b>                         | <b>071 2814 250</b> |
| <b>Direttore dei lavori</b>                     |                     |
| <b>Committente</b>                              | <b>071 5894 1</b>   |
| <b>Direttore dei lavori</b>                     |                     |
| <b>Responsabile di cantiere</b>                 |                     |
| <b>Capo cantiere</b>                            |                     |
| <b>Responsabile servizio di prevenzione</b>     |                     |
| <b>Coordinatore per l'esecuzione dei lavori</b> |                     |
| <b>Prefettura</b>                               | <b>071 228 21</b>   |
| <b>UO di ANCONA - reperibilità</b>              | <b>335 5982 385</b> |

**(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE)**

## 4.7 - MACCHINE E ATTREZZATURE

---

Si rimandano al **Piano Operativo di Sicurezza**, redatto a cura e spese della ditta aggiudicatrice dei lavori, le seguenti indicazioni:

- elencazione dei mezzi d'opera, attrezzature ed impianti da impiegare nel cantiere;
- individuazione dei rischi e delle misure legislative e tecniche ed adempimenti normativi per il loro utilizzo e funzionamento;
- individuazione dei DPI per il personale preposto all'utilizzo.

Di seguito si riportano i caratteri principali e generali delle norme di sicurezza per l'utilizzo delle macchine e attrezzature.

Le macchine e gli impianti sono installati e mantenuti secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine di controllare il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo. Inoltre al fine della scelta per il luogo di installazione degli impianti ed esercizio delle macchine devono essere rispettate tutte le specifiche tecniche del manuale di istruzione e dell'omologazione di sicurezza, quando prevista.

**Tutte le macchine e le attrezzature dovranno rispondere ai requisiti di sicurezza riportati negli allegati V e VI e VII (verifiche).**

E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. Del divieto devono essere edotti tutti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

**E' vietato rimuovere anche temporaneamente, modificare o alterare i dispositivi di sicurezza predisposti dalla casa costruttrice.**

**Il datore di lavoro (ditta appaltatrice) dovrà ottemperare a quanto disposto dall'art. 2 comma 4-quater del D.Lgs. 359/99.**

| MACCHINE<br>E ATTREZZATURE | DOCUMENTAZIONE<br>DI RIFERIMENTO                             | NOTE<br>OSSERVAZIONI |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Gru a torre                | Libretto di Collaudo ISPESL                                  |                      |
| Autogrù                    | Libretto di Collaudo ISPESL                                  |                      |
| Autocarro                  | Libretto di circolazione                                     |                      |
| Autocarro con gru          | Libretto di circolazione e Libretto di Collaudo ISPESL       |                      |
| Ponteggio metallico fisso  | Autorizzazione ministeriale                                  |                      |
| Betoniera a bicchiere      | Libretto di manutenzione                                     |                      |
| Impianto di betonaggio     | Libretto di manutenzione                                     |                      |
| Compressori                | Collaudo ISPENSL                                             |                      |
| Argano a cavalletto        | Se > 200 kg libretto di ISPENSL.<br>Libretto di manutenzione |                      |
| Argano a bandiera          | Se > 200 kg libretto di ISPENSL.<br>Libretto di manutenzione |                      |
| Betoniera autocaricante    | Libretto di manutenzione d'uso                               |                      |
| Sega circolare             | Libretto di manutenzione d'uso                               |                      |
| Scale portatili            | Libretto di manutenzione d'uso                               |                      |
| Gruppo elettrogeno         | Libretto di manutenzione d'uso                               |                      |
| Martello demolitore        | Libretto di manutenzione d'uso                               |                      |
| Cesoia                     | Libretto di manutenzione d'uso                               |                      |
| Trabattelli                | Libretto di manutenzione d'uso                               |                      |
| Trapani                    | Libretto di manutenzione d'uso                               |                      |
| Utensili                   | Libretto di manutenzione d'uso                               |                      |
| Macchine escavatrici       | Libretto di Collaudo ISPESL                                  |                      |

## 4.8 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/ATTREZZATURE

---

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono tutte quelle operazioni di trasporto o sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che per sue caratteristiche comporta rischi di patologie da sovraccarico (art. 167 comma 2, D.Lgs. 81/08)

Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, adottando, se del caso, attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 art. 168, comma 1). Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro deve (D. Lgs. 81/08 art. 168, comma 2) :

- a) organizzare i posti di lavoro così da assicurare la movimentazione in condizioni di sicurezza e salute;
- b) valutare, se possibile, le condizioni di sicurezza e salute secondo quanto disposto dall'allegato XXXIII;
- c) evitare o ridurre i rischi di patologie dorso-lombari adottando misure adeguate;
- d) sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali.

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del carico, del suo centro di gravità e sulla sua corretta movimentazione (D. Lgs. 81/08 art. 169), tenendo conto delle prescrizioni dell'allegato XXXIII.

Per la movimentazione dei carichi sono usati quanto più possibile mezzi ausiliari atti ad evitare o ridurre le sollecitazioni sulle persone. Al manovratore del mezzo di sollevamento e/o trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l'ausilio di un eventuale aiutante

Per quanto riguarda i mezzi utilizzabili per la movimentazione di materiali dovranno risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati, dovranno essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa e dovranno avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la zona di azione.

Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

**Tutte le caratteristiche e le prescrizioni applicabili a tali attrezzature sono quelle dell'allegato V del D.Lgs. 81/08.**

#### 4.9 - D.P.I.

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti è quello di fornire DPI adeguati, di curare l'informazione e la formazione all'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

Tutti i D.P.I. devono essere attestati mediante certificazione CE.

Di seguito si riporta un elenco generale e pertanto non esaustivo del tipo di protezione con relativo D.P.I..

Nelle schede di riferimento delle fasi lavorative vengono individuati i relativi D.P.I. da impiegare.

| TIPO DI PROTEZIONE                     | TIPO DI DPI                                                                           | MANSIONE SVOLTA                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Protezione del capo                    | Casco, copricapo di lana, cappello                                                    | Manovale, muratore, capocantiere, ferraio, gruista |
| Protezione dell'udito                  | Cuffie - Inserti - Tappi                                                              | Manovale, muratore, capocantiere, ferraio, gruista |
| Protezioni occhi e viso                | Occhiali, visiera                                                                     | Manovale, muratore, capocantiere, ferraio, gruista |
| Protezione delle vie respiratorie      | Maschere in cotone, maschere al carbonio, maschere antipolvere                        | Manovale, muratore, capocantiere, ferraio, gruista |
| Protezione dei piedi                   | Scarpe antinfortunistiche, stivali in gomma                                           | Manovale, muratore, capocantiere, ferraio, gruista |
| Protezione delle mani                  | Guanti in pelle<br>Guanti in gomma<br>Guanti in lattice<br>Guanti in maglia metallica | Manovale, muratore, capocantiere, ferraio, gruista |
| Protezione delle altre parti del corpo | Gambali in cuoio<br>Ginocchiere                                                       | Manovale, muratore, capocantiere, ferraio, gruista |
| Protezione contro le cadute dall'alto  | Cinture di sicurezza.                                                                 | Manovale, muratore, capocantiere, ferraio, gruista |

4.10 - INFORMAZIONE

---

**INFORMAZIONE**

(da compilare a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)

| INFORMAZIONE                               | DATA | CONTENUTI |
|--------------------------------------------|------|-----------|
| Presentazione del Piano di Sicurezza       |      |           |
| Aggiornamento del Piano di Sicurezza       |      |           |
| Riunione periodica art. 35 D.Lgs. n. 81/08 |      |           |
| Riunione di coordinamento imprese          |      |           |
| Informazione dei lavoratori                |      |           |
| Addestramento dei lavoratori               |      |           |

**5**

**IDENTIFICAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE  
PERICOLI INFORTUNISTICI E DI ESPOSIZIONE  
-MISURE DI PREVENZIONE**

**5.1- DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FASI LAVORATIVE**

---

**5.1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE FASI LAVORATIVE**

---

| ID. | NOME ATTIVITA'                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 0   | ALLESTIMENTO CANTIERE                                          |
| 1   | FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO                 |
| 2   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO TIPO BINDER |
| 3   | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA                    |
| 00  | SMOBILIZZO CANTIERE                                            |

Per quanto riguarda le prescrizioni operative, i tipi di rischio e le relative contromisure di ciascuna fase operativa si rimanda all'ALLEGATO N. 3.

**6**

## **PROGRAMMA DEI LAVORI**

### **6.1 - CRONOPROGRAMMA**

[illegible]

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | Intero cantiere |
|--|-----------------|

**7**

## **IDENTIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE FASI SOVRAPPOSTE**

### **7.1- IDENTIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE FASI SOVRAPPOSTE**

---

## **7.1 - IDENTIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE FASI SOVRAPPOSTE**

---

Il programma dei Lavori è basato sui documenti contrattuali e sulle tavole di progetto, è stato individuato in modo da non avere fasi sovrapposte.

E' compito dell'Impresa assegnataria confermare quanto esposto e notificare immediatamente al Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva eventuali modifiche o diversità rispetto quanto programmato.

Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell'apertura del cantiere.

Le eventuali modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante. Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.

**Il programma dei lavori è stato definito in modo da non creare sovrapposizioni fra le varie fasi.**

**Il programma dei lavori viene rappresentato tramite il grafico di GANTT**

**8**

**VALUTAZIONE DEI COSTI E DELLE MISURE  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**8.1 - VALUTAZIONE DEI COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

## 8.1 - VALUTAZIONE DEI COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

I costi principali degli apprestamenti della sicurezza sono i seguenti:

1. Costo delle opere provvisorie ( ponteggi, impalcati, ecc.);
2. Costo opere relative all'impiantistica ( impianto di messa a terra );
3. Costo adeguamento e manutenzione macchine;
4. Costo dei Dispositivi collettivi di protezione (DPC);
5. Costo opere igienico assistenziali ( servizi di cantiere );
6. Costo opere relative alla logistica ( allestimento del cantiere );
7. Costo opere relative alle interferenze ( interferenze con l'esterno e all'interno del cantiere );
8. Costo DPI ( Dispositivi Personali di Protezione );
9. Costo opere speciali relative ad apprestamenti di sicurezza specifici;
10. Costo prevenzione incendi;
11. Costo per informazioni e formazioni dei lavoratori;
12. Costo per i controlli sanitari;
13. Costo per partecipazione, cooperazione e controllo;
14. Costo per aggiornamento SPP;
15. Costo della segnaletica stradale e di sicurezza.

La **valutazione dei costi** è stimata attraverso l'articolazione degli apprestamenti di sicurezza in 3 elementi:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elem.</b> | In questo elemento vengono individuati i costi delle misure di sicurezza <b>già contemplati nel computo metrico estimativo</b> , in quanto i prezzi base contengono già quota parte dell'incidenza delle opere di protezione.                                                        |
| <b>A</b>     | <p><b>Questi costi non si sommano al costo dell'opera.</b></p> <p>Questo elemento viene individuato attraverso l'analisi del computo metrico estimativo dove si individua l'incidenza delle misure di sicurezza attraverso un valore in % sull'ammontare complessivo dei lavori.</p> |
| <b>Elem.</b> | Costi non contemplati direttamente nel computo metrico estimativo ma <b>previsti nelle spese generali dell'impresa</b> , pertanto riconosciute nella stima dei costi.                                                                                                                |
| <b>B</b>     | <p><b>Anche questi costi non si sommano al costo dell'opera.</b></p> <p>Questo elemento viene individuato applicando un valore percentuale all'ammontare complessivo dei lavori.</p>                                                                                                 |
| <b>Elem.</b> | Costi previsti dal contratto d'appalto e/o dal piano di sicurezza e coordinamento <b>non contemplati nel computo metrico estimativo e nelle spese generali</b> .                                                                                                                     |
| <b>C</b>     | <p><b>Questi costi vanno aggiunti al costo dell'opera preventivato.</b></p> <p>Questo valore è definito attraverso un computo metrico estimativo per singolo cantiere in relazione ai problemi evidenziati nel piano e nel contratto d'appalto.</p>                                  |

**Ai sensi dell'art. 100 comma 5 del D. Lgs. 81/08, le eventuali integrazioni che possono essere presentate da parte dell'impresa aggiudicatrice al presente piano di sicurezza e coordinamento non giustificano modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.**

**Elemento A e B****Costi delle opere già contemplati nel computo metrico estimativo e nelle spese generali riconosciute all'impresa.****Organizzazione del cantiere**

Delimitazione e recinzione dell'area di cantiere

Tabella lavori di cantiere

Portali di accesso al cantiere in legno compresa controventatura

Portoni carrai

Piste carrabili e predisposizione della viabilità interna

Segnaletica stradale di sicurezza

Nastri segnaletici per delimitazione aree

Estintori a polvere, a schiuma e ad anidride carbonica omologati

Predisposizione e preparazione delle aree adibite a baracche, logistica/servizi, depositi e per attrezzature

Baracca di cantiere

Spogliatoi e servizi

Pacchetto di medicazione

Predisposizione del piano di emergenza

**Opere provvisorie**

Parapetti di protezione provvisoria

Reti di protezione

Andatoie e passerelle

Tettoie di protezione

Sagomatura dei cigli degli scavi per evitare franamenti e cedimenti

Informazione e formazione dei lavoratori

Paratie mobili in acciaio

**Gestione del piano di sicurezza**

Riunione d'informazione degli addetti

Riunione d'informazione con subappalti

Formazione dei neoassunti

Esercitazione d'evacuazione

**Opere relative all'impiantistica/macchine/attrezzature**

Impianto di messa a terra

Impianto di cantiere

Dispositivi di sicurezza relativi alle macchine ed attrezzature

**DPI - Stima Dispositivi di protezione individuale**

Calzature di sicurezza

Protezioni auricolari

Elmetto di protezione

Guanti

Occhiali di protezione

Maschere di protezione

Cinture di sicurezza

| <b>Importo stimato dei lavori<br/>(Escluso di oneri)</b> | <b>Stima dei costi per l'attuazione<br/>dei Piani di Sicurezza (aggiuntivi)</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Euro 956.828,24</b>                                   | <b>Euro 1.650,97</b>                                                            |

## **PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**

**9.1 - CRITERI SEGUITI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL P.S.C.**

**9.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

## 9.1 - CRITERI SEGUITI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL P.S.C.

A seguito della predisposizione del Programma dei lavori convenuto con il progettista dell'opera, si è convenuta all'identificazione delle:

- fasi lavorative, in relazione all'evoluzione del programma stesso;
- fasi lavorative che si sovrappongono;
- inizio, fine e relativa durata di ogni singola fase;
- figure professionali coinvolte nella realizzazione dell'opera;
- individuazione dei rischi fisici e ambientali presenti;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare;
- individuazione dei Dispositivi di Protezione Collettiva da realizzare;
- programmazione delle verifiche periodiche;
- indicazione della segnaletica occorrente;
- individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuali da utilizzare.

In relazione alla natura dell'opera i rischi sono stati valutati facendo riferimento a tre grandi aree.

**Rischi per la sicurezza dovuti a:**

*(Rischi di natura infortunistica)*

- Strutture
- Macchine
- Impianti Elettrici
- Sostanze pericolose
- Opere provvisorie di protezione
- Incendio ed esplosioni

**Rischi per la salute dovuti a:**

*(Rischi di natura igienico ambientale)*

- Agenti chimici
- Agenti fisici
- Agenti biologici

**Rischi per la sicurezza e salute dovuti a:**

*(Rischio di tipo cosiddetto trasversale)*

- Organizzazione del lavoro
- Fattori psicologici
- Fattori ergonomici
- Condizioni di lavoro difficili

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del Contratto d'appalto delle Opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali.

Si richiama a questo proposito quanto definito nell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 che prevede che durante la realizzazione dell'opera il **coordinatore per l'esecuzione** dei lavori provvede a:

- Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- Verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza e del PIMUS ( piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio), da considerare come piani complementari di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza del cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.
- Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
- Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
- Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (*obblighi dei lavoratori autonomi*), 95 (*misure generali di tutela*) e 96 (*obblighi dei datori di lavoro*) e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 e proporre:
  - la sospensione dei lavori,

- l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,
  - o la risoluzione del contratto.
- f) Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro.
- g) Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

**Ai sensi dell'art. 131 della D.Lgs. 163/06, l'impresa aggiudicatrice dei lavori, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori dovrà consegnare i seguenti documenti:**

1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
2. un **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, dettagliando i seguenti aspetti:
  - a) **ragione sociale dell'impresa e ubicazione del cantiere;**
  - b) **definizione di tutte le figure previste nel D. Lgs. 81/08 (datore di lavoro, medico competente, SPPR, RLS, ...)**
  - c) **schede di valutazione dei rischi inerenti le lavorazioni specifiche del cantiere con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;**
  - d) **elencazione dei mezzi d'opera, attrezzature ed impianti di cantiere utilizzati, con l'individuazione dei rischi, delle misure legislative e tecniche e adempimenti normativi per il loro corretto utilizzo e funzionamento, compresi i D.P.I. e collettivi da impiegare;**
  - e) **compiti, attrezzature e organizzazione dei lavoratori incaricati della attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque di gestione delle emergenze del cantiere;**
  - f) **pianificazione dettagliata delle singole fasi lavorative.**
3. un eventuale **PIMUS "piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio"** ai sensi del D.Lgs n.235/2003.

## 9.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

---

- **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547** - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- **D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303** - Norme generali per l'igiene del lavoro.
- **D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320** - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.
- **D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321** - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.
- **D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164** - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
- **D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277** - Attuazione delle direttive n.80/1107/CEE, n.86/188/CEE e n.88/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro.
- **D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (integrato e modificato dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10)**- Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di riavvicinamento della legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale'(questo decreto riporta i requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e le procedure per l'apposizione del marchio di conformità CE).
- **D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (e successive modifiche)**- Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro' (relativa ai luoghi di lavoro, all'uso delle attrezzature di lavoro, all'uso dei dispositivi di protezione individuale, alla movimentazione manuale dei carichi, all'uso di attrezzature munite di videoterminale).
- **Legge 5 marzo 1990, n. 46** - Norme per la sicurezza degli impianti' e **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 417**: Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti' (si applicano agli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici).
- **Norme CEI** in materia di impianti elettrici.
- **Norme UNI-CIG** in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile.
- **Norme EN o UNI** in materia di macchine.
- **Circolare del ministero della Sanità 25 novembre 1991, n. 23** - Usi delle fibre di vetro isolanti. Problematiche igienico sanitarie. Istruzioni per il corretto impiego.
- **D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459** (recepimento della direttiva macchine).
- **D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493** - Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
- **D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e succ. modifiche** - Attuazione della direttiva concernente le prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
- **D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** - Nuovo codice della strada.
- **D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (mod. dal D.P.R. 610/96)** - Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada.
- **D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222** - Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo31, comma1, della legge 11 febbraio 1994, n.109
- **D.lgs n.235/2003** - Sicurezza delle attrezzature per lavori in quota
- **D.leg. vo 19/08/2005 n. 187** – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
- **D.leg. vo 10/04/2006 n. 195** – Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici.
- **Legge 3 Marzo 2007, n. 123** – Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **D.leg. vo 09/04/2008 n. 81** – Attuazione art. 1 L. 03/08/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **D.leg. vo 03/08/2009 n. 106** – Disposizioni integrative e correttive del D.leg. vo 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

**IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO ELABORATO DA:**

Il Coordinatore per la progettazione

Dott. Ing. Alessia Montucchiari

.....  
(nome e cognome)

.....  
(firma)

**IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO VISIONATO DA:**

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

.....  
(cognome e nome)

(firma)

Il Responsabile dei Lavori

.....  
(cognome e nome)

.....  
(firma)

Il Committente

.....  
(cognome e nome)

.....  
(firma)

L'impresa esecutrice

.....  
(cognome e nome)

.....  
(firma)

**IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO VISIONATO DAL RLS.**

.....  
(cognome e nome)

.....  
(firma)

|                 |
|-----------------|
| <b>ALLEGATI</b> |
|-----------------|

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ALLEGATO N.1</b> | <b>TABELLA INFORMATIVA DI CANTIERE</b>               |
| <b>ALLEGATO N.2</b> | <b>LAY-OUT DI CANTIERE</b>                           |
| <b>ALLEGATO N.3</b> | <b>SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE</b>                  |
| <b>ALLEGATO N.4</b> | <b>ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b> |

**ALLEGATO N. 1**

**TABELLA INFORMATIVA DI CANTIERE**

**TABELLA INFORMATIVA DEI LAVORI**


(CIRC. MIN. LL.PP. N. 1729 DEL 1/6/1990)


DIMENSIONI 100x200 cm


|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTE APPALTANTE<br>PROVINCIA DI ANCONA                                                                                                                                                  |
| <b>Comuni di :</b> .....                                                                                                                                                                |
| <b>Concessione/Autorizzazione Edilizia n. .... del .....</b>                                                                                                                            |
| <b>Lavori :</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>Importo complessivo dei lavori : €</b>                                                                                                                                               |
| <b>Impresa/e esecutrice/i : CONSORZIO STABILE COIM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (C.F. E P.IVA: 02780750416) in ATI con GRANCHI S.R.L. (C.F. E P.IVA: 01248990507)</b> |
| <b>Impresa/e subappaltatrice/i :</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Data di consegna dei lavori : .</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Data contrattuale di ultimazione dei lavori :</b>                                                                                                                                    |
| <b>Responsabile Unico del Progetto : Dott. Ing. Monica Ulissi</b><br>(Provincia di Ancona -Settore III Area Viabilità)                                                                  |
| <b>Progettista : Geom. Anna Barucca</b> (Provincia di Ancona -Settore III Area Viabilità)                                                                                               |
| <b>Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione dell'opera :</b><br><b>Dott. Ing. Alessia Montucchiari</b><br>(Provincia di Ancona - Settore III Area Viabilità)           |
| <b>Direttore dei lavori : Geom. Anna Barucca</b> (Provincia di Ancona -Settore III Area Viabilità)                                                                                      |
| <b>Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dell'opera:</b><br><b>Dott. Ing. Alessia Montucchiari</b><br>(Provincia di Ancona - Settore III Area Viabilità)                |
| <b>Direttore Operativo :</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Direttore del cantiere :</b>                                                                                                                                                         |
| <b>Responsabile ( indicare il recapito , anche telefonico ):</b>                                                                                                                        |
| <b>Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico :</b>                                                                                                              |
| <b>Nota : del cantiere</b><br>ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso .....<br>.....                                                                            |

**ALLEGATO N. 2**

**LAY-OUT DI CANTIERE**  
**(compresi Schemi di segnaletica)**

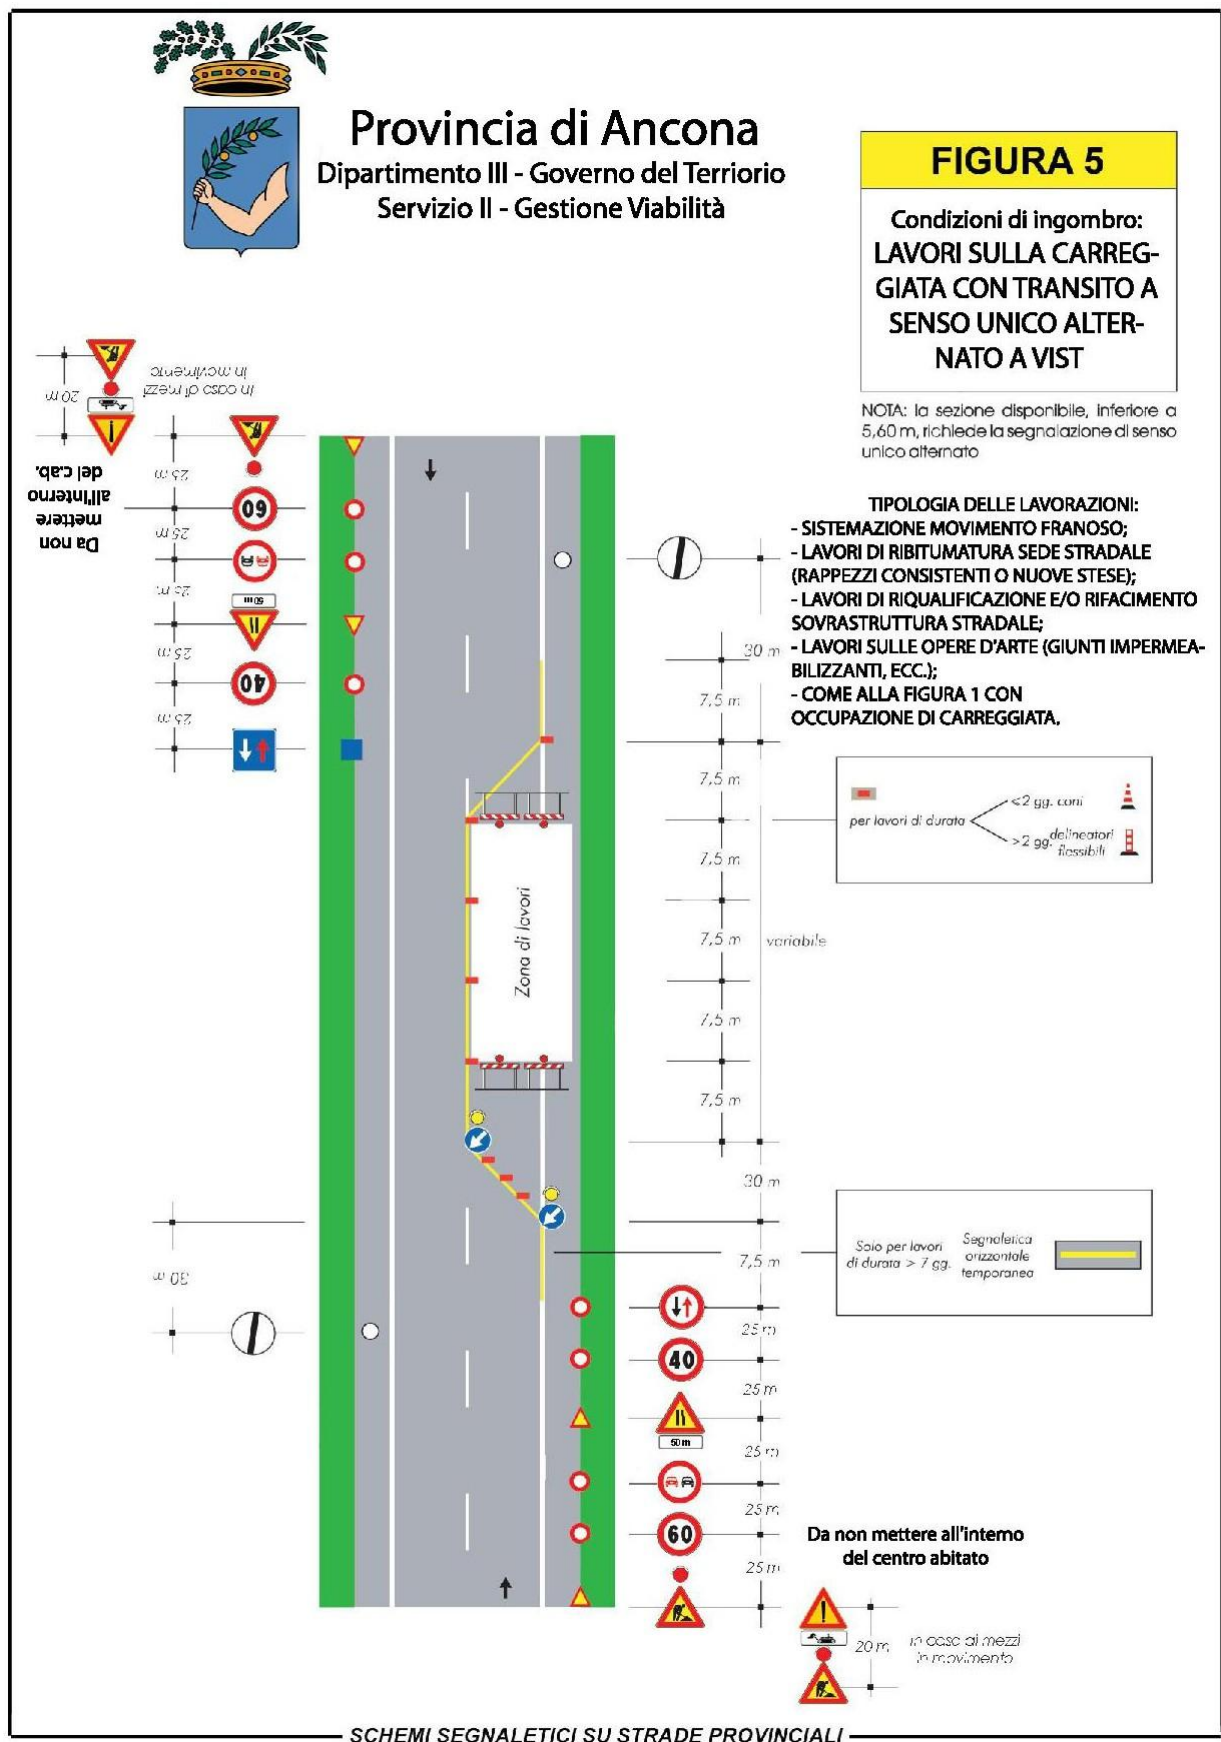

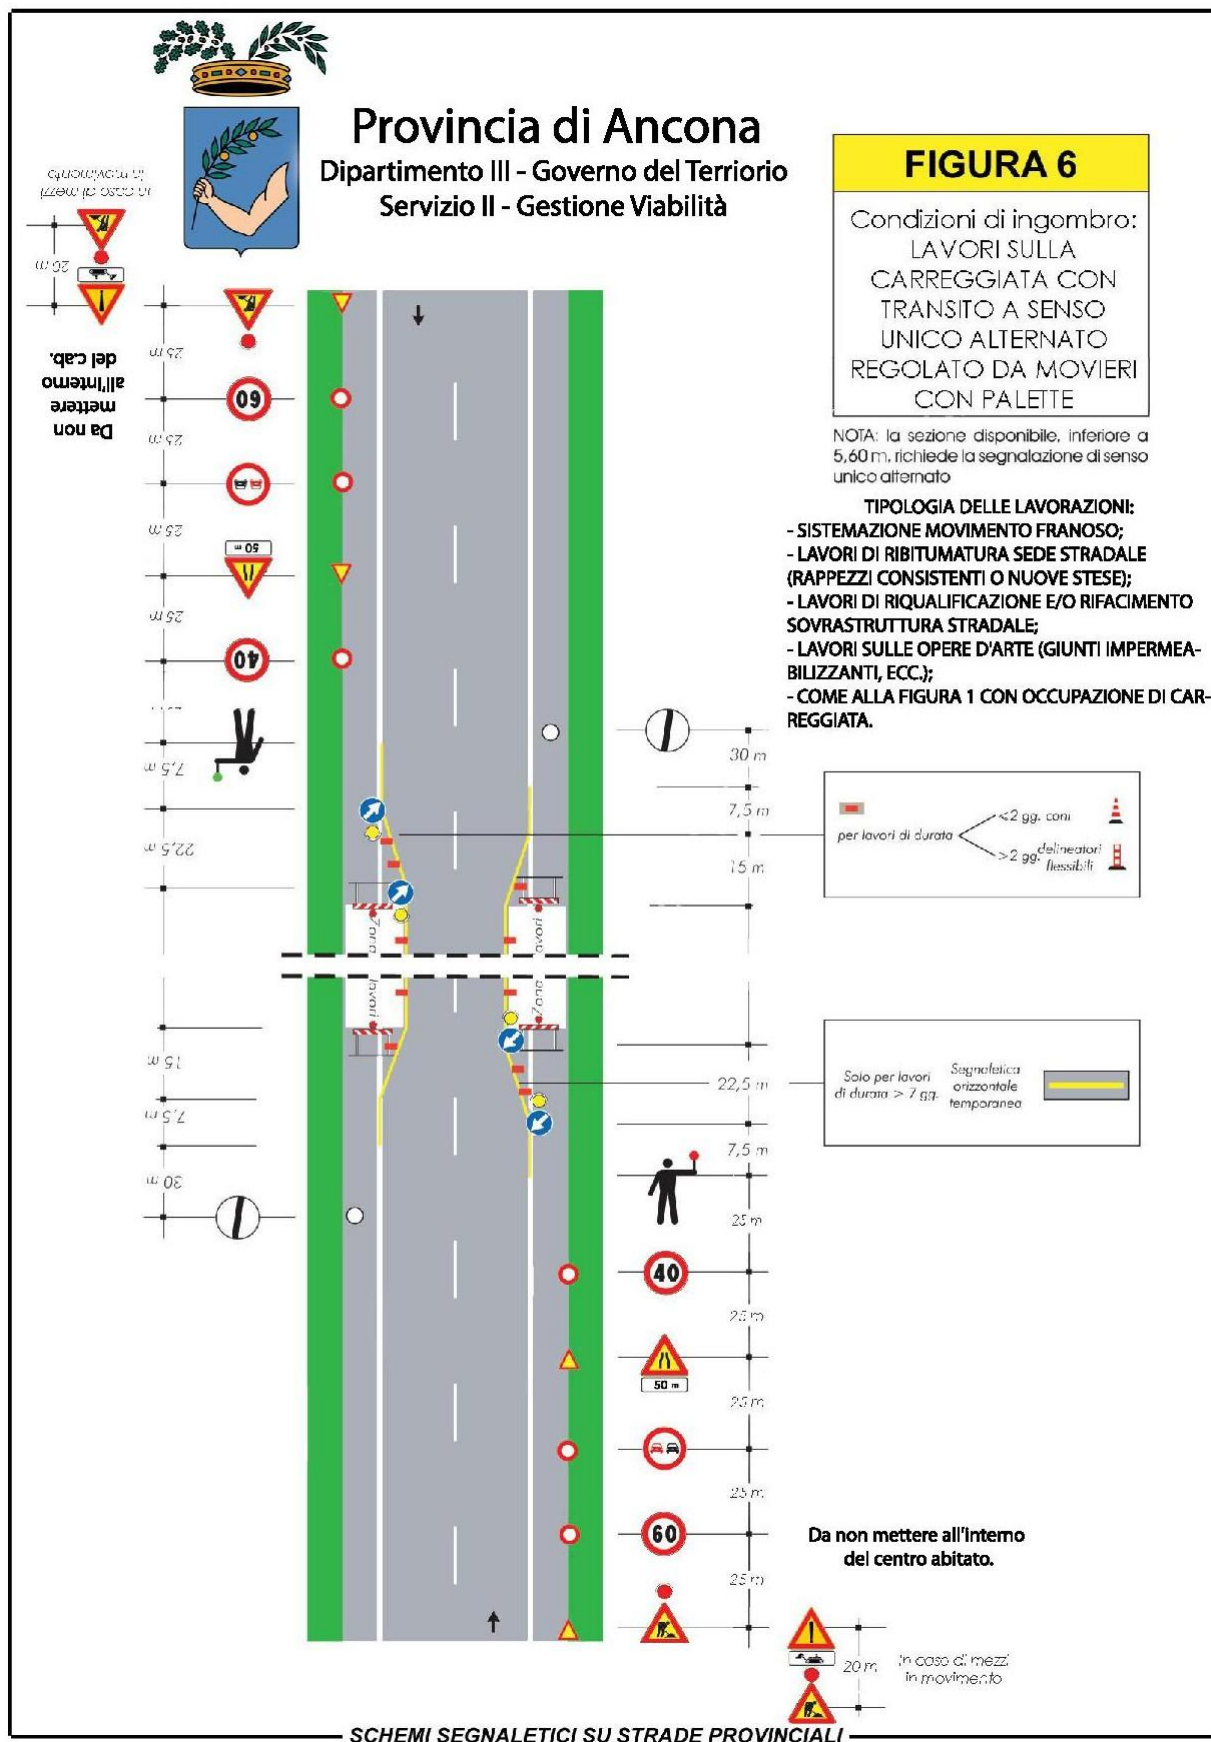

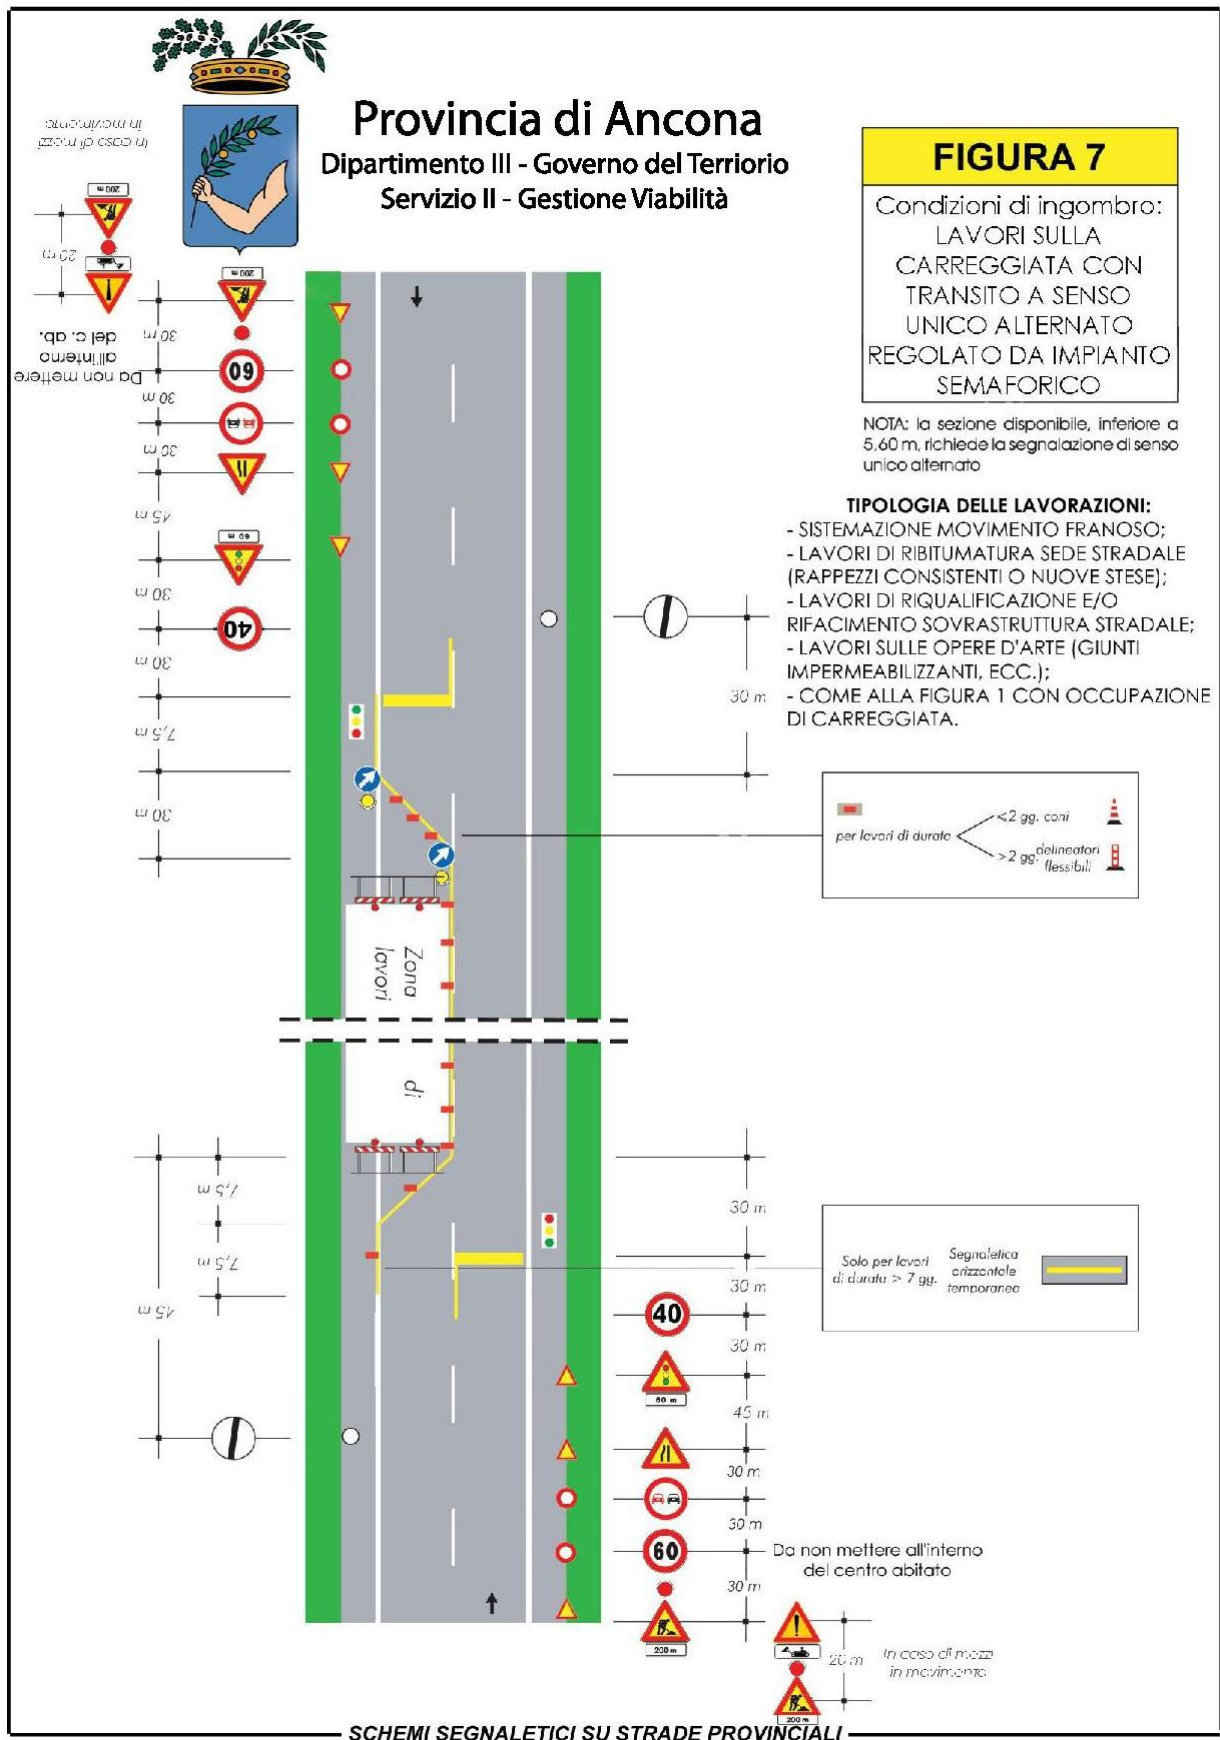

**ALLEGATO N. 3**  
**SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE**

***Elenco delle fasi lavorative***

- Fresatura di strati in conglomerato bituminoso
- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento tipo Binder
- Conglomerato bituminoso per strato di usura

| Fresatura di strati in conglomerato bituminoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Categoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Strade                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |
| Descrizione<br>(Tipo di intervento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La fase lavorativa prevede le attività necessarie per la scarifica del manto stradale:<br>a) trasporto dei mezzi in cantiere;<br>b) scarifica del manto stradale e scarico dei materiali direttamente sui mezzi per il trasporto in discarica;<br>c) pulizia del cantiere. |       |       |
| Esecutori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Impresa esecutrice: Coromano                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
| Fattori di rischio utilizzati nella fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
| Attrezzature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Autocarro</li><li>▪ Scarificatrice</li></ul>                                                                                                                                                                                       |       |       |
| Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
| Investimento da veicoli nell'area di cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Improbabile                                                                                                                                                                                                                                                                | Medio | Lieve |
| Rischi da uso di sostanze chimiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Poco probabile                                                                                                                                                                                                                                                             | Medio | Lieve |
| Rumore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poco probabile                                                                                                                                                                                                                                                             | Medio | Lieve |
| Scelte progettuali ed organizzative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
| [Rumore]<br>Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone adiacenti o limitrofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
| Procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
| [Investimento da veicoli nell'area di cantiere]<br>- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di fraporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.<br>- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |
| [Rischi da uso di sostanze chimiche]<br>- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:<br>a) La corretta manipolazione.<br>b) Lo stoccaggio.<br>c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.<br>d) Le sostanze incompatibili.<br>- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.<br>- Controllo dell'efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.<br>- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente.<br>- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.<br>- Sorveglianza sull'uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.<br>- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.<br>- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente, si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.<br>- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente necessaria.<br>- Il posto di lavoro e l'ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.<br>- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia prescritti dal produttore. |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |

| <p>[Rumore]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.</li> <li>- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.</li> <li>- Vigilare sull'uso degli ottoprotettori.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure preventive e protettive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]</p> <p>Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici per essere chiaramente visibili.</li> <li>- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di protezione.</li> <li>- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.</li> </ul> <p>[Rischi da uso di sostanze chimiche]</p> <p>Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla concentrazione di inquinanti aerodispersi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.</li> <li>b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in modo significativo la quantità presente all'interno degli ambienti di lavoro.</li> </ol> </li> <li>- Confinamento con teli delle aree a rischio.</li> <li>- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.</li> <li>- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso di contatto accidentale.</li> <li>- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi sanitari.</li> <li>- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.</li> </ul> <p>[Rumore]</p> <p>Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.</li> <li>- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.</li> <li>- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.</li> <li>- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.</li> </ul> |
| Misure di coordinamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]</p> <p>Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano.</p> <p>Incaricare un preposto che coordini affinché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun lavoratore si trovi nel campo d'azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto</li> <li>- nessun lavoratori sostì in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.</li> <li>- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.</li> <li>- nessun lavoratore transiti o sostì nelle zone di carico o scarico dei materiali.</li> </ul> <p>[Rischi da uso di sostanze chimiche]</p> <p>Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano.</p> <p>[Rumore]</p> <p>Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa area.

| Conglomerato bituminoso per strato di collegamento tipo Binder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Categoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strade                                                                                                           |       |       |
| Descrizione<br>(Tipo di intervento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | La fase lavorativa prevede la fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)    |       |       |
| Fattori di rischio utilizzati nella fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |       |       |
| Attrezzature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Autocarro</li><li>▪ Rullo compressore</li><li>▪ Vibrofinitrice</li></ul> |       |       |
| Sostanze pericolose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Inerti di bitume e mastice d'asfalto</li></ul>                           |       |       |
| Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |       |       |
| Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Improbabile                                                                                                      | Grave | Lieve |
| Investimento da veicoli nell'area di cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Improbabile                                                                                                      | Grave | Lieve |
| Rischi da uso di sostanze chimiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Poco probabile                                                                                                   | Medio | Lieve |
| Rumore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Poco probabile                                                                                                   | Medio | Lieve |
| Scelte progettuali ed organizzative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |       |       |
| [Rumore]<br>Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone adiacenti o limitrofe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |       |       |
| Procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |       |       |
| [Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]<br>- Adozione di piano di emergenza specifico di cantiere.<br>- Allontanamento dei lavoratori e di terzi in caso di pericolo grave e immediato.<br>- Mantenimento delle vie e uscite di emergenza libere da materiali.<br>- Verificare che lo stoccaggio dei materiali con pericolo di incendio avvenga in aree appropriate lontano da fonti di calore o sorgenti di innesco.<br>- Mantenimento in efficienza dei presidi antincendio.<br>- Controllo funzionale dei sistemi di rilevamento e spegnimento.<br>- I lavoratori che operano all'interno di ambiente con possibile presenza di atmosfera esplosiva devono essere dotati di strumenti di rilevazione gas.<br>- Durante la manipolazione dei prodotti infiammabili evitare le fonti di innesco quali fuoco aperto, scintille, superfici calde, radiazioni caloriche e simili<br>- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da polveri e gas utilizzare attrezzature conformi alla direttiva ATEX.<br>- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da polveri e gas dotare i lavoratori di dispositivi portatili di rilevazione gas. |                                                                                                                  |       |       |
| [Investimento da veicoli nell'area di cantiere]<br>- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di fraporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.<br>- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |       |       |
| [Rischi da uso di sostanze chimiche]<br>- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:<br>a) La corretta manipolazione.<br>b) Lo stoccaggio.<br>c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |       |       |

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.
- Controllo dell'efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.
- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente.
- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
- Sorveglianza sull'uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.
- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente, si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.
- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente necessaria.
- Il posto di lavoro e l'ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.
- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia prescritti dal produttore.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorosi contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.
- Vigilare sull'uso degli otoprotettori.

#### Misure preventive e protettive

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]

Per la protezione dei lavoratori nei lavori effettuati con materiali infiammabili, esplosivi, comburenti, con sorgenti di innesco (fiamme libere) predisporre:

- Delimitazione del perimetro con teli ignifughi.
- Utilizzo di attrezzature di lavoro (saldatrice, cannello, bombole e simili) in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- Utilizzo di attrezzature elettriche conformi alla direttiva ATEX in ambienti con presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva.
- Segnalazione del rischio con segnaletica di sicurezza per informare i lavoratori.

Per la gestione delle emergenze è necessario predisporre:

- Illuminazione di emergenza e segnalazione delle vie e uscite di emergenza.
- Servizi di intervento con squadra antincendio formata ed attrezzata per il recupero delle persone e lo spegnimento dell'incendio.
- Per la sicurezza dei lavoratori dal rischio incendio o esplosione, si dovrà disporre all'occorrenza di strumenti di rilevazione di gas nocivi od esplodenti.
- Mezzi antincendio portatili (estintori) facilmente raggiungibili e segnalati.
- Mezzi antincendio fissi (idranti o naspi) facilmente raggiungibili e segnalati.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici per essere chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla concentrazione di inquinanti aerodispersi:
  - a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.
  - b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in modo significativo la quantità presente all'interno degli ambienti di lavoro.
- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.
- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso di contatto accidentale.
- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi sanitari.
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.

#### [Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:

- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.

### Misure di coordinamento

#### [Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone con pericolo di incendio.
- nessun lavoratori soste in prossimità dei lavori con utilizzo di materiali con pericolo di incendio o esplosione.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con uso di materiali con pericolo di incendio ed esplosione e attività con sorgenti di innesco.

#### [Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo d'azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori soste in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
- nessun lavoratore transiti o soste nelle zone di carico o scarico dei materiali.

#### [Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

#### [Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa area.

| Conglomerato bituminoso per strato di usura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Categoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Strade                                                                                                                                                         |       |       |
| Descrizione<br>(Tipo di intervento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | La fase lavorativa prevede la posa di conglomerato bituminoso per lo strato di usura (tappetino) fornito in cantiere con temperatura non inferiore a 150 gradi |       |       |
| Fattori di rischio utilizzati nella fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |       |       |
| Attrezzature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Autocarro</li><li>▪ Rullo compressore</li><li>▪ Vibrofinitrice</li></ul>                                               |       |       |
| Sostanze pericolose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Emulsione di bitume/caucciù</li></ul>                                                                                  |       |       |
| Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |       |       |
| Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Improbabile                                                                                                                                                    | Grave | Lieve |
| Investimento da veicoli nell'area di cantiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Improbabile                                                                                                                                                    | Grave | Lieve |
| Rischi da uso di sostanze chimiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Poco probabile                                                                                                                                                 | Medio | Lieve |
| Procedure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |       |       |
| <p>[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Adozione di piano di emergenza specifico di cantiere.</li><li>- Allontanamento dei lavoratori e di terzi in caso di pericolo grave e immediato.</li><li>- Mantenimento delle vie e uscite di emergenza libere da materiali.</li><li>- Verificare che lo stoccaggio dei materiali con pericolo di incendio avvenga in aree appropriate lontano da fonti di calore o sorgenti di innesco.</li><li>- Mantenimento in efficienza dei presidi antincendio.</li><li>- Controllo funzionale dei sistemi di rilevamento e spegnimento.</li><li>- I lavoratori che operano all'interno di ambiente con possibile presenza di atmosfera esplosiva devono essere dotati di strumenti di rilevazione gas.</li><li>- Durante la manipolazione dei prodotti infiammabili evitare le fonti di innesco quali fuoco aperto, scintille, superfici calde, radiazioni caloriche e simili</li><li>- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da polveri e gas utilizzare attrezzature conformi alla direttiva ATEX.</li><li>- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da polveri e gas dotare i lavoratori di dispositivi portatili di rilevazione gas.</li></ul> <p>[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di fraporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.</li><li>- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.</li></ul> <p>[Rischi da uso di sostanze chimiche]</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:<ul style="list-style-type: none"><li>a) La corretta manipolazione.</li><li>b) Lo stoccaggio.</li><li>c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.</li><li>d) Le sostanze incompatibili.</li></ul></li><li>- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.</li><li>- Controllo dell'efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.</li><li>- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente.</li><li>- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.</li><li>- Sorveglianza sull'uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.</li><li>- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei</li></ul> |                                                                                                                                                                |       |       |

lavoratori.

- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente, si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.
- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente necessaria.
- Il posto di lavoro e l'ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.
- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia prescritti dal produttore.

#### Misure preventive e protettive

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]

Per la protezione dei lavoratori nei lavori effettuati con materiali infiammabili, esplosivi, comburenti, con sorgenti di innesco (fiamme libere) predisporre:

- Delimitazione del perimetro con teli ignifughi.
- Utilizzo di attrezzature di lavoro (saldatrice, cannello, bombole e simili) in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- Utilizzo di attrezzature elettriche conformi alla direttiva ATEX in ambienti con presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva.
- Segnalazione del rischio con segnaletica di sicurezza per informare i lavoratori.

Per la gestione delle emergenze è necessario predisporre:

- Illuminazione di emergenza e segnalazione delle vie e uscite di emergenza.
- Servizi di intervento con squadra antincendio formata ed attrezzata per il recupero delle persone e lo spegnimento dell'incendio.
- Per la sicurezza dei lavoratori dal rischio incendio o esplosione, si dovrà disporre all'occorrenza di strumenti di rilevazione di gas nocivi od esplosivi.
- Mezzi antincendio portatili (estintori) facilmente raggiungibili e segnalati.
- Mezzi antincendio fissi (idranti o naspi) facilmente raggiungibili e segnalati.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiatori e segnali acustici per essere chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla concentrazione di inquinanti aerodispersi:
  - a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.
  - b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in modo significativo la quantità presente all'interno degli ambienti di lavoro.
- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.
- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso di contatto accidentale.
- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati ed equipaggiati da presidi sanitari.
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.

#### Misure di coordinamento

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone con pericolo di incendio.
- nessun lavoratori sostì in prossimità dei lavori con utilizzo di materiali con pericolo di incendio o esplosione.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con uso di materiali con pericolo di incendio ed esplosione e attività con sorgenti di innesco.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo d'azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sostì in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
- nessun lavoratore transiti o sostì nelle zone di carico o scarico dei materiali.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

## **ALLEGATO N. 4**

### **ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

| Num.Ord.<br>TARIFFA                    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                                        | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |          |
| 1 / 1<br>26.01.04.30.002<br>11/06/2024 | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b><br><br><b>SP 4 "del Vallone" a tratti dal km 2+500 al km 9+000 circa<br/>Comune di Ancona, dal km 19+000 al km 19+500 circa nel<br/>Comune di Polverigi, dal km 25+000 al km 26+085 nel<br/>Comune di Santa Maria Nuova (Cat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |          |
|                                        | Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazion ... dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo d'uso mensile Con restringimento della carreggiata opposta ai lavori<br>Cat 1 - SP 4 "del Vallone" a tratti dal km 2+500 al km 9+000 circa Comune di Ancona, dal km 19+000 al km 19+500 circa nel Comune di Polverigi, dal km 25+000 al km 26+085 nel Comune di Santa Maria Nuova |            |       |       |        | 2,00     |          |          |
|                                        | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 2,00     | 261,96   | 523,92   |
| 2 / 2<br>26.01.04.31.001<br>11/06/2024 | <b>Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo d'uso primo mese</b><br>Cat 1 - SP 4 "del Vallone" a tratti dal km 2+500 al km 9+000 circa Comune di Ancona, dal km 19+000 al km 19+500 circa nel Comune di Polverigi, dal km 25+000 al km 26+085 nel Comune di Santa Maria Nuova                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 1,00     |          |          |
|                                        | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 1,00     | 86,81    | 86,81    |
| 3 / 3<br>26.01.04.31.002<br>11/06/2024 | <b>Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo per ogni mese successivo al primo</b><br>Cat 1 - SP 4 "del Vallone" a tratti dal km 2+500 al km 9+000 circa Comune di Ancona, dal km 19+000 al km 19+500 circa nel Comune di Polverigi, dal km 25+000 al km 26+085 nel Comune di Santa Maria Nuova                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 2,00     |          |          |
|                                        | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 2,00     | 33,51    | 67,02    |
| 4 / 4<br>26.01.04.30.002<br>11/06/2024 | <b>SP 26 "di Castelfidardo" dal km 0+000 al km 04+321 nel<br/>Comune di Castelfidardo (Cat 2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |          |
|                                        | Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della strada DLgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione e attuazion ... dai lavori (lunghezza ipotizzata 200 metri). Costo d'uso mensile Con restringimento della carreggiata opposta ai lavori<br>Cat 2 - SP 26 "di Castelfidardo" dal km 0+000 al km 04+321 nel Comune di Castelfidardo                                                                                                                    |            |       |       |        | 3,00     |          |          |
|                                        | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 3,00     | 261,96   | 785,88   |
| 5 / 5<br>26.01.04.31.001<br>11/06/2024 | <b>Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo d'uso primo mese</b><br>Cat 2 - SP 26 "di Castelfidardo" dal km 0+000 al km 04+321 nel Comune di Castelfidardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |       |        |          |          |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 1,00     |          |          |
|                                        | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        | 1,00     | 86,81    | 86,81    |
|                                        | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        |          |          | 1'550,44 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA                    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                         | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                 | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                                        | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          | 1'550,44 |
| 6 / 6<br>26.01.04.31.002<br>11/06/2024 | Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo per ogni mese successivo al primo Cat 2 - SP 26 "di Castelfidardo" dal km 0+000 al km 04+321 nel Comune di Castelfidardo |            |       |       |        | 3,00     | 33,51    | 100,53   |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 3,00     |          |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |          |
|                                        | SOMMANO cad                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          |          |
|                                        | Parziale LAVORI A MISURA euro                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          | 1'650,97 |
|                                        | TOTALE euro                                                                                                                                                                                                     |            |       |       |        |          |          | 1'650,97 |
|                                        | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          |          |
