



Provincia di Ancona

Settore III - Area Viabilità - Gestione e Sviluppo

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Lavori di Adeguamento, Miglioramento, recupero e difesa idraulica sulle

opere d'arte (ponti e viadotti) - S.P. n. 15 "Di Genga" al km 24+653 (Opera

n. 132) - Comune di Genga - R.O. di Fabriano - Cod. Int. (90.05).

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

IMPRESA: VENEZIA S.r.I.

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 8 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI Dott. Ing. Alessia Montucchiari

Num.Ord.			DIME	NSIONI		QUAN	TITA'	pag. 2 FIGURE
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazioni
	RIPORTO	1 0		<u> </u>	•			
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
14 02.05.002* .002 19/02/2024	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il m l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna Vedi allegato 3 al libretto delle misure n. 2							
	Ponteggio lato NE - direzione Genga Ponteggio lato NO - direzione Genga Vedi allegato 4 al libretto delle misure n. 2 Ponteggio - arco 6		37,50 35,00		10,200 8,000	382,50 280,00		
	(par.ug.=2*1,1) Ponteggio - arco 7	2,20 1,80 1,10	10,10 10,10 10,10		8,000 9,000 9,000	177,76 163,62 99,99		
	(par.ug.=2*1,1) Ponteggio - arco 8	2,20 1,80 1,10	10,00 10,00 10,00		6,500 7,500 7,500	143,00 135,00 82,50		
	(par.ug.=2*1,1)	2,20 1,80 1,10	9,80 9,80 9,80		5,000 6,000 6,000	107,80 105,84 64,68		
	Ponteggio - arco 9 (par.ug.=2*1,1)	2,20 1,80 1,10	9,65 9,65 9,65		3,000 4,000 4,000	63,69 69,48 42,46		
	SOMMANO m²					1′918,32		
15 B01030.b 19/02/2024	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di ta, su tutti i tipi di opere in pietra situate in ambienti esterni: vegetazione fortemente radicata: al mq di intervento Vedi allegato 4 al libretto delle misure n. 2							
	Volta 6 Volta 7 Volta 8 Volta 9	0,35 0,20 0,20 0,30	9,42 9,50 9,50 9,54	5,800 5,800		19,29 11,02 11,02 16,46		
	SOMMANO mg					57,79		
16 A05153 19/02/2024	Ricostituzione con metodo scuci-cuci del campo centrale di volte laterizie di mattoni posti a coltello, con geometria a crociera o botte lunettata, eseguito dal basso, senza l'ausilio di centine. Computato a mq di superficie trattata							
	Vedi allegato 4 al libretto delle misure n. 2 Volta 6 Volta 7 Volta 8 Volta 9	0,35 0,20 0,20 0,30	9,42 9,50 9,50 9,54	5,800		19,29 11,02 11,02 16,46		
	SOMMANO mq					57,79		
17 NP05 19/02/2024	Rinforzo di intradosso di volte di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato C.R.M. Composite Reinforced Mortar, provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Euro svuotamento e pulitura della volta). Applicazione all'intradosso della volta e con lunghezza di ancoraggio pari a 60 cm.							
	A RIPORTARE							

Num.Ord.			DIME	NSIONI		QUAN	TITA'	FIGURE
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazioni
	RIPORTO							
	Vedi allegato 4 al libretto delle misure n. 2 Volta 6 Volta 7 Volta 8 Volta 9		9,42 9,50 9,50 9,54		5,850 5,800 5,800 5,750	55,11 55,10 55,10 54,86		
	SOMMANO m2					220,17		
18 NP06 19/02/2024	Fornitura e posa di barra preformata in fibra di vetro Alcalino Resistente con fiocco su un lato di lunghezza 20 cm, modulo elastico della fibra 74 GPa, diametro della barra 10 mm, to di rete o tessuto di rinforzo già posizionato. Connettore di lunghezza 60 cm: 60 cm di inghisaggio + 20 cm di sfiocco Vedi allegato 4 al libretto delle misure n. 2 Volta 6 Volta 7 Volta 8 Volta 9		9,42 9,50 9,50 9,54		5,850 5,800 5,800 5,750	220,43 220,40 220,40 219,42		
	SOMMANO cadauno		ĺ			880,65		
19 19.03.011* .001 19/02/2024	Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato in intradossi con scalpellatura. Asportazione, come alla voce precedente, di strati corticali di conglomerato cementizio armato o dello strato asportato da effettuarsi mediante reticolo di m 1,00 di lato. Spessore medio dello strato asportato di cm 2 Vedi allegato 4 al libretto delle misure n. 2 Volta 5 Contrafforti *(larg.=(0,60+0,50+0,60)) (par.ug.=3*2)*(larg.=(0,6+0,4+0,6)/3)		10,50 4,50 4,50 4,55	9,250 1,700 0,533 0,500		43,71 22,95 14,39 6,83		
	SOMMANO m²					87,88		
20 04.04.003 19/02/2024	TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO CON PRODOTTI PASSIVANTI. Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sint Itro occorre per dare il lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate. Vedi allegato 4 al libretto delle misure n. 2 Volta 5 Contrafforti *(larg.=(0,60+0,50+0,60)) (par.ug.=3*2)*(larg.=(0,6+0,4+0,6)/3)	3,00 6,00	4,50 4,50	0,533		22,95 14,39		
		3,00	4,55	0,500		6,83		
	SOMMANO m²					44,17		
21 04.04.006* .002 19/02/2024	RIPRISTINO DI COPRI FERRO. Ripristino di copri ferro con malta pronta a base di cemento con aggregati e resine per uno spessore medio di cm 3. Applicato a spruzzo Vedi allegato 4 al libretto delle misure n. 2 Volta 5 Contrafforti *(larg.=(0,60+0,50+0,60)) (par.ug.=3*2)*(larg.=(0,6+0,4+0,6)/3)	0,45 3,00 6,00 3,00	10,50 4,50 4,50 4,55	9,250 1,700 0,533 0,500		43,71 22,95 14,39 6,83		
	A RIPORTARE					87,88		


Num.Ord.			DIME	NSIONI		QUAN	ΤΙΤΔ'	pag. 4 FIGURE
TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazioni
<i>B</i> 11 11 11	RIPORTO	par.ug.	iuiig.	mig.	11 peso	87,88	Trogativi	7 Hillouzioni
	SOMMANO m ²					87,88		
22 04.04.016* .001 19/02/2024	RASATURA CON MALTA A GRANA MEDIA. Fornitura e posa di una malta da rasatura di tipo R3, monocomponente a grana media di colore grigio o bianco per la finitura di elementi in cement a delle superfici, applicazione della malta di ricostruzione. Contabilizzato per uno spessore di 2 mm. Di colore grigio. Vedi allegato 4 al libretto delle misure n. 2 Volta 5 Contrafforti *(larg.=(0,60+0,50+0,60)) (par.ug.=3*2)*(larg.=(0,6+0,4+0,6)/3)		10,50 4,50 4,50	9,250 1,700 0,533		97,13 22,95 14,39		
	(par.ug3 2) (rang(0,0+0,4+0,0)/3)	3,00	4,55	0,500		6,83		
	SOMMANO m²					141,30		
23 NP09 19/02/2024	RICOSTRUZIONE DI SPESSORI CONSISTENTI. Ricostruzione di strutture in els mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi dov i: l'armatura metallica; le casseformi; l'eventuale aggrappante. Riferimento Elenco Prezzi Regione Marche cod: 04.04.015							
	Vedi allegato 4 al libretto delle misure n. 2 Volta n. 5 Contrafforti	3,00	4,50	1,500	0,030	0,61		
	SOMMANO m ³					0,61		
24 NP01 19/02/2024	Consolidamento di intradosso di volte mediante tecnica dell'intonaco armato CRM Composite Reinforced Mortar con applicazione di rete preformata in materiale composito fibrorinforza ioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Applicazione all'intradosso della volta per uno spessore di 5 cm.							
	Vedi allegato 4 al libretto delle misure n. 2							
	Volta 4		38,00	9,300		353,40		
	SOMMANO m2					353,40		
25 NP02 19/02/2024	Ripristino e ricostruzione corticale di parti di elementi in cemento armato (spalle, pile, travi, traversi, cordoli, ect) mediante l'applicazione di un ciclo composto da una malta tuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici, la preparazione del supporto. Per uno spessore di 2 cm							
	Volta 4 -prospetto arco monte Volta 4 -prospetto arco valle		38,00 38,00	1,000 1,000		38,00 38,00		
	SOMMANO m2		ŕ	*		76,00		
26 NP03 19/02/2024	Fornitura di resina epossidica tixotropica opportunamente addensata, da utilizzare a spatola, per l'incollaggio di rinforzi in fibra di carbonio al supporto in cls. Il prodotto vie ne dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e quant'altro non specificato. Per uno spessore finale medio di 4 mm.							
	Volta 4 - prospetto di monte Volta 4 -prospetto valle	76,00 76,00		0,010 0,010	3,140 3,140	2,39 2,39		
	SOMMANO m2					4,78		
	A DIDORTARE							
	A RIPORTARE							

Num.Ord.			DIME	NSIONI		QUANTITA'		pag. 5	
TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazioni	
	RIPORTO	1 8			1				
27 NP04 19/02/2024	Rinforzo di angoli in cemento armato, mediante tecnica dell'intonaco armato CRM Composite Reinforced Mortar con applicazione di un elemento angolare preformato in materiale composi impregnate con resina termoindurente di tipo poliestere bisfenolica, con trattamento superficiale con sabbia quarzifera. Volta 4 - prospetto monte Volta 4 - prospetto valle					38,00 38,00			
	SOMMANO m					76,00			
28 02.01.007* 19/02/2024	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and 1 pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Volta 4		38,00	9,300	0,050	17,67			
	Volta 3 Pareti laterali *(par.ug.=2*0,45) Contrafforti *(larg.=(0,60+0,50+0,60)) (par.ug.=3*2)*(larg.=(0,6+0,4+0,6)/3) Volta 5 Contrafforti *(larg.=(0,60+0,50+0,60)) (par.ug.=3*2)*(larg.=(0,6+0,4+0,6)/3)	0,45 0,90 3,00 6,00 3,00 0,45 3,00 6,00 3,00	7,07 2,15 4,50 4,50 4,55 10,50 4,50 4,50 4,55	9,000 9,000 1,700 0,533 0,500 9,250 1,700	0,020 0,020 0,150 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020	0,57 0,35 3,44 0,29 0,14 0,87 0,46 0,29 0,14			
	SOMMANO m³					24,22			
29 02.01.008* 19/02/2024	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. Volta 4 Volta 3 Pareti laterali *(par.ug.=2*0,45) Contrafforti *(larg.=(0,60+0,50+0,60)) (par.ug.=3*2)*(larg.=(0,6+0,4+0,6)/3) Volta 5 Contrafforti *(larg.=(0,60+0,50+0,60)) (par.ug.=3*2)*(larg.=(0,60+0,4+0,6)/3)		38,00 7,07 2,15 4,50 4,50 4,55 10,50 4,50 4,50 4,55	9,000 9,000 1,700 0,533 0,500 9,250 1,700	0,050 0,020 0,020 0,150 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020	17,67 0,57 0,35 3,44 0,29 0,14 0,87 0,46 0,29 0,14			
30 04.04.004* .001 19/02/2024	TRATTAMENTO SUPERFICI IN CALCESTRUZZO. Fornitura e posa in opera di emulsioni per il trattamento delle superfici in calcestruzzo d'opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al one delle superfici con getto d'acqua a pressione. Esclusa dal prezzo la					24,22			
	Politura del sottofondo. Con resine sintetiche. Volta 3	0,45	7,07	9,000		28,63			
	A RIPORTARE					28,63			


DATA DESIGNAZIONE DELIAVORI Parug lung lung lung Ripeo Positivi Negativi Negativi Parug Parug Riper Negativi Negativi Negativi Parug Parug Riper Negativi Ne	Num.Ord.			DIMENSIONI				QUANTITA'	
Parei laterals "(par.ug.=2*0.45) Contraffort (larg.=(0.60+0.50+0.60)) (par.ug.=3*2*)*(larg.=(0.60+0.50+0.60)) (par.ug.=3*2*)*(larg.=(0.60+0.50+0.60)) (par.ug.=3*2*)*(larg.=(0.60+0.50+0.60)) (par.ug.=3*2*)*(larg.=(0.60+0.50+0.60)) (par.ug.=3*2*)*(larg.=(0.60+0.50+0.60)) (par.ug.=3*2*)*(larg.=(0.60+0.50+0.60)) (par.ug.=3*2*)*(larg.=(0.60+0.50+0.60)) (par.ug.=3*2*)*(larg.=(0.60+0.60+0.60)) (par.ug.=3*2*)*(larg.=(0.60+0.60)) (par.ug.=3*		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	ed Annotazioni
Contartificat "(alage=(0.66+0.59+0.609) (par ug=-3*2)*(lage=(0.66+0.4+0.6)3) (5.00 (4.56 (5.33 14.39 3.00 4.55 0.500 6.83 14.39 3.00 4.55 0.500 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 3.00 4.55 0.500 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.00 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.00 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 (5.00 1.700 6.83 14.39 1.700 6.83 14.39 1.700		RIPORTO					28,63		
Contratificit *(larg=(0.69+0.50+0.601) 3.00 4.50 1.700 22.95 (par.ug=3*2)*(larg=(0.6+0.4+0.6)/3) 6.00 4.50 0.533 14.39 3.00 4.55 0.500 6.83 SOMMANO m² 178.10 Ancona, 13/03/2024 L'Impresa VENEZIA S.r.l. Assistente Contabile Geom. Daniele Donati 11 Direttore dei Lavori Dott. Ing. Alessia Montucchiari		Contrafforti *(larg.=(0,60+0,50+0,60))	3,00 6,00	4,50 4,50	1,700 0,533		22,95 14,39		
Ancona, 13/03/2024 L'Impresa VENEZIA S.r.l. Assistente Contabile Geom. Daniele Donati Dott. Ing. Alessia Montucchiari Dott. Ing. Alessia Montucchiari		Contrafforti *(larg.=(0,60+0,50+0,60))	3,00 6,00	4,50 4,50	1,700 0,533		22,95 14,39		
I:Impresa VENEZIA S.r.I. Assistente Contabile Geom. Daniele Donati II Direttore dei Lavori Dott. Ing. Alessia Montucchiari		SOMMANO m					178,10		
VENEZIA S.r.l. Assistente Contabile Geom. Daniele Donati Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Alessia Montucchiari		Ancona, 13/03/2024							
Geom. Daniele Donati Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Alessia Montucchiari		L'Impresa VENEZIA S.r.l.							
Dott. Ing. Alessia Montucchiari									
A RIPORTARE		A DIDODTADE							

ALLEGATO 3) AL LIBRETTO DELLE MISURE 2)

PROSPETTO DI VALLE

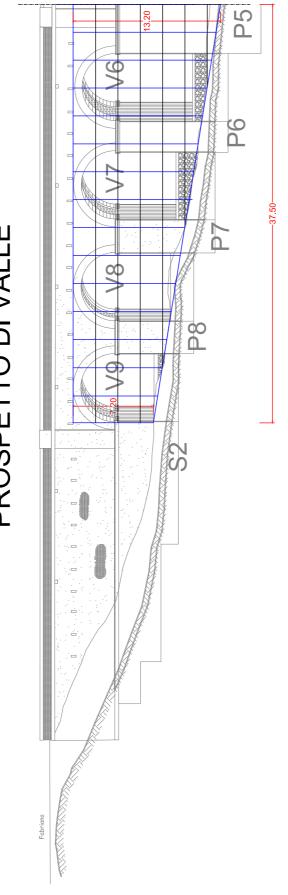

PROSPETTO DI MONTE

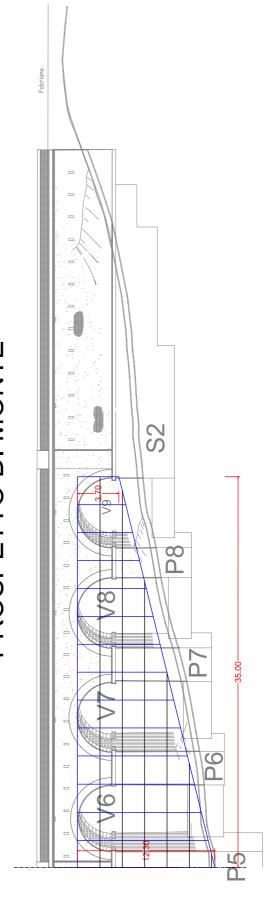

ALLEGATO 4) AL LIOBRETTO DELLE MISURE 2) PIANTA E PROSPETTI VOLTE

