



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità - Gestione e Sviuppo

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

OGGETTO: TERZA ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO (ART. 54 D.LGS. N. 50/2016) PER I LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLE SS.PP. VARIE DEI REPARTI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA - ANNO 2023. LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUT. STRADALE SULLA SP N 9 "CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO" A TRATTI TRA IL KM 51+000 ED IL KM 58+550 - S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" DAL KM 37+600 AL KM 37+990 - S.P. N. 18 "JESI - MONTERADO" TRA IL KM 25+500 ED IL KM 27+000 CIRCA - S.P. N. 19 "DELLA VAL CESANO" DAL KM 2+800 AL KM 03+500 CIRCA - SP N 15 "DI GENGA" AL KM 27+000 CIRCA. COMUNI VARI - RR.OO. DI JESI, SENIGALLIA E FABRIANO (COD. INT. 9501C).

COMMITTENTE: Provincia di Ancona

IMPRESA: IMPRESA COROMANO S.R.L.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 6 pagine

I DIRETTORI DEI LAVORI

Geom. Stefano BELARDINELLI

Geom. Matteo PALLOTTA

Geom. Maurizio TISBA

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	REPARTO OPERATIVO DI JESI (Cat 1)							
1 / 1 19.13.006 13/03/2025	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di 1° Cat. - Misurazione su autocarro. Cat 1 - REPARTO OPERATIVO DI JESI VEDI ALLEGATO 1A) - AL LIBRETTO DELLE MISURE N 1					6'888,30		
	SOMMANO 100 kg					6'888,30		
2 / 2 19.13.011.00 1 13/03/2025	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Cat 1 - REPARTO OPERATIVO DI JESI VEDI ALLEGATO 2A) - AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1							
		6,10	2,50	5,000	76,25			
		6,00	4,50	5,000	135,00			
		6,00	3,00	5,000	90,00			
		6,00	4,50	5,000	135,00			
		6,20	4,00	5,000	124,00			
		6,00	5,80	5,000	174,00			
		6,00	4,50	5,000	135,00			
		6,10	3,00	5,000	91,50			
	VEDI ALLEGATO 3A) - AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1							
		6,30	3,00	5,000	94,50			
		5,95	4,50	5,000	133,88			
	VEDI ALLEGATO 4A) - AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 (lung.=(6,90+7,30)/2)	7,10	10,00	3,000	213,00			
		16,00	2,00	2,000	64,00			
	(lung.=(3,40+3,35)/2)	3,38	52,00	3,000	527,28			
		3,25	9,00	3,000	87,75			
		172,00	2,00	2,000	688,00			
		204,00	2,00	2,000	816,00			
		6,40	17,50	3,000	336,00			
	SOMMANO m²xcm					3'921,16		
3 / 3 28.01.003.00 1 13/03/2025	Autocarro con cassone ribaltabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico ... e con massa totale a terra di 5000 kg e portata utile 2700 kg (Comprensivo delle Spese Generali e dell'Utile d'Impresa). Cat 1 - REPARTO OPERATIVO DI JESI pulizia cigli					3,00		
	SOMMANO h					3,00		
4 / 4 28.04.001.00 2 13/03/2025	Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa). Cat 1 - REPARTO OPERATIVO DI JESI pulizia cigli man.autocarro					3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Q U A N T I T A'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA (Cat 2)							
5 / 5 19.13.006 13/03/2025	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti ... ome da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro. Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA VEDI ALLEGATO 1B) - AL LIBRETTO DELLE MISURE N 1					6'601,20		
	SOMMANO 100 kg					6'601,20		
6 / 6 19.13.011.00 1 13/03/2025	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA VEDI ALLEGATO 2B) - AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1							
		18,00		1,00	2,500	45,00		
		39,00		1,70	2,500	165,75		
	(lung.=(7,10+7,10)/2)	7,10		1,00	5,000	35,50		
		7,15		1,00	5,000	35,75		
		7,10		1,00	5,000	35,50		
		7,30		1,00	5,000	36,50		
	(lung.=(3,60+3,90)/2)	3,75	19,00		5,000	356,25		
	VEDI ALLEGATO 3B) - AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1							
	(lung.=(22,30+13,65)/2)	17,98		8,50	3,000	458,49		
		420,00		2,00	2,000	1'680,00		
		38,00		2,00	2,000	152,00		
		153,00		2,00	2,000	612,00		
		6,15	13,00		3,000	239,85		
	SOMMANO m²xcm					3'852,59		
7 / 7 NP.01 13/03/2025	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SPESSORI FINO A 15 CM IN UNICA PASSATA. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediant ... superficie, segnaletica stradale e pilotaggio del traffico, nonchè quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.) Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA VEDI ALLEGATO 2B) - AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1							
	(lung.=(7,10+7,70)/2)	7,40		17,00		125,80		
	(lung.=(7,70+7,15)/2)	7,43		19,00		141,17		
	(lung.=(7,10+7,50)/2)	7,30		19,00		138,70		
	(lung.=(7,50+7,30)/2)	7,40		28,50		210,90		
	SOMMANO mq					616,57		
8 / 8 19.13.011.00 2 13/03/2025	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA VEDI ALLEGATO 2B) - AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	(lung.=(7,10+7,70)/2) (lung.=(7,70+7,15)/2)		7,40 7,43	17,00 19,00	5,000 5,000	629,00 705,85		
	(lung.=(7,10+7,50)/2) (lung.=(7,50+7,30)/2)		7,30 7,40	19,00 28,50	5,000 5,000	693,50 1'054,50		
	SOMMANO m²xcm					3'082,85		
9 / 9 19.13.004.00 1 13/03/2025	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA VEDI ALLEGATO 4B) - AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1					1'281,60		
	SOMMANO 100 kg					1'281,60		
10 / 10 28.03.012.00 1 13/03/2025	Motolivellatore con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di ... ecializzato Motolivellatore con motore Diesel 140 CV (101 KW) (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa). Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA					3,00		
	SP18					3,00		
	SOMMANO h					3,00		
11 / 11 28.03.017.00 5 13/03/2025	Rullo vibrante semovente, con trazione e vibrazione in entrambi i rulli; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni ... lo vibrante semovente con massa in assetto operativo 10000 kg (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa). Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA					3,00		
	SP18					3,00		
	SOMMANO h					3,00		
12 / 12 28.04.001.00 2 13/03/2025	Operaio specializzato (Comprensivo delle Spese Genereli e dell'Utile d'Impresa). Cat 2 - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA SP 18 man. Autocarro SP18 man. Pala					3,00 3,00		
	SOMMANO h					6,00		
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

ALLEGATO 1A) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 - COD. INT. 9501 C

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
A 0001	1220	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	315,00	EK116YL	IMPRESA COROMANO SRL	07/03/2025	0,00	0,00	0,00%	315,00
A 0002	1222	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	309,20	ER214KZ	IMPRESA COROMANO SRL	07/03/2025	0,00	0,00	0,00%	309,20
A 0003	1224	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	262,00	GT920CT	IMPRESA COROMANO SRL	07/03/2025	0,00	0,00	0,00%	262,00
A 0004	1226	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	313,40	FD514RB	IMPRESA COROMANO SRL	07/03/2025	0,00	0,00	0,00%	313,40
A 0005	1227	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	403,80	GT912CT	IMPRESA COROMANO SRL	07/03/2025	0,00	0,00	0,00%	403,80
A 0006	1228	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	253,00	FX131YK	IMPRESA COROMANO SRL	07/03/2025	0,00	0,00	0,00%	253,00
A 0007	1229	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	290,20	EK116YL	IMPRESA COROMANO SRL	07/03/2025	0,00	0,00	0,00%	290,20
A 0008	1231	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	308,20	ER214KZ	IMPRESA COROMANO SRL	07/03/2025	0,00	0,00	0,00%	308,20
A 0009	1235	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	190,80	CD281RH	IMPRESA COROMANO SRL	07/03/2025	0,00	0,00	0,00%	190,80
A 0010	1240	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	300,00	FD514RB	IMPRESA COROMANO SRL	10/03/2025	0,00	0,00	0,00%	300,00
A 0011	1241	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	319,80	EK116YL	IMPRESA COROMANO SRL	10/03/2025	0,00	0,00	0,00%	319,80
A 0012	1243	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	253,60	GT920CT	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	10/03/2025	0,00	0,00	0,00%	253,60
A 0013	1244	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	254,60	GT919CT	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	10/03/2025	0,00	0,00	0,00%	254,60
A 0014	1246	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	305,20	FM475NN	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	10/03/2025	0,00	0,00	0,00%	305,20
A 0015	1248	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	303,20	FD514RB	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	10/03/2025	0,00	0,00	0,00%	303,20
A 0016	1250	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	314,20	EK116YL	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	10/03/2025	0,00	0,00	0,00%	314,20
A 0017	1252	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	260,10	GT920CT	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	10/03/2025	0,00	0,00	0,00%	260,10
A 0018	1256	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	261,80	GT919CT	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	10/03/2025	0,00	0,00	0,00%	261,80
A 0019	1257	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	304,40	FD514RB	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	10/03/2025	0,00	0,00	0,00%	304,40
A 0020	1259	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	201,20	GT930CT	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	201,20
A 0021	1260	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	270,40	GT919CT	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	270,40
A 0022	1262	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	321,20	FD514RB	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	321,20
A 0023	1264	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	309,40	FM475NN	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	309,40
A 0024	1265	SP 09-11	RO Jesi	TAPPETO	Q.li	263,60	GT920CT	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	263,60

Sommano q.li **6888,30**

I DIRETTORI DEI LAVORI
Geom. Stefano Belardinelli
Geom. Matteo Pallotta
Geom. Maurizio Tisba

L'IMPRESA
IMPRESA COROMANO S.R.L.


ALLEGATO 2A)

- SP 3 CASSINARE

STRADURE


07/03/25

Km 51+800

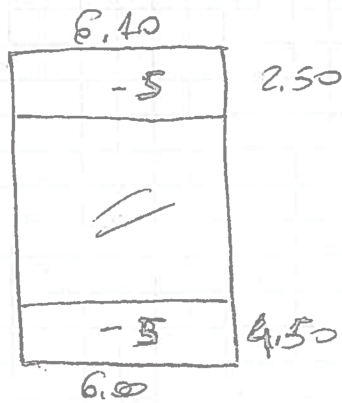


[Handwritten signature]


Km 52+050

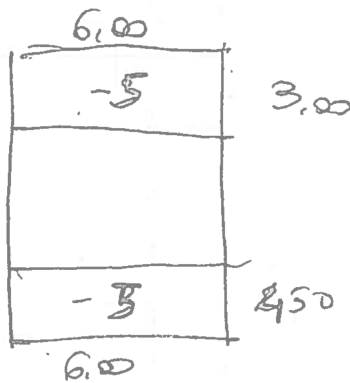

Km 53+700

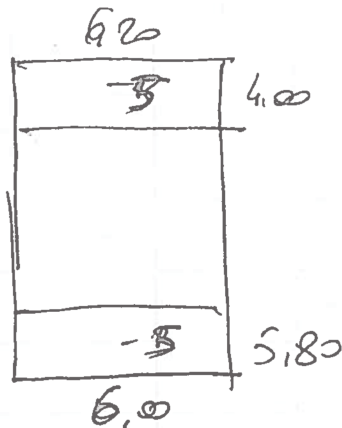


Km 54+380

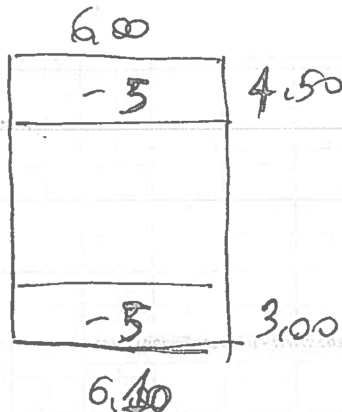

ALLEGATO 3A)

FRESATURA CN 30B AT TIM 58+6,00
SPS

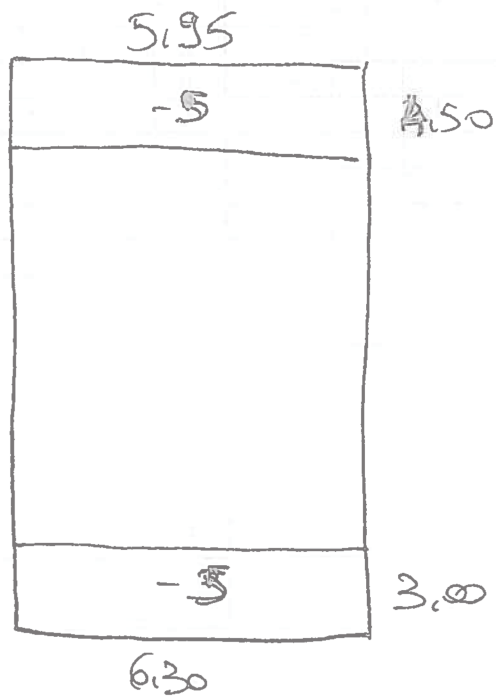

10/03/25


[Signature] *[Signature]*

Pulizie c'el:

- OPERAIO SPECIALIZ. 3h
- PALA CARICATRICE 3h.

ALEGATO (A)

FRESSATURE SERRA DE GOUTI SP11 Km 38-

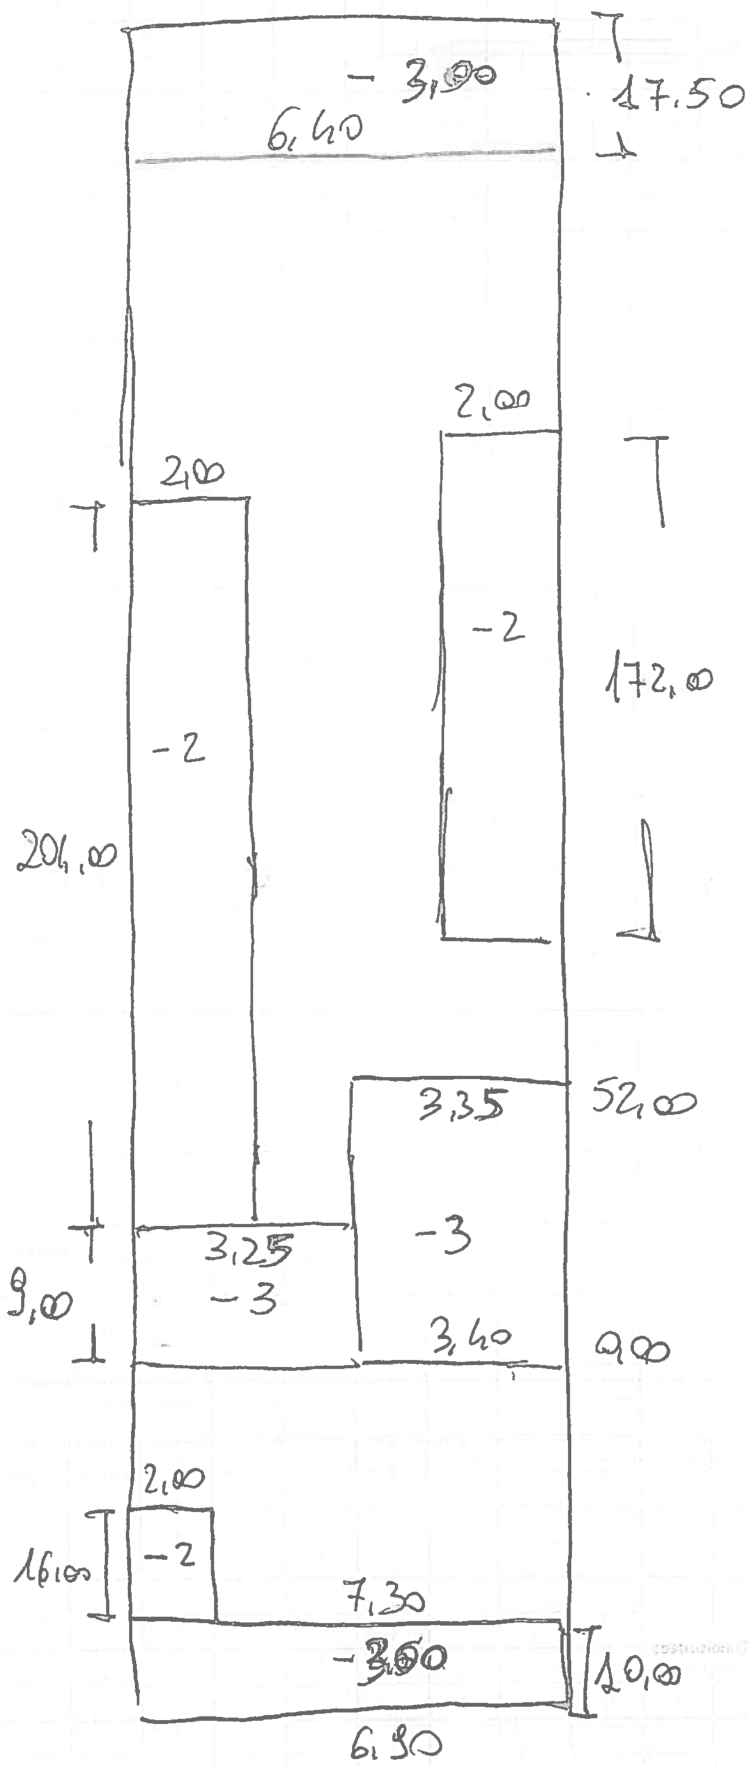

10/03/25

[Handwritten signature]

ALLEGATO 1B) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 - COD. INT. 9501 C

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
A 0029	1279	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	306,00	FM475NN	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	306,00
A 0030	1281	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	306,20	ER214KZ	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	306,20
A 0031	1284	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	301,80	FD514RB	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	301,80
A 0032	1285	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	403,80	GT912CT	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	403,80
A 0033	1286	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	311,40	GJ871LW	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	311,40
A 0034	1289	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	306,00	FM475NN	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	306,00
A 0035	1291	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	309,20	ER214KZ	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	309,20
A 0036	1293	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	305,60	FD514RB	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	305,60
A 0038	1295	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	304,20	FD514RB	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	12/03/2025	0,00	0,00	0,00%	304,20
A 0039	1296	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	404,20	GT912CT	IMPRESA COROMANO SRL	12/03/2025	0,00	0,00	0,00%	404,20
A 0040	1297	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	319,60	EK116YL	IMPRESA COROMANO SRL	12/03/2025	0,00	0,00	0,00%	319,60
A 0041	1298	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	311,80	ER214KZ	IMPRESA COROMANO SRL	12/03/2025	0,00	0,00	0,00%	311,80
A 0042	1299	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	310,20	GJ871LW	IMPRESA COROMANO SRL	12/03/2025	0,00	0,00	0,00%	310,20
A 0043	1303	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	258,60	GT918CT	IMPRESA COROMANO SRL	12/03/2025	0,00	0,00	0,00%	258,60
A 0044	1304	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	308,40	FD514RB	IMPRESA COROMANO SRL	12/03/2025	0,00	0,00	0,00%	308,40
A 0045	1305	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	312,80	EK116YL	IMPRESA COROMANO SRL	12/03/2025	0,00	0,00	0,00%	312,80
A 0046	1306	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	314,00	ER214KZ	IMPRESA COROMANO SRL	12/03/2025	0,00	0,00	0,00%	314,00
A 0047	1307	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	318,00	GJ871LW	IMPRESA COROMANO SRL	12/03/2025	0,00	0,00	0,00%	318,00
A 0048	1308	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	263,00	GT918CT	IMPRESA COROMANO SRL	12/03/2025	0,00	0,00	0,00%	263,00
A 0049	1309	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	309,00	FD514RB	IMPRESA COROMANO SRL	12/03/2025	0,00	0,00	0,00%	309,00
A 0050	1311	SP19	RO Senigallia	TAPPETO	Q.li	317,40	EK116YL	IMPRESA COROMANO SRL	12/03/2025	0,00	0,00	0,00%	317,40


Sommano **6601,20**

I DIRETTORI DEI LAVORI
Geom. Stefano Belardinelli
Geom. Matteo Pallotta
Geom. Maurizio Tisba

L'IMPRESA
IMPRESA COROMANO S.R.L.

7-11 12 13 14 15

ALLEGATO 2B)

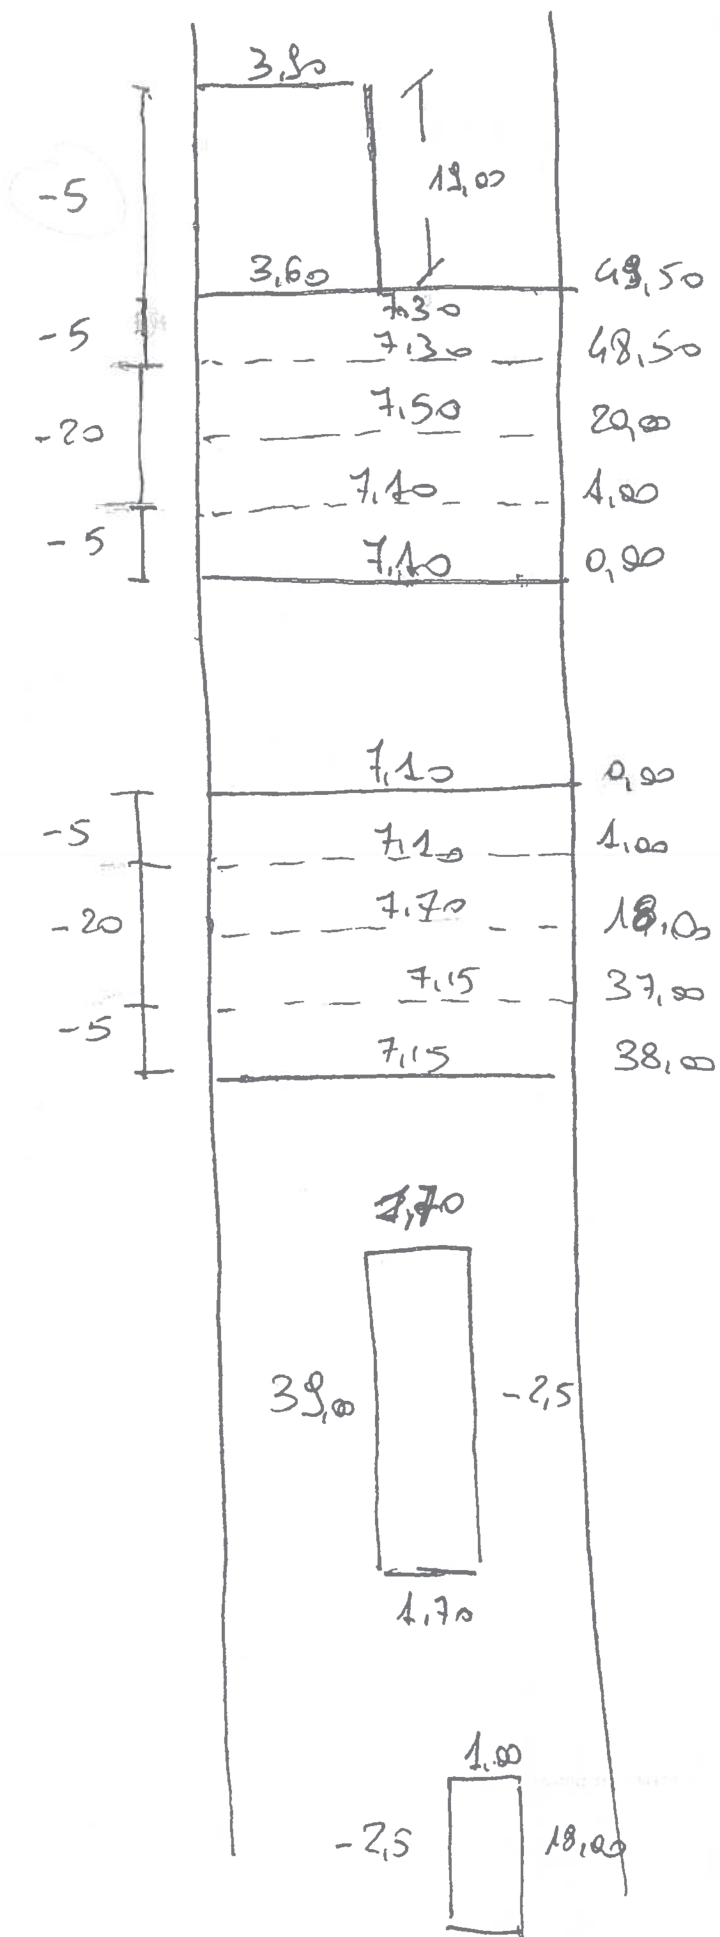


Pull 3h.
Graben 3h.



costruzioni **nasoni**

FRESATURA SP 19 CASTELONE 2 + 800

6.15

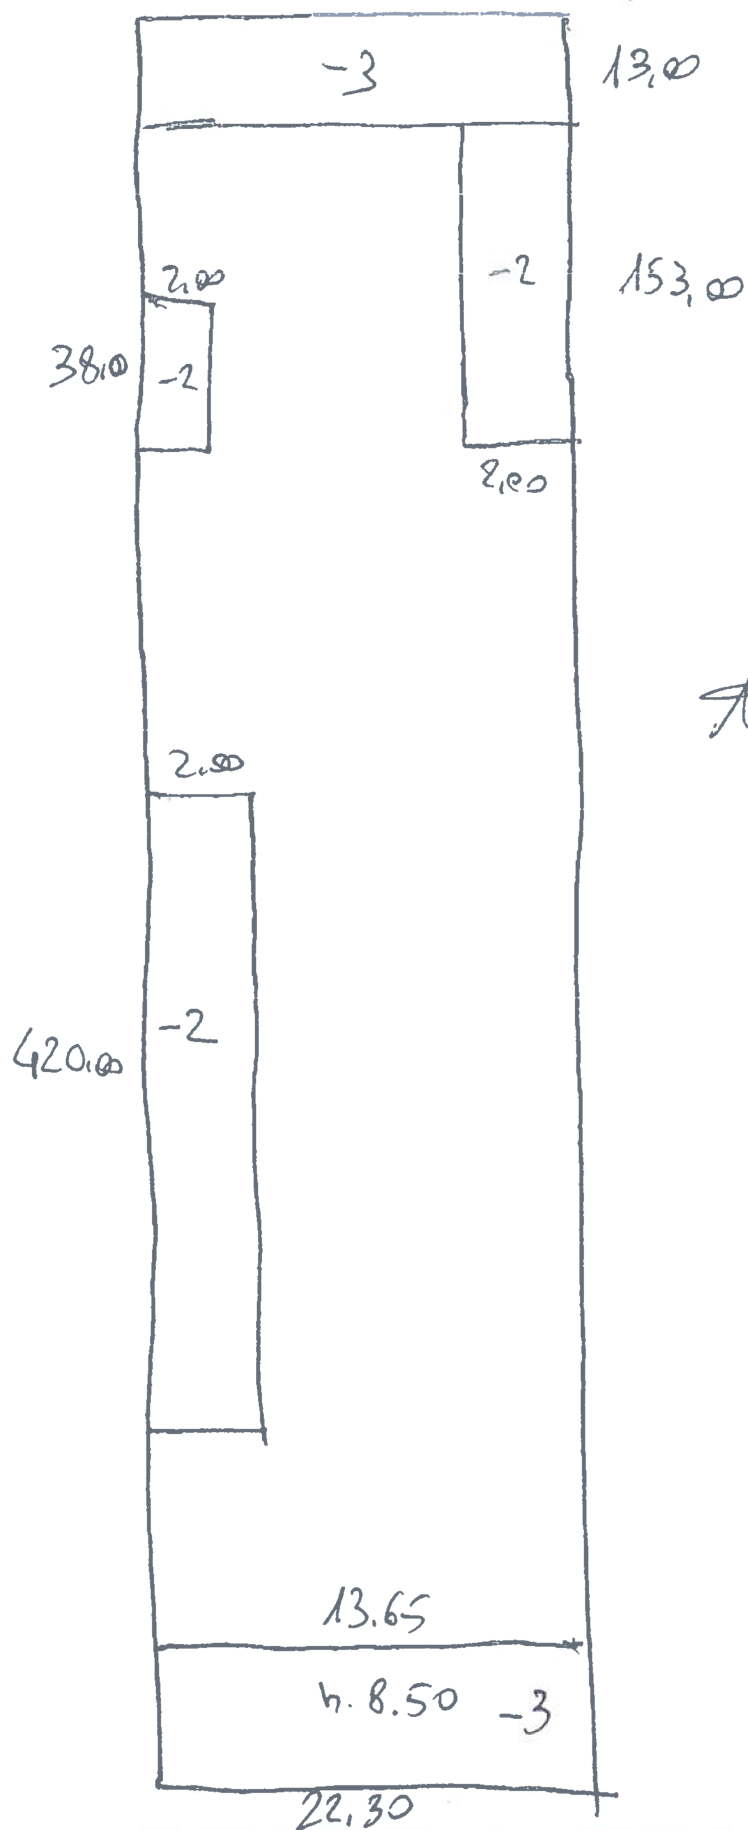

ALLEGATO 3 B)

11/03/25

[Signature]

[Signature]

ALLEGATO 4B) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 - COD. INT. 9501 C

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
A 0025	1272	SP18	RO Senigallia	BINDER	Q.li	257,20	GT920CT	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	257,20
A 0026	1270	SP18	RO Senigallia	BINDER	Q.li	196,40	GT930CT	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	196,40
A 0027	1273	SP18	RO Senigallia	BINDER	Q.li	256,20	GT919CT	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	256,20
A 0028	1280	SP18	RO Senigallia	BINDER	Q.li	263,40	GT919CT	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	263,40
A 0037	1276	SP19	RO Senigallia	BINDER	Q.li	308,40	GJ871LW	CONBIT INFRASTRUTTURE SRL	11/03/2025	0,00	0,00	0,00%	308,40

Sommano **1281,60**

I DIRETTORI DEI LAVORI
Geom. Stefano Belardinelli
Geom. Matteo Pallotta
Geom. Maurizio Tisba

L'IMPRESA
IMPRESA COROMANO S.R.L.

ALLEGATO 1C) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 - COD. INT. 9501 C

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
A 0053	1319	SP15	RO Fabriano	TAPPETO	Q.li	322,20	EK116YL	IMPRESA COROMANO SRL	13/03/2025	0,00	0,00	0,00%	322,20
A 0054	1320	SP15	RO Fabriano	TAPPETO	Q.li	315,20	FD514RB	IMPRESA COROMANO SRL	13/03/2025	0,00	0,00	0,00%	315,20
A 0055	1322	SP15	RO Fabriano	TAPPETO	Q.li	319,00	GJ871LW	IMPRESA COROMANO SRL	13/03/2025	0,00	0,00	0,00%	319,00

Sommano 956,40

I DIRETTORI DEI LAVORI
Geom. Stefano Belardinelli
Geom. Matteo Pallotta
Geom. Maurizio Tisba

L'IMPRESA
IMPRESA COROMANO S.R.L.

ALLEGATO 2C) AL LIBRETTO DELLE MISURE N. 1 - COD. INT. 9501 C

ID	DDT	Strada	Località	Materiale	Unità	Quantità	Targa	Ditta	Data	Pesata	Differenza	Decurtazione	Contabilità
A 0051	1316	SP15	RO Fabriano	BINDER	Q.li	272,60	GT920CT	IMPRESA COROMANO SRL	13/03/2025	0,00	0,00	0,00%	272,60
A 0052	1317	SP15	RO Fabriano	BINDER	Q.li	274,60	GT918CT	IMPRESA COROMANO SRL	13/03/2025	0,00	0,00	0,00%	274,60

Sommano 547,20

I DIRETTORI DEI LAVORI
Geom. Stefano Belardinelli
Geom. Matteo Pallotta
Geom. Maurizio Tisba

L'IMPRESA
IMPRESA COROMANO S.R.L.

FRESATURE GENGA

ALLEGATO 3C)

