



Provincia
di Ancona

SETTORE III

AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE.
SUPPORTO AREA VIABILITA'-GESTIONE E SVILUPPO

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE TRA SP. N.2 "SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE "VIA DELLA SBROZZOLA" -COMUNE DI CAMERANO (BAN 264L)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

IMPRESA: EDILBENINCASA S.R.L. con sede legale in Corigliano Rossano (CS)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 6 pagine

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 19.18.030 22/12/2023	Rimozione di recinzioni metalliche. Rimozione di vecchie ... aglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. Rimozione rete lungo SP 2 - lato A14		120,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00		
2 19.03.006* 22/12/2023	Demolizione integrale di strutture in c.a. Demolizione in ... rata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura. Muretto esistente presso Ponte A14 Elevazione		8,00	0,300	0,900	2,16		
	SOMMANO m³					2,16		
3 19.01.002* 22/12/2023	Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vedi allegato 1 Bonifica per Nuova Via Sbrozzola	2017,00			0,800	1'613,60		
	SOMMANO m³					1'613,60		
4 19.02.004* 22/12/2023	Preparazione piano di posa scarpate per ammorsamento nuov ... erficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato. Scarpata ammorsamento nuova Via Sbrozzola *(par.ug.=27+ 22,70+14,90+23+95,8+139,8+247,5)	570,70				570,70		
	SOMMANO m²					570,70		
5 19.02.005* .002 22/12/2023	Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Co ... : Su terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 Vedi allegato					2'017,00		
	SOMMANO m²					2'017,00		
6 19.14.034.00 1 22/12/2023	Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione anti ... azione longitudinale e trasversale non inferiore a 40 KN/m Vedi allegato Bonifica Lato A14 Bonifica Lato A14 - Risvolti	2,00	2017,00 370,00		0,300	4'034,00 111,00		
	SOMMANO m²					4'145,00		
7 19.02.009* 22/12/2023	Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Forn ... o secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Vedi allegato Bonifica Lato A14		2017,00		0,300	605,10		
	SOMMANO m³					605,10		
8 19.02.007.00 2 22/12/2023	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... il volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale PER REALIZZAZIONE RILEVATO					3'300,00		
	Parziale m³					3'300,00		
	PARTITA IN CONTO PROVVISORIO Vedi allegato Nuova Via Sbrozzola Da Sez. 1 a Sez. 2 *(larg.=(0,00+12,00)/2) Da Sez. 2 a Sez. 3 *(larg.=(12,00+29,50)/2) Da Sez. 3 a Sez. 4 *(larg.=(29,50+41,50)/2)	0,15 0,15 0,15	9,00 9,00 11,50	6,000 20,750 35,500		8,10 28,01 61,24		
	A RIPORTARE					3'397,35		

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					3'397,35		
	Da Sez. 4 a Sez. 5 *(larg.=(41,50+60,60)/2)	0,15	11,50	51,050		88,06		
	Da Sez. 5 a Sez. 6 *(larg.=(60,60+54,40)/2)	0,15	11,50	57,500		99,19		
	Da Sez. 6 a Sez. 7 *(larg.=(54,40+42,20)/2)	0,15	11,50	48,300		83,32		
	Da Sez. 7 a Sez. 8 *(larg.=(42,20+34,90)/2)	0,15	11,50	38,550		66,50		
	Da Sez. 8 a Sez. 9 *(larg.=(34,90+34,20)/2)	0,15	8,50	34,550		44,05		
	S.P. n.2 Lato Autostrada							
	Da Sez. A a Sez. B *(larg.=(0,00+1,50)/2)	0,15	11,40	0,750		1,28		
	Da Sez. B a Sez. C *(larg.=(1,50+3,10)/2)	0,15	10,40	2,300		3,59		
	Da Sez. C a Sez. F *(larg.=(3,10+12,50)/2)	0,15	12,30	7,800		14,39		
	Da Sez. F a Sez. E *(larg.=(12,50+17,20)/2)	0,15	17,50	14,850		38,98		
	Da Sez. E a Sez. D *(larg.=(17,20+17,80)/2)	0,15	14,50	17,500		38,06		
	Da Sez. D a Sez. H *(larg.=(17,80+5,30)/2)	0,15	14,70	11,550		25,47		
	Da Sez. H a Sez. I *(larg.=(5,30+2,00)/2)	0,15	9,40	3,650		5,15		
	Da Sez. I a Sez. L *(larg.=(2,00+0,00)/2)	0,15	11,00	1,000		1,65		
	Parziale m³					607,04		
	SOMMANO m³					3'907,04		
9 19.13.001* .002 22/12/2023	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70 ALLEGATO 5 PARTITA IN CONTO PROVVISORIO Lato A14	1500,00			0,150	225,00		
	SOMMANO m³					225,00		
10 17.01.003* .001 22/12/2023	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Per Alloggiamento pozzetti e tubo Ø630 di attraversamento		26,00	1,200	1,200	37,44		
	SOMMANO m³					37,44		
11 18.09.003* .007 22/12/2023	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 120x120x100 Pozzetti Attraversamento Condotta ø630					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
12 18.09.007* .003 22/12/2023	Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestr ... ino in ghisa a passo d'uomo. Dimensioni esterne cm 120x120 Lastra 130x130 Pozzetti Attraversamento Condotta ø630					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
13 18.09.010* 22/12/2023	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pozzetti Attraversamento Condotta ø630	2,00			65,000	130,00		
	SOMMANO kg					130,00		
14 18.04.003* .001 22/12/2023	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico Per allettamento nuova condotta ø630 (sotto strada) <i>A detrarre mezza condotta *(larg.=-0,315*0,315/2*3,14)</i>		24,00	1,200	0,400	11,52	3,74	
	Sommano positivi e negativi m³					11,52	3,74	
	SOMMANO m³					7,78		
15	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
18.07.007* .009 22/12/2023	committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 630 Attraversamento SOMMANO m		24,00			24,00		
						24,00		
16 18.04.005* .003 22/12/2023	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato cost ... lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,80 A protezione nuova condotta ø630 (sotto strada) A detrarre mezza condotta *(larg.=-0,315*0,315/2*3,14) Sommano positivi e negativi m³ SOMMANO m³		24,00 24,00	1,200 -0,156	0,800	23,04		3,74 3,74
						23,04		3,74
						19,30		
17 NP01_03.04. 002* 22/12/2023	Barre in acciaio tipo B450C. Solo fornitura. Armatura Platea e pareti di Fondazione SOMMANO kg					2'300,00		
						2'300,00		
18 17.01.003* .001 22/12/2023	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Scavi nuove condotte sottoservizi ENEL Linea Interrata (Scarpata Lato Camerano) VIVA SERVIZI - Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano) SOMMANO m³		60,00 60,00	0,600 0,800	1,500 1,500	54,00 72,00		
						126,00		
19 18.04.003* .001 22/12/2023	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la ... Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico Allettamento Camicie nuove condotte sottoservizi ENEL Linea Interrata (Scarpata Lato Camerano) VIVA SERVIZI - Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano) SOMMANO m³		60,00 60,00	0,600 0,800	0,400 0,500	14,40 24,00		
						38,40		
20 18.07.017* .001 22/12/2023	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato i ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm Camicie nuove condotte sottoservizi ENEL Linea Interrata (Scarpata Lato Camerano) SOMMANO m		60,00			60,00		
						60,00		
21 18.04.001* 22/12/2023	Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a man ... ll'assessamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico. Riempimento Scavi nuove condotte sottoservizi ENEL Linea Interrata (Scarpata Lato Camerano) VIVA SERVIZI - Rete Fognaria (Scarpata Lato Camerano) SOMMANO m³		60,00 60,00	0,600 0,800	1,100 1,000	39,60 48,00		
						87,60		
22 18.09.003* .005 22/12/2023	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 ENEL Linea Interrata (Scarpata Lato Camerano) SOMMANO cad					2,00		
						2,00		
23 18.09.004* .005 22/12/2023	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 ENEL Linea Interrata (Scarpata Lato Camerano) SOMMANO cad					2,00		
						2,00		
	A R I P O R T A R E							



DISPOSITIVO DI CHIUSURA

BRIO PKSC D400 NF

GAMMA BRIO

Classe D400
EN124-2 : 2015
Ghisa sferoidale
EN GJS 500-7
ISO 1083 / EN1563

CARATTERISTICHE :

- **Materiale:**
 - ☞ Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- **Forza di controllo :**
 - ☞ 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- **Rivestimento :**
 - Pittura nera idrosolubile.
- **Certificazione Prodotto :**
 - Marchio NF-VOIRIE
 - Questo marchio certifica la conformità del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (☞) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION,
 - 11, rue Francis de Pressensé
 - F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICOLARITÀ :

- **Massa(e) :**
 - Del coperchio : 31.22 Kg
 - Totale del dispositivo : 65.42 kg.
- **Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore:**
 - ☞ Guarnizione elastica in polietilene agganciata al telaio.
- **Pressione di appoggio del telaio :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Aspetto superficiale :**
 - Coperchio a rilievi anti-sdrucchiolo di tipo "4L" omologato.
- **Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio:**
 - ☞ Assicurata per serratura (maniglia).
- Tipo telaio :**
 - Telaio monoblocco di fusione.
- Tipo coperchio :**
 - Autocentrante nel telaio per mezzo di 5 guide.
 - C : diametro esterno : 650 mm.
- **Articolazione:**
 - Blocco antiritorno a 90° contro la chiusura accidentale, (1) identificato dal marchio "S"
 - ☞ Angolo di apertura $\approx 120^\circ$.

OPZIONE(I) :

Marche : Per altre marche di personalizzazione consultateci.



OPERE CIVILI :

Telaio che forma una armatura del calcestruzzo di installazione.

Telaio munito di fori $\varnothing 20 \text{ mm}$ per bloccaggio con zanche, sulla circonferenza $\varnothing 740 \text{ mm}$, se necessario.

MANOVRA :

Il coperchio è estraibile in posizione aperto a 90°.

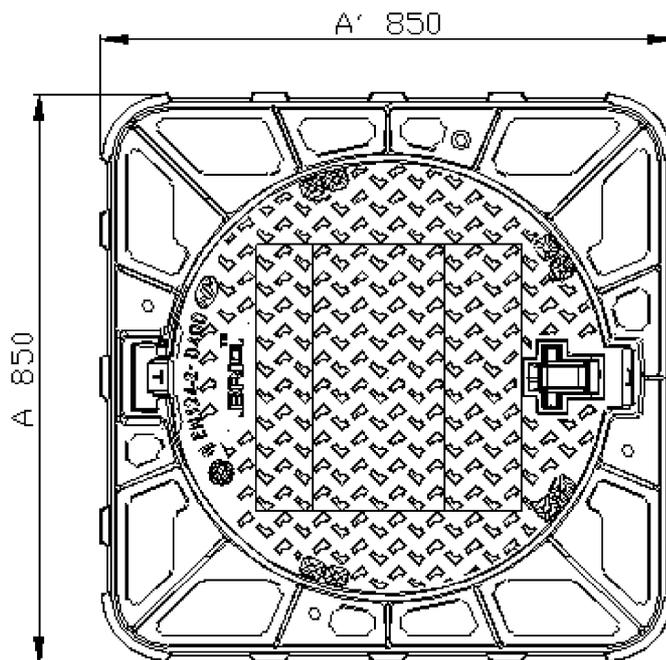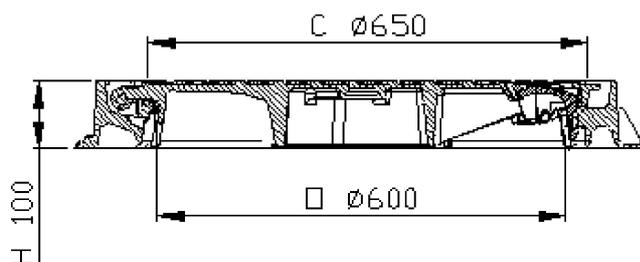

(☞) Caratteristiche certificate

- I pesi (kg.) indicati derivano dai valori medi rilevati durante la produzione di ciascun componente sperato del prodotto, con l'applicazione di una tolleranza del 10%.

- Dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo

- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso / Diffusione non controllata

CONFIDENZIALE

Proprietà della EJ EMEA

Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Sistema di Qualità ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Scheda :

FT_514824

Data rev. : 08.02.2018

Edita il: 30.03.2018

NICOLETTI MAURO s.r.l.

Via Emilia, 1287 - Tel. 0541.621793 - Fax 0541.689532
 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
 Partita IVA 03523450405 - Codice Fiscale e Registro Imprese RN 03523450405
 C.C.I.A.A. - R.E.A. RN n. 296504 - Capitale Sociale € 35.000,00 i.v.
 e-mail: nicolettimaurosrl@gmail.com



CENTRO DI TRASFORMAZIONE
 N. 665/10 D.M. 17/01/2018
 SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO
 N. 2076 - UNI EN ISO 9001:2015

SPETT.LE

ECOCOSTRUZIONI SRL

STRADA PROVINCIALE STAFFOLO JESI 1/3

60030 MONTE ROBERTO

AN

FORNITURA ACCIAIO LAVORATO E POSA IN OPERA

TIPO DOCUMENTO FATT. DIFFERITA	COD.CLIEN 1001	PARTITA IVA 02598590426	NUMERO DOCUMENTO 739	DATA DOCUMENTO 31/10/2023	PAG. 1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 41 RI.BA. 60/90 +15 GG DP.		BANCA D'APPOGGIO BPER BANCA S.P.A. FILIALE DI MAIOLATI SPONT			
TELEFONO Cod. SDI: M5UXCR1	CODICE FISCALE 02598590426	VALUTA Euro	ABI 5387	CAB 37390	

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO NETTO	IVA
001	D.d.T. N. 1895 Data Tra:26/10/23 VIA DELLA SBROZZOLA, COMUNE DI CAMERANO SP N. 2 LOCALITÀ SIROLO SENIGALLIA (AN) CIG: 9502965EC9 CUP: H71B20000560002 VOSTRO ORDINE MAIL DEL 17/10/2023					
010	ACCIAIO SOLO LAVORATO	T	2,300			22
	TRASPORTO	N	1,000			22
----- Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72. Originale disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia Entrate.						

IMPONIBILE	ALIVA	IMPORTO IVA	TOTALE MERCE	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	NETTO MERCE
			BOLLI	SPESE INCASSO	VARIE	ACCONTO
			TOTALE A PAGARE		TOTALE FATTURA	
			EUR		EUR	

--	--	--	--	--	--	--
