



Provincia  
di Ancona

## SETTORE III

AREA CONTROLLO PONTI E INFRASTRUTTURE, CATASTO STRADE.  
SUPPORTO AREA VIABILITA'-GESTIONE E SVILUPPO

pag. 7

# LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE TRA SP. N.2 "SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 8+390 E LA STRADA COMUNALE "VIA DELLA SBROZZOLA" -COMUNE DI CAMERANO (BAN 264L)

**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

**IMPRESA:** EDILBENINCASA S.R.L. con sede legale in Corigliano Rossano (CS)

**Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 12 pagine**

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>Scavi, Demolizioni, Struttura Stradale (Cat 1)</b>							
31 19.14.083.00 3 04/06/2024	<b>Rimozione di barriere metalliche. Rimozione di barriera m ... , corrimano e bulloni. Su terra per materiale utilizzabile</b> Vedi allegato 1 Su via della Sbrozzola *(lung.=115,00+120,00)		235,00			235,00		
	SOMMANO m					235,00		
32 19.03.001 04/06/2024	<b>Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. T ... lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.</b> Vedi allegato 1 Attacco con cementato lato via Sbrozzola *(lung.=37,00+34,00)		71,00			71,00		
	SOMMANO m					71,00		
33 19.03.005* .001 04/06/2024	<b>Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastrutt ... elazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali</b> Vedi allegato 1 Aiuola centrale Attacco con cementato lato via Sbrozzola		230,00 37,00 34,00	0,300 0,300	0,500 0,800 0,800	115,00 8,88 8,16		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					132,04		
34 19.01.002* 04/06/2024	<b>Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sban ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</b> Vedi allegato 2 Sbancamento lato Camerano Da Sez. 1 a Sez. 2 *(larg.=(0,00+9,62)/2) Da Sez. 2 a Sez. 3 *(larg.=(9,62+20,17)/2) Da Sez. 3 a Sez. 4 *(larg.=(20,17+41,04)/2) Da Sez. 4 a Sez. 5 *(larg.=(41,04+44,77)/2) Da Sez. 5 a Sez. 6 *(larg.=(44,77+41,61)/2) Da Sez. 6 a Sez. 7 *(larg.=(41,61+43,75)/2) Da Sez. 7 a Sez. 8 *(larg.=(43,75+13,90)/2) Da Sez. 8 a Sez. 9 *(larg.=(13,90+3,58)/2) Da Sez. 9 a Sez. 10 *(larg.=(3,58+0,00)/2)		10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	4,810 14,895 30,605 42,905 43,190 42,680 28,825 8,740 1,790		48,10 148,95 306,05 429,05 431,90 426,80 288,25 87,40 17,90		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2'184,40		
35 02.06.001.00 2 04/06/2024	<b>ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi ch ... recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi.</b> Terreno di scavo Croste di asfalto					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
36 19.02.005* .002 04/06/2024	<b>Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Co ... : Su terreni appartenenti ai gruppi A.4, A.2-6, A.2-7, A.5</b> Vedi allegato 2					726,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					726,00		
37 19.14.034.00 1 04/06/2024	<b>Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione anti ... azione longitudinale e trasversale non inferiore a 40 KN/m</b> Vedi allegato 2 Bonifica lato Camerano *(par.ug.=2*726) Risvolti lato Camerano	1452,00 89,00			0,300	1'452,00 26,70		
	A R I P O R T A R E					1'478,70		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1'478,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'478,70		
38 19.02.009* 04/06/2024	<b>Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Forn ... o secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Vedi allegato 2</b>	726,00			0,300	217,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					217,80		
39 19.02.007.00 2 04/06/2024	<b>Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... il volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale</b> <b>DETRAE LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 1° SAL</b> <b>Progr. n. 8</b> <b>Vedi allegato 3</b> Nuova Via Sbrozzola Da Sez. 13 a Sez. 12 *(larg.=(0,00+7,45)/2) Da Sez. 12 a Sez. 11 *(larg.=(7,45+8,62)/2) Da Sez. 11 a Sez. 10 *(larg.=(8,62+23,44)/2) Da Sez. 10 a Sez. 9 *(larg.=(23,44+36,21)/2) Da Sez. 9 a Sez. 8 *(larg.=(36,21+56,06)/2) Da Sez. 8 a Sez. 7 *(larg.=(56,06+58,11)/2) Da Sez. 7 a Sez. 6 *(larg.=(58,11+48,32)/2) Da Sez. 6 a Sez. 5 *(larg.=(48,32+40,06)/2) Da Sez. 5 a Sez. 4 *(larg.=(40,06+39,83)/2) Da Sez. 4 a Sez. 3 *(larg.=(39,83+47,40)/2) Da Sez. 3 a Sez. 2 *(larg.=(47,40+16,90)/2)						3'907,04	
	Sommano positivi e negativi m <sup>3</sup>					3'709,96	3'907,04	
	<b>SI DETRAGGONO m<sup>3</sup></b>						197,08	
40 19.13.001* .002 04/06/2024	<b>Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70</b> <b>DETRAE LA PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 1° Sal</b> <b>Progr. n.9</b> Lato A14 <b>Vedi allegato 4</b> <b>In detrazione Attacco con cementato *(larg.=1,00-0,30)</b> <b>(larg.=1,00-0,30)</b> Lato Camerano <b>Vedi allegato 2</b> <b>In detrazione attacco con cementato</b>	1166,00			0,250	291,50		225,00
			37,00	0,700	0,250		6,48	
			34,00	0,700	0,250		5,95	
		726,00			0,250	181,50		
			30,00	0,700	0,250		5,25	
			20,00	0,700	0,250		3,50	
	Sommano positivi e negativi m <sup>3</sup>					473,00	246,18	
	SOMMANO m <sup>3</sup>					226,82		
41 19.13.001* .001 04/06/2024	<b>Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25</b> Lato A14 <b>Vedi allegato 4</b> <b>In detrazione Attacco con cementato *(larg.=1,00-0,3)</b> <b>(larg.=1,00-0,3)</b> <b>In detrazione aiuola</b> Lato Camerano <b>Vedi allegato 2</b> <b>In detrazione attacco con cementato</b>	1166,00			0,150	174,90		
			37,00	0,700	0,150		3,89	
			34,00	0,700	0,150		3,57	
		-15,00			0,150		2,25	
		726,00			0,150	108,90		
			30,00	0,700	0,150		3,15	
			20,00	0,700	0,150		2,10	
	Sommano positivi e negativi m <sup>3</sup>					283,80	14,96	
	SOMMANO m <sup>3</sup>					268,84		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
42 19.13.002 04/06/2024	<b>Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondaz ... modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.</b> Attacco con cementato lato via Sbrozzola		37,00	1,000	0,400	14,80		
			34,00	1,000	0,400	13,60		
	Attacco lato Camerano		30,00	0,700	0,400	8,40		
			20,00	0,700	0,400	5,60		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					42,40		
43 17.01.003* .001 04/06/2024	<b>Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.</b> <b>Vedi allegato 3</b> Fosso lato A14 sud *(lung.=39,00+13,00+50,00)*(larg.=(0,40+ 1,20)/2)		102,00	0,800	0,500	40,80		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					40,80		
	<b>Regimazione acque meteoriche (Cat 4)</b>							
44 17.01.003* .001 04/06/2024	<b>Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.</b> Scavo per vasca di accumulo		10,00	7,000	2,500	175,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					175,00		
45 03.03.001* .004 04/06/2024	<b>Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicata nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa</b> Magrone vasca di accumulo		10,00	7,000	0,100	7,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					7,00		
46 03.03.020* .001 04/06/2024	<b>Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.</b> Fondazione *(lung.=4,80+7,80) Elevazione esterna *(lung.=7,10+4,10) Elevazione interna *(lung.=6,50+3,50)	2,00	12,60		0,400	10,08		
		2,00	11,20		2,000	44,80		
		2,00	10,00		2,000	40,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					94,88		
47 03.03.003* .002 04/06/2024	<b>Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicata nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa</b> Fondazione Elevazione *(lung.=4,10+6,50)		4,80	7,800	0,400	14,98		
		2,00	10,60	0,300	2,000	12,72		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					27,70		
48 NP01_03.04. 002* 04/06/2024	<b>Barre in acciaio tipo B450C. Solo fornitura.</b> <b>Si detrae la quantita' 1° Sal per la sola fornitura</b>  <b>SI DETRAGGONO kg</b>						2'300,00	
							2'300,00	
49 03.04.002* 04/06/2024	<b>Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</b> Vasca di accumulo PLATEA Cordoli lato corto Longitudinali 6Ø14 *(lung.=(4,72+0,20+0,20)*6) (lung.=(4,72+0,14+0,14)*6) st. Ø8/20 *(lung.=3,40/0,20)*(larg.=2*(0,65+0,35+0,10)) Cordoli lato lungo	3,00	30,72		1,208	111,33		
		3,00	30,00		1,208	108,72		
			17,00	2,200	0,395	14,77		
	A R I P O R T A R E					234,82		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					234,82		
	Longitudinali 6Ø14 *(lung.=(7,72+0,20+0,20)*6)	2,00	48,72		1,208	117,71		
	(lung.=(7,72+0,14+0,14)*6)	2,00	48,00		1,208	115,97		
	st. Ø8/20 *(lung.=7,80/0,2)*(larg.=2*(0,65+0,35+0,10))		39,00	2,200	0,395	33,89		
	Armatura platea							
	7.80/0.25=32 *(larg.=(4,72+0,20+0,20))		32,00	5,120	1,208	197,92		
	7.80/0.25=32 *(larg.=4,72+0,14+0,14)		32,00	5,000	1,208	193,28		
	4.80/0.25=20 *(larg.=7,72+0,20+0,20)		20,00	8,120	1,208	196,18		
	4.80/0.25=20 *(larg.=7,72+0,14+0,14)		20,00	8,000	1,208	193,28		
	PARETI							
	Ferri longitudinali							
	Pareti lato corto							
	1+1 Ø12/25 4.10/0.25=17 *(larg.=(0,10+1,10+1,95+0,15)*2)	2,00	17,00	6,600	0,888	199,27		
	Ripartitori 1+1 Ø8/15 2.00/0.20=14 *(larg.=4,05*2)	2,00	14,00	8,100	0,395	89,59		
	Pareti lato lungo							
	1+1 Ø12/25 7.10/0.25=29 *(larg.=(0,1+1,1+1,95+0,15)*2)	2,00	29,00	6,600	0,888	339,93		
	Ripartitori 1+1 Ø8/15 2.00/0.20=14 *(larg.=7,05*2)	2,00	14,00	14,100	0,395	155,95		
	Ganci 9Ø8/m² sulle 4 pareti							
	Pareti lato corto *(par.ug.=9*(3,40*1,70))*(lung.=0,075+0,25+0,075)	52,02	0,40		0,395	8,22		
	Pareti lato lungo *(par.ug.=9*(6,50*1,50))*(lung.=0,075+0,25+0,075)	87,75	0,40		0,395	13,86		
	Cordolo superiore							
	Pareti lato corto							
	4 Ø14 *(lung.=4,05*4)	2,00	16,20		1,208	39,14		
	st. Ø8/20 4.10/0.20=21 *(par.ug.=2*21)*(lung.=4*0,25+0,10+0,10)	42,00	1,20		0,395	19,91		
	Pareti lato lungo							
	4 Ø14 *(lung.=7,05*4)	2,00	28,20		1,208	68,13		
	st. Ø8/20 7.10/0.20=36 *(par.ug.=2*36)*(lung.=4*0,30+0,10+0,10)	72,00	1,40		0,395	39,82		
	Armature d'angolo di tutte le 4 pareti *(lung.=1,65/0,15)*(larg.=(0,80+0,80+0,22)*2)	4,00	11,00	3,640	0,395	63,26		
	SOMMANO kg					2'320,13		
50	<b>Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra ... unzionante e quanto altro occorre per dare l'opera finita.</b>							
18.05.015*	Fondazione vasca *(lung.=7,80+4,10)	2,00	11,90	0,350		8,33		
04/06/2024	Pareti esterne vasca *(lung.=7,10+4,10)	2,00	11,20		2,000	44,80		
	SOMMANO m²					53,13		
51	<b>Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ... ature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B.</b>							
11.01.001.00	Sostegno griglia copertura vasca HEA 140	8,00	3,80		24,700	750,88		
2	HEA 140 su ingresso e uscita fosso	2,00	1,60		16,700	53,44		
04/06/2024	L 55x4 sulle pareti	2,00	3,50		3,400	23,80		
	SOMMANO kg					828,12		
52	<b>Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in f ... are il lavoro finito. Per immersione di strutture pesanti.</b>							
11.02.011.00	Sostegno griglia copertura vasca HEA 140	8,00	3,80		24,700	750,88		
1	HEA 140 su ingresso e uscita fosso	2,00	1,60		16,700	53,44		
04/06/2024	L 55x4 sulle pareti	2,00	3,50		3,400	23,80		
	SOMMANO kg					828,12		
53	<b>Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a man ... ll'assstamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico.</b>							
18.04.001*	Scavo per vasca di accumulo		10,00	7,000	2,000	140,00		
04/06/2024	In detrazione magrone		10,00	7,000	0,100		7,00	
	In detrazione platea		7,80	4,800	0,400		14,98	
	In detrazione vasca		7,10	4,100	1,500		43,67	
	A RIPORTARE					74,35		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par,ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					74,35		
	Sommano positivi e negativi m³					140,00	65,65	
	SOMMANO m³					74,35		
54 17.01.003* .001 04/06/2024	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo ... re il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Per tubi di scarico fondo vasca		39,00	1,000	1,200	46,80		
	SOMMANO m³					46,80		
55 NP02 04/06/2024	Solo fornitura della tubazione in PVC SN4. Diametro esterno mm 200 Si detrae la quantita' 1° Sal per la sola fornitura						150,00	
	SI DETRAGGONO m						150,00	
56 18.07.009* .004 04/06/2024	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 Scarico di fondo Vasca	3,00	39,00			117,00		
	SOMMANO m					117,00		
57 18.04.001* 04/06/2024	Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano ... ll'assettamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico. Per tubi di scarico fondo vasca In detrazione tubazioni *(larg.=0,1*0,1*3,14)	-3,00	39,00 39,00	1,000 0,031	1,200	46,80	3,63	
	Sommano positivi e negativi m³					46,80	3,63	
	SOMMANO m³					43,17		
58 19.14.061 04/06/2024	Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici di cm ... reno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. Sulla scarpata della Nuova Via Sbrozzola - Lato Sirolo (Parte Alta Scarpata) *(lung.=13,50+11,60+11,90+10,80) Sulla scarpata della Nuova Via Sbrozzola - Lato Sirolo (Parte Bassa Scarpata)		47,80 7,90			47,80 7,90		
	SOMMANO m					55,70		
59 19.18.028 04/06/2024	Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastifica ... onché per la fornitura e posa in opera dei fili tenditori. Recinzione per vasca *(lung.=2(4,00+7,00))		22,00			22,00		
	SOMMANO m²					22,00		
	<b>Risoluzione interferenze (Cat 5)</b>							
60 19.13.011.00 1 04/06/2024	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Vedi allegato 5 Linea Acqua e gas							
	Dal punto 1 al punto 3		10,00	1,400	7,000	98,00		
	Dal punto 22 al punto 3		25,00	1,300	7,000	227,50		
	Dal punto 3 al punto 8		54,50	1,300	7,000	495,95		
	Dal punto 8 al punto 9 (parte)		2,50	1,300	7,000	22,75		
	Dal punto 4 al punto 5 (stacco)		11,50	0,800	7,000	64,40		
	Dal punto 6 al punto 7 (stacco)		4,80	0,800	7,000	26,88		
	Dal punto 10 al punto 11 (parte)		2,50	2,000	7,000	35,00		
	Dal punto 11 al punto 12		31,65	1,200	7,000	265,86		
	Dal punto 12 al punto 14		10,10	2,000	7,000	141,40		
	A RIPORTARE					1'377,74		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					1'377,74		
	SOMMANO m²xcm					1'377,74		
61 19.13.011.00 2 04/06/2024	<b>Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. F ... necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più Vedi allegato 5</b> <b>Linea Acqua e gas</b> Dal punto 1 al punto 3 Dal punto 22 al punto 3 Dal punto 3 al punto 8 Dal punto 8 al punto 9 (parte) Dal punto 4 al punto 5 (stacco) Dal punto 6 al punto 7 (stacco) Dal punto 10 al punto 11 (parte) Dal punto 11 al punto 12 Dal punto 12 al punto 14		10,00 25,00 54,50 2,50 11,50 4,80 2,50 31,65 10,10	1,400 1,300 1,300 1,300 0,800 0,800 2,000 1,200 2,000	20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000	280,00 650,00 1'417,00 65,00 184,00 76,80 100,00 759,60 404,00		
	SOMMANO m²xcm					3'936,40		
62 02.01.007* 04/06/2024	<b>TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DIST ... si a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.</b> Peso specifico Bitume compattato 1,5 Vedi Formulario Rifiuti n. 935433 *(H/peso=21,88*1,5) Vedi Formulario Rifiuti n. 935434 *(H/peso=23,80*1,5) Vedi Formulario Rifiuti n. 935435 *(H/peso=24,16*1,5) Vedi Formulario Rifiuti n. 935436 *(H/peso=25,18*1,5) Vedi Formulario Rifiuti n. 935437 *(H/peso=25,66*1,5)				32,820 35,700 36,240 37,770 38,490	32,82 35,70 36,24 37,77 38,49		
	SOMMANO m³					181,02		
63 17.01.003* .002 04/06/2024	<b>Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... avi dalla profondità di m 1,51 alla profondità di m. 3.00.</b> <b>Vedi allegato 6</b> Linea Fibra Oper Fiber Linea Fibra Telecom <b>Vedi allegato 5</b> Linea Edma gas Da punto 12 a punto 10 (scavo comune con Viva Servizi) Da punto 10 a punto 16 Da punto 10 a punto 3 (scavo comune con Viva Servizi) Stacco 1-2-3 (scavo comune con Viva Servizi) Stacco 4-5 Stacco 6-7 Stacco 19-20 Stacco 12-13-14 (scavo comune con Viva Servizi) Linea Vivaservizi- acqua Da punto 17 a punto 18 (scavo comune con linea telecom) Da punto 18 a punto 9 Da punto 10 a punto 3 (scavo comune con Edma gas) Da punto 10 a punto 12 (scavo comune con Edma gas) Da Punto 12 a punto 14 (scavo comune con Edma gas) Stacco 1-2-3 (scavo comune con Edma gas)		72,00 91,00 58,00 73,00 104,00 10,00 11,50 9,00 7,00 10,10 42,30 11,50 104,00 58,00 10,10 10,00	0,600 0,600 0,800 0,800 0,650 0,800 0,800 0,800 0,600 0,600 0,400 0,800 0,650 0,400 0,800 0,500	1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600	69,12 87,36 74,24 93,44 108,16 12,80 14,72 11,52 6,72 9,70 27,07 14,72 108,16 37,12 12,93 8,00		
	SOMMANO m³					695,78		
64 18.04.003* .001 04/06/2024	<b>Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la ... Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico</b> <b>Vedi allegato 6</b> Linea Fibra Oper Fiber Linea Fibra Telecom <b>Vedi allegato 5</b> Linea Edma gas Da punto 12 a punto 10 (scavo comune con Viva Servizi) Da punto 10 a punto 16		72,00 91,00 58,00 73,00	0,600 0,600 0,800 0,800	0,400 0,400 0,400 0,400	17,28 21,84 18,56 23,36		
	A R I P O R T A R E					81,04		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>					81,04		
	Da punto 10 a punto 3 (scavo comune con Viva Servizi)		104,00	0,650	0,400	27,04		
	Stacco 1-2-3 (scavo comune con Viva Servizi)		10,00	0,800	0,400	3,20		
	Stacco 4-5		11,50	0,800	0,400	3,68		
	Stacco 6-7		9,00	0,800	0,400	2,88		
	Stacco 19-20		7,00	0,600	0,400	1,68		
	Stacco 12-13-14 (scavo comune con Viva Servizi)		10,10	0,600	0,400	2,42		
	Linea Vivaservizi- acqua							
	Da punto 17 a punto 18 (scavo comune con linea telecom)		42,30	0,400	0,400	6,77		
	Da punto 18 a punto 9		11,50	0,800	0,400	3,68		
	Da punto 10 a punto 3 (scavo comune con Edma gas)		104,00	0,650	0,400	27,04		
	Da punto 10 a punto 12 (scavo comune con Edma gas)		58,00	0,400	0,400	9,28		
	Da Punto 12 a punto 14 (scavo comune con Edma gas)		10,10	0,800	0,400	3,23		
	Stacco 1-2-3 (scavo comune con Edma gas)		10,00	0,500	0,400	2,00		
	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>					173,94		
65 18.07.017* .001 04/06/2024	<b>Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato i ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm Vedi allegato 6</b> Linea Fibra Telecom	2,00	91,00			182,00		
	<b>SOMMANO m</b>					182,00		
66 18.04.005* .003 04/06/2024	<b>Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato cost ... lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,80 Vedi allegato 6</b> Linea Fibra Oper Fiber Linea Fibra Telecom <b>Vedi allegato 5</b> Linea Edma gas		72,00	0,600	1,200	51,84		
	Da punto 12 a punto 10 (scavo comune con Viva Servizi)		73,00	0,800	1,200	70,08		
	Da punto 10 a punto 3 (scavo comune con Viva Servizi)		104,00	0,650	1,200	81,12		
	Stacco 1-2-3 (scavo comune con Viva Servizi)		10,00	0,800	1,200	9,60		
	Stacco 4-5		11,50	0,800	1,200	11,04		
	Stacco 6-7		9,00	0,800	1,200	8,64		
	Stacco 19-20		7,00	0,600	1,200	5,04		
	Stacco 12-13-14 (scavo comune con Viva Servizi)		10,10	0,600	1,200	7,27		
	Linea Vivaservizi- acqua							
	Da punto 17 a punto 18 (scavo comune con linea telecom)		42,30	0,400	1,200	20,30		
	Da punto 18 a punto 9		11,50	0,800	1,200	11,04		
	Da punto 10 a punto 3 (scavo comune con Edma gas)		104,00	0,650	1,200	81,12		
	Da punto 10 a punto 12 (scavo comune con Edma gas)		58,00	0,400	1,200	27,84		
	Da Punto 12 a punto 14 (scavo comune con Edma gas)		10,10	0,800	1,200	9,70		
	Stacco 1-2-3 (scavo comune con Edma gas)		10,00	0,500	1,200	6,00		
	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>					521,83		
	<b>Sovrastruttura stradale (Cat 2)</b>							
67 19.13.003* .001 04/06/2024	<b>Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato ... arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm</b> PARTITA IN CONTO PROVVISORIO Bitumatura Lato A14 Bitumatura Lato Camerano	1187,00 644,00			0,100 0,100	118,70 64,40		
	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>					183,10		
68 19.13.004.00 1 04/06/2024	<b>Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... aniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.</b> Per ripristino scavi per linea acqua e gas Vedi DDT N. 357 del 23.02.2024					190,40		
	<b>Parziale 100 kg</b>					190,40		
	<b>A RIPORTARE</b>					190,40		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					190,40		
	Bitumatura Lato A14 Vedi DDT N. 731 del 15.04.2024 Vedi DDT N. 733 del 15.04.2024 Vedi DDT N. 734 del 15.04.2024 Vedi DDT N. 735 del 15.04.2024 Vedi DDT N. 737 del 16.04.2024 Vedi DDT N. 738 del 16.04.2024					273,20 274,40 273,20 272,40 273,40 152,20		
	Parziale 100 kg					1'518,80		
	Bitumatura Lato Camerano Vedi DDT N. 1051 del 28.05.2024 Vedi DDT N. 1054 del 28.05.2024 Vedi DDT N. 1055 del 28.05.2024 Vedi DDT N. 1056 del 28.05.2024					269,80 308,40 270,40 264,20		
	Parziale 100 kg					1'112,80		
	SOMMANO 100 kg					2'822,00		
69 19.13.006 04/06/2024	<b>Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... .L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro.</b> Per ripristino scavi per linea acqua e gas Vedi DDT N. 291 del 15.02.2024 Vedi DDT N. 738 del 16.04.2024					90,20 54,00		
	SOMMANO 100 kg					144,20		
	<b>Opere di completamento (Cat 3)</b>							
70 D01.006 04/06/2024	<b>CORDONCINO TRAPEZOIDALE PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</b> Aiuola centrale *(lung.=(88,00+85,00)/2) <b>In detrazione varco centrale</b> Aiuola spartitraffico Lato A14		86,50			86,50		
	Sommano positivi e negativi ml					102,50	6,50	
	SOMMANO ml					96,00		
71 03.03.001* .005 04/06/2024	<b>Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicte nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa</b> Pavimentazione aiuola lato A14		8,40		0,150	1,26		
	SOMMANO m³					1,26		
72 03.04.003* 04/06/2024	<b>Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</b> Rete Ø6 15x15 Pavimentazione aiuola lato A14		8,40		2,980	25,03		
	SOMMANO kg					25,03		
73 06.04.025* .001 04/06/2024	<b>Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autoblocca ... masselli sagomati doppio T (20x16,5 circa, spessore cm 6).</b> Pavimentazione aiuola lato A14		8,40			8,40		
	SOMMANO m²					8,40		
74 02.02.001* .001	<b>Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.</b> Aiuola centrale							
	A RIPORTARE							


Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
04/06/2024	<b>Superficie</b> In detrazione magro di fondazione In detrazione plinto	580,00	5,00 3,00	5,000 3,000	1,200 1,050 1,200	696,00	26,25 10,80	
	Sommano positivi e negativi m³					696,00	37,05	
	SOMMANO m³					658,95		
75 19.18.028 04/06/2024	<b>Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastifica ...</b> onché per la fornitura e posa in opera dei fili tenditori. Recinzione lato Camerano		90,00		1,500	135,00		
	SOMMANO m²					135,00		
	<b>Impianto illuminazione (Cat 7)</b>							
76 17.01.003* .001 04/06/2024	<b>Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... re</b> il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50. Vedi allegato 7 Allaccio palo illuminazione *(lung.=10,80+29,20+30,20)		70,20	0,600	1,000	42,12		
	SOMMANO m³					42,12		
77 18.07.017* .001 04/06/2024	<b>Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato i ...</b> committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm Vedi allegato 7 Allaccio palo illuminazione *(lung.=11,70+10,80+29,20+30,20+2,00)		83,90			83,90		
	SOMMANO m					83,90		
78 18.04.003* .001 04/06/2024	<b>Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la ...</b> Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico Vedi allegato 7 Allaccio palo illuminazione *(lung.=11,70+10,80+29,20+30,20) In detrazione tubazione *(larg.=0,08*0,08*3,14)		81,90 -83,00	0,600 0,020	0,400	19,66	1,66	
	Sommano positivi e negativi m³					19,66	1,66	
	SOMMANO m³					18,00		
79 18.04.005* .003 04/06/2024	<b>Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato cost ...</b> lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,80 Vedi allegato 7 Allaccio palo illuminazione *(lung.=10,80+29,20+30,20)		70,20	0,600	0,600	25,27		
	SOMMANO m³					25,27		
80 18.09.004* .004 04/06/2024	<b>Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ...</b> Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 Vedi allegato 7 Allaccio impianto illuminazione *(par.ug.=4*2)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00		
81 18.09.010* 04/06/2024	<b>Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in gh ... tre</b> compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Allaccio impianto illuminazione	4,00			61,000	244,00		
	SOMMANO kg					244,00		
	A R I P O R T A R E							





- rimozione di barriere metalliche
- taglio della pavimentazione in congl. bituminoso
- demolizione di sovrastruttura stradale

- rimozione di barriere metalliche
- - - - - taglio della pavimentazione
- ▨ demolizione di sovrastruttura stradale

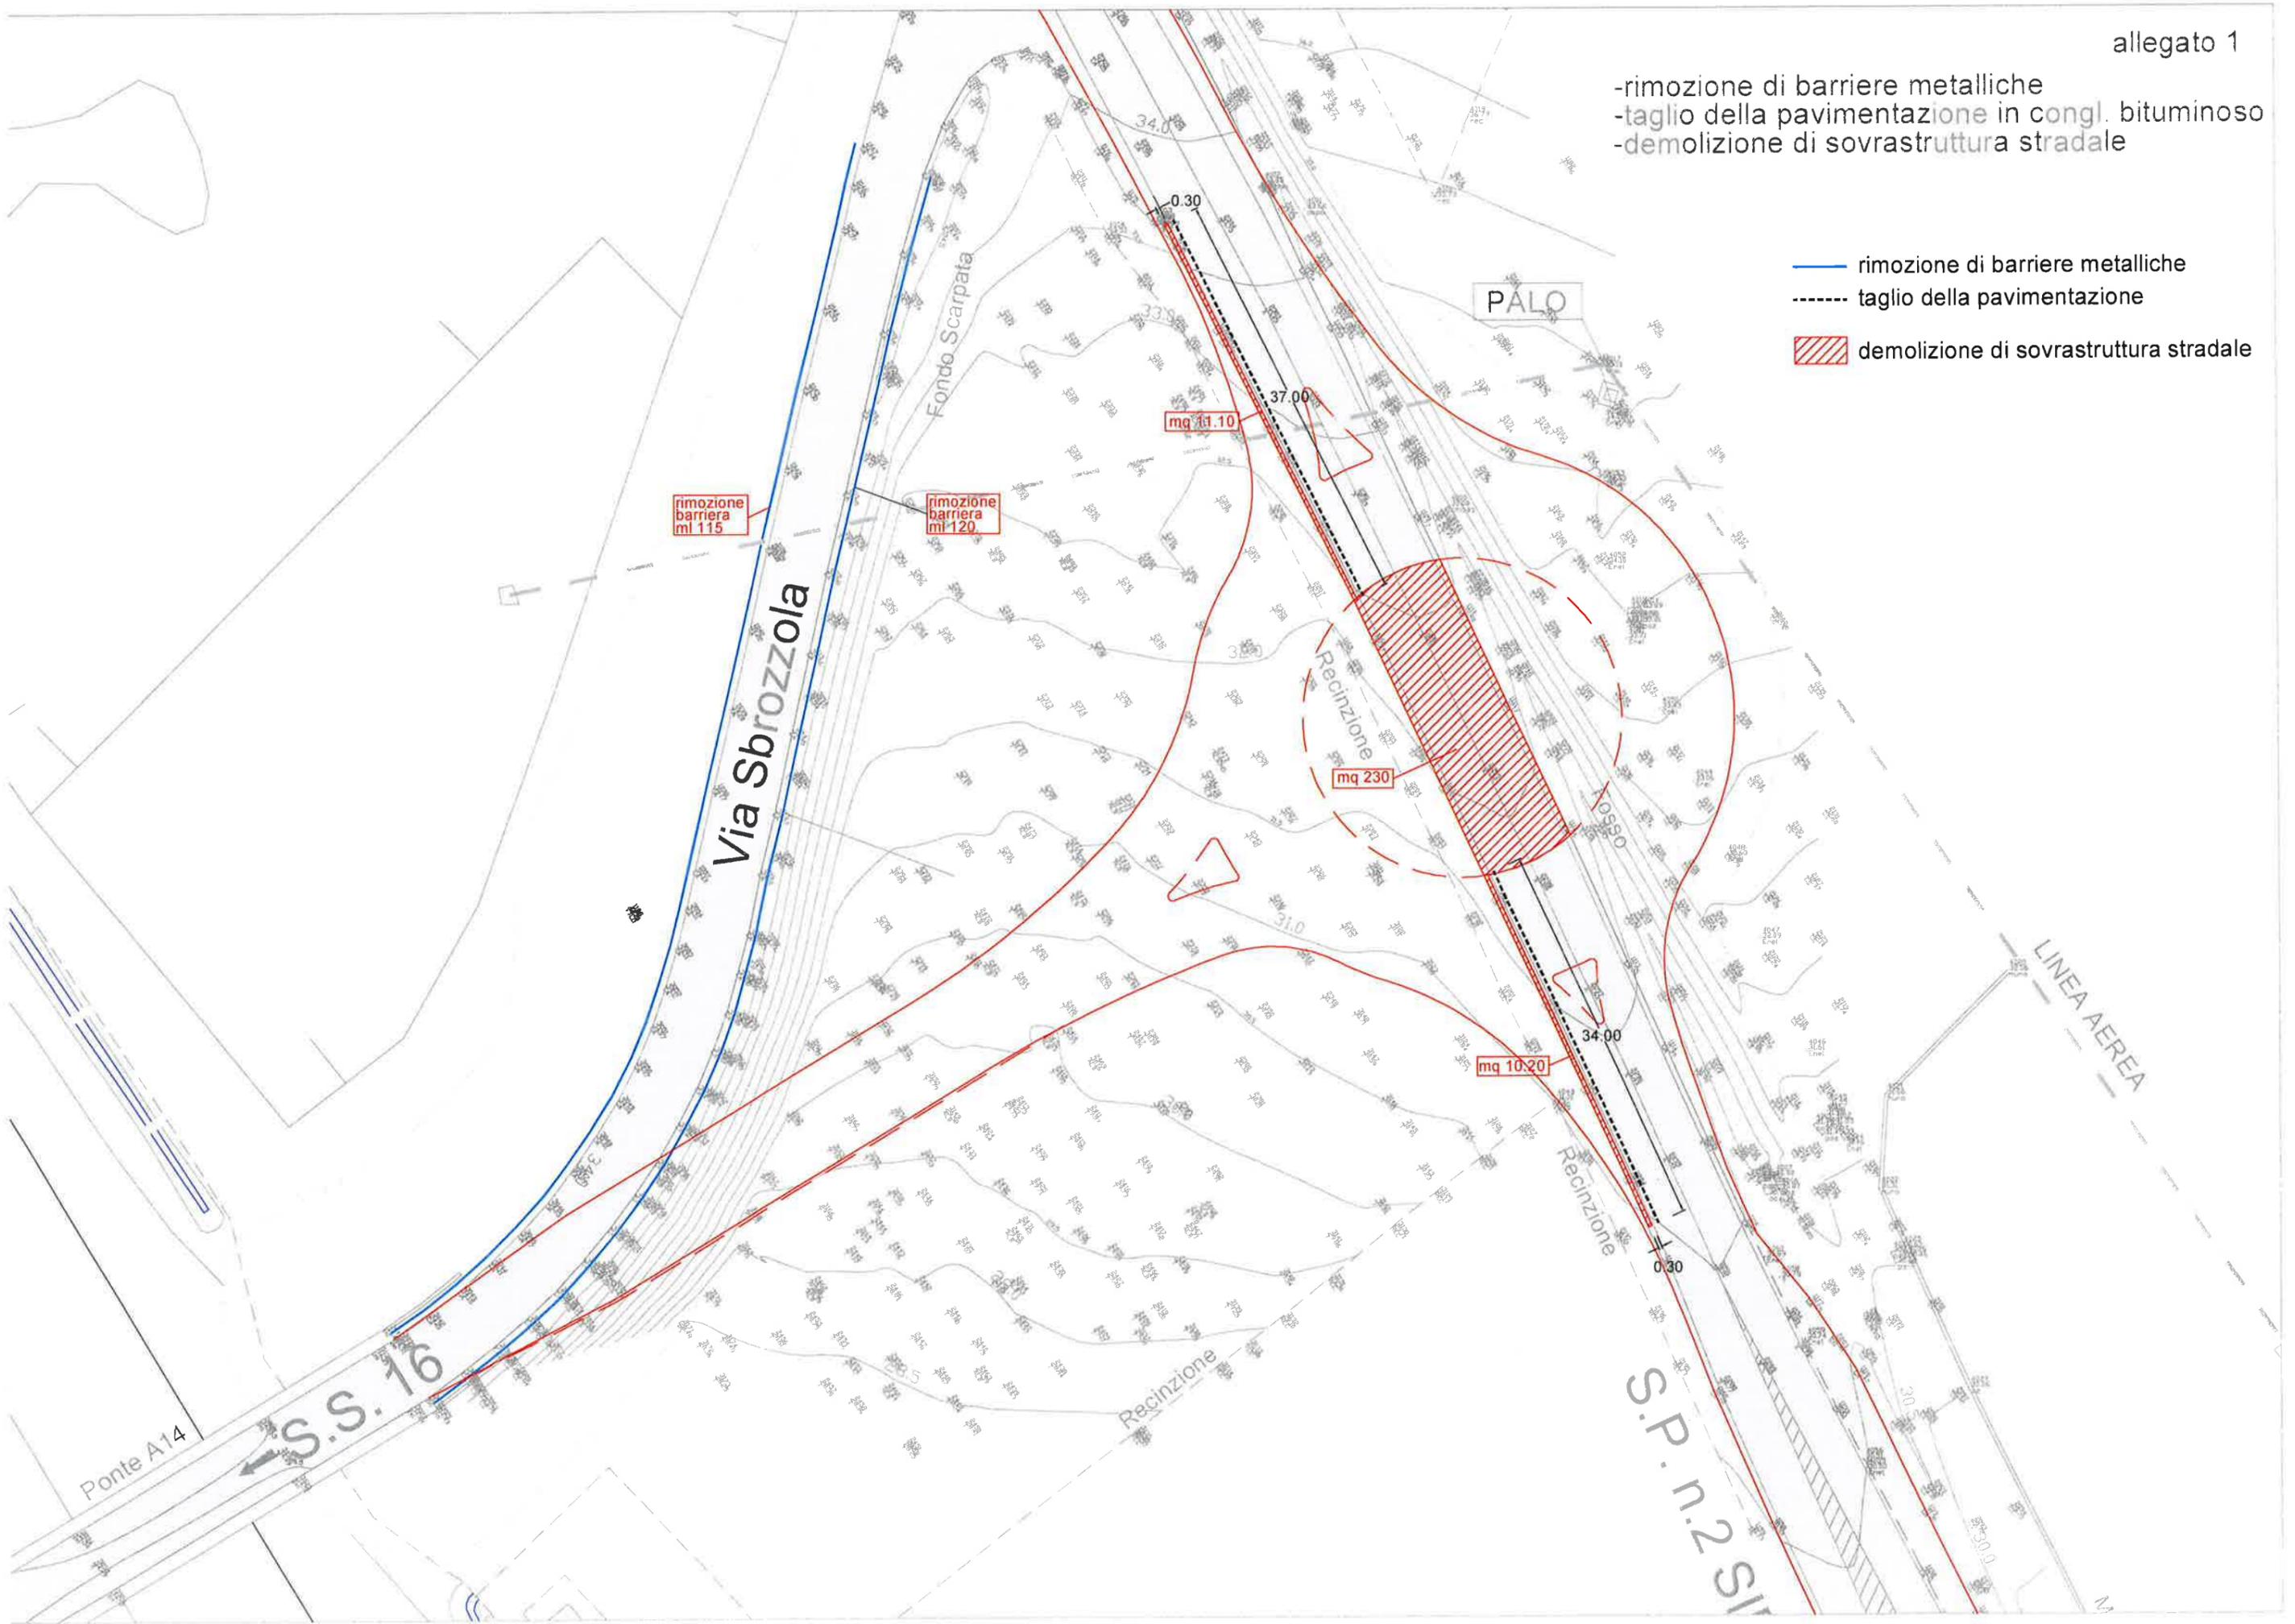

-sbancamento in materie di qualsiasi natura

-compattazione del piano di posa


-geotessile

-anticapillare

-stabilizzato 0-70 sp. 25 cm

-stabilizzato 0-25 sp. 15 cm

-mq 726

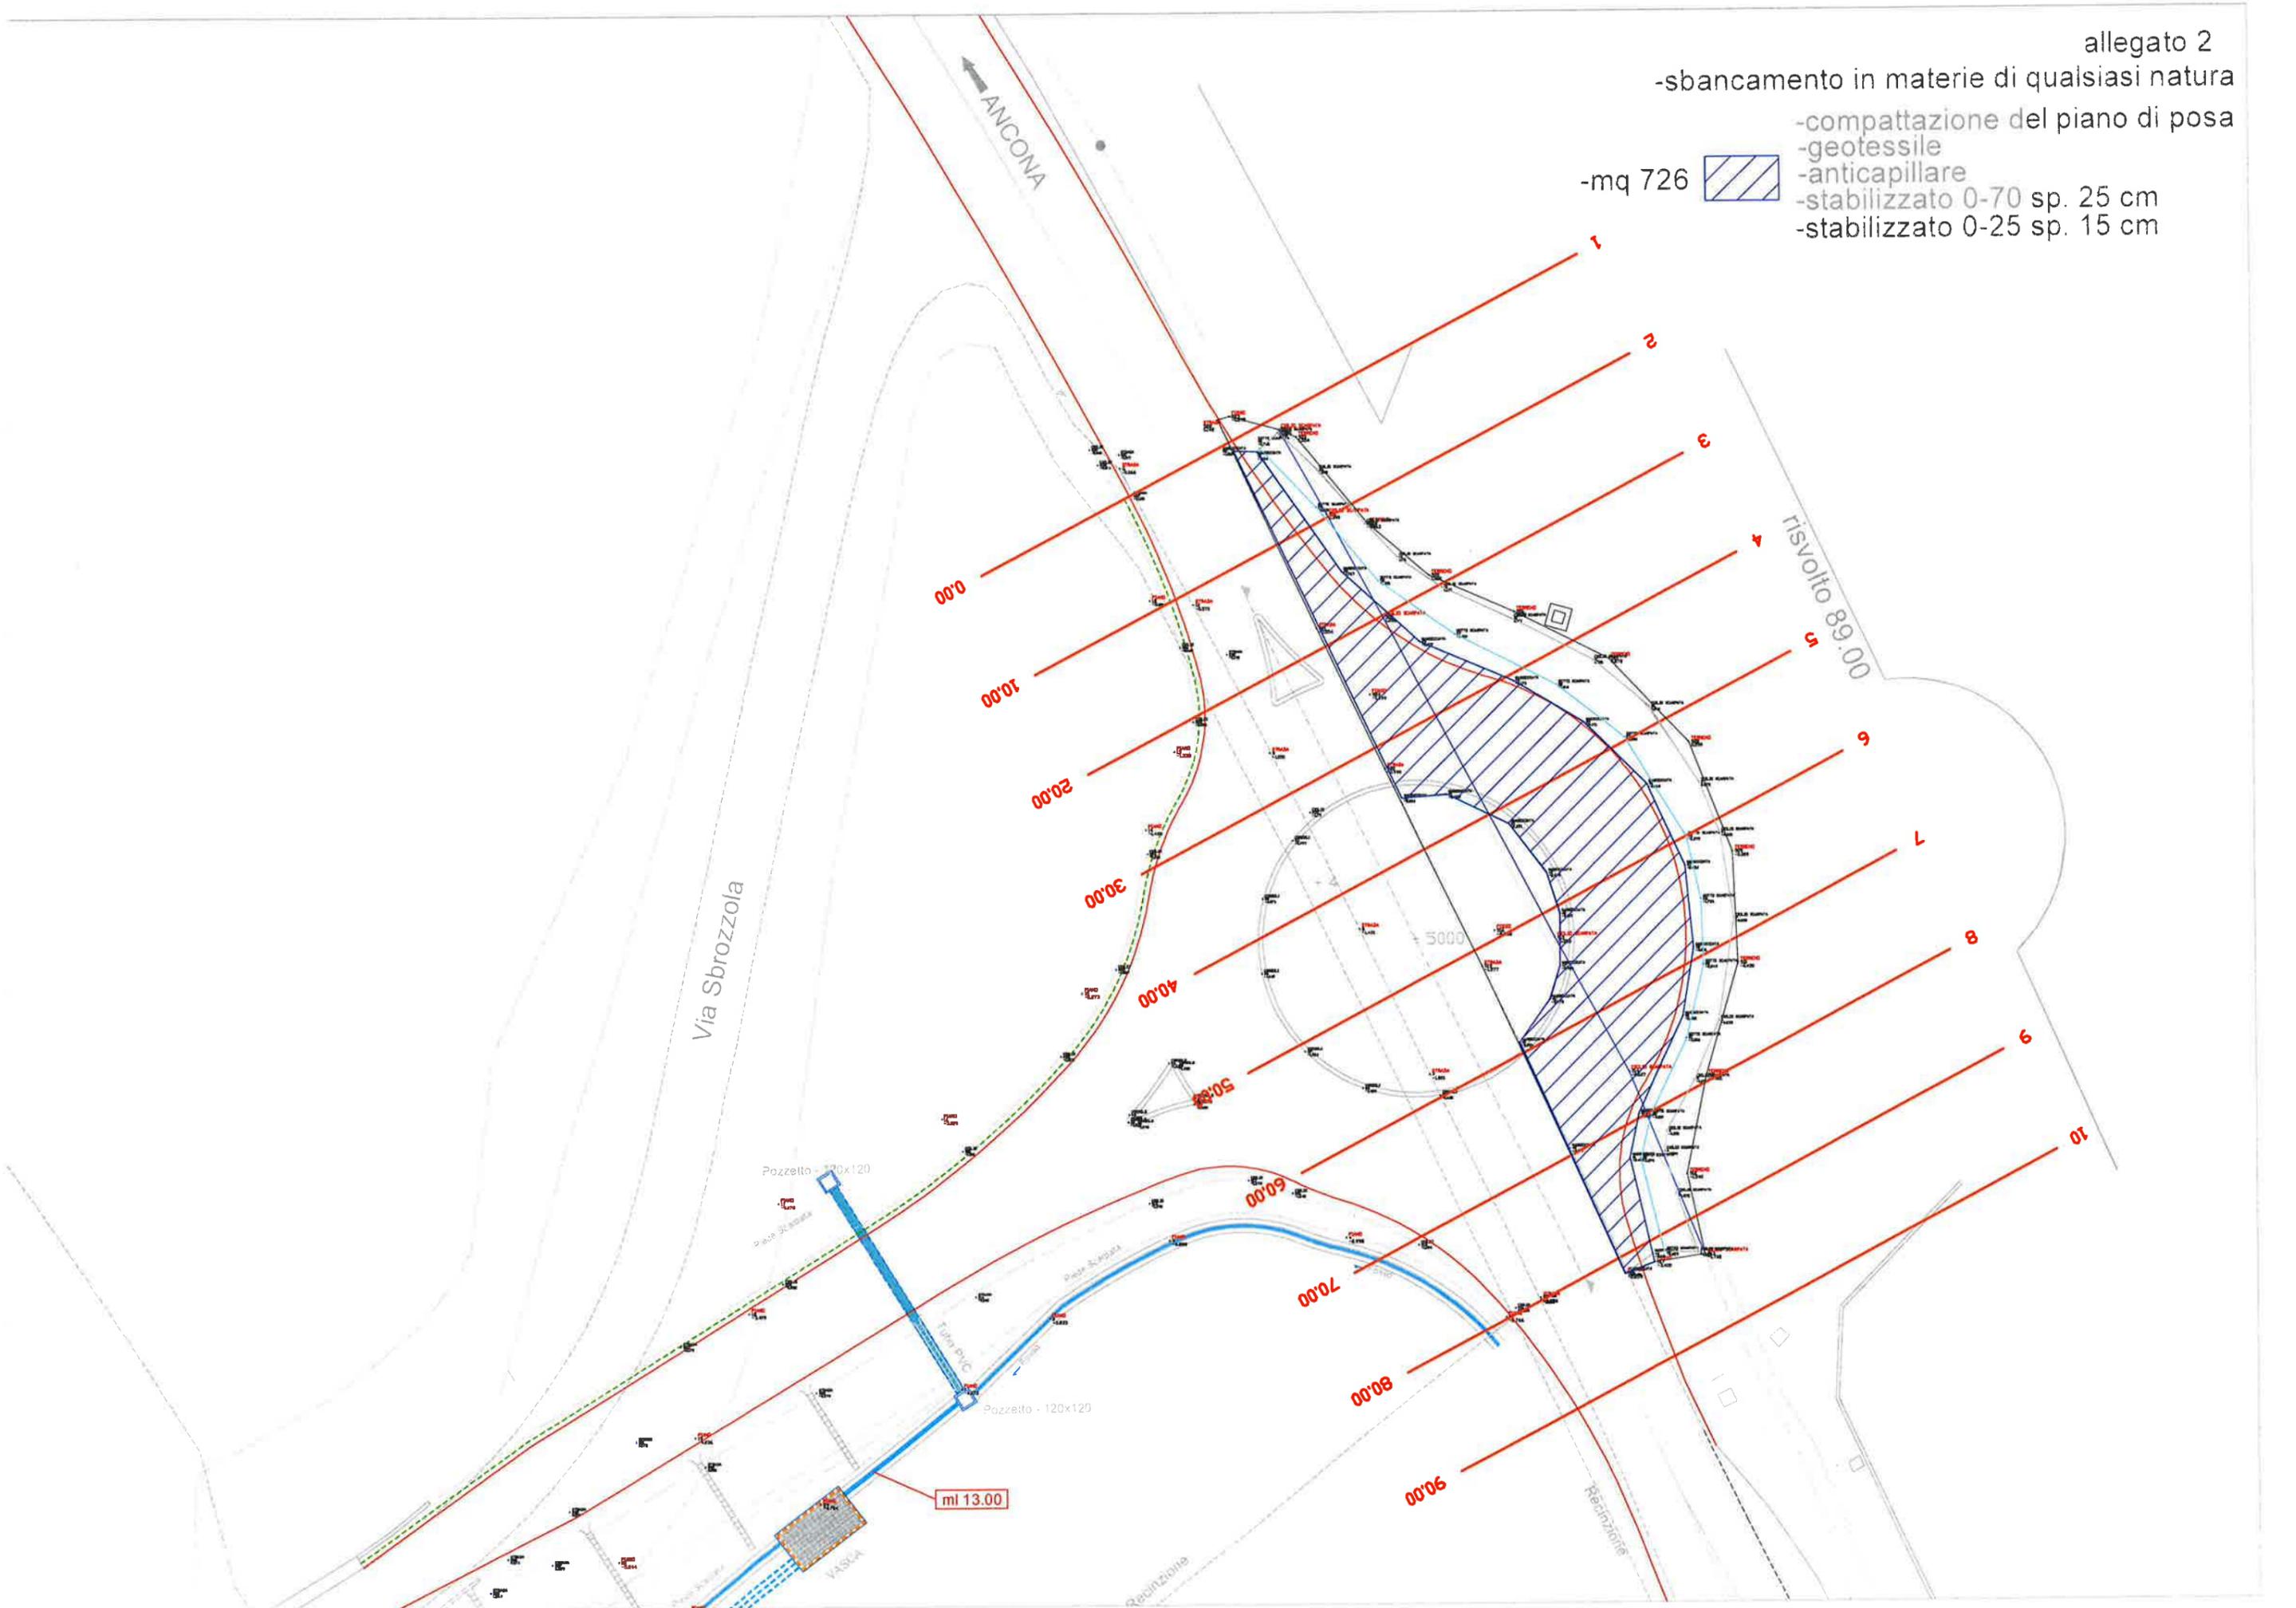


Sezione 1  
Progressiva 0.00 m

# SUPERFICIE MQ 0.00

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
SCALA ALTEZZE 1 : 200

-2.00



Punti battuti Terreno

Quote Terreno

Distanze parziali Terreno

Distanze progressive Terreno

30.00

31.81

0.82  
1.81

0.01  
1.56

0.28  
0.68

0.28  
4.02

0.07  
5.12

24.87


Sezione 2  
Progressiva 10.00 m

# SUPERFICIE MQ 9.62

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
SCALA ALTEZZE 1 : 200

-3.00

30.00



Punti battuti Terreno

Quote Terreno

Distanze parziali Terreno

Distanze progressive Terreno

1.41	0	2	6	6	7	8	
-1.94	2.06	0.18	0.58	3.75	4.26	5.20	5.63
					0.94	0.43	
							24.37

28.06

24.37

Sezione 3  
Progressiva 20.00 m

# SUPERFICIE MQ 20.17

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
SCALA ALTEZZE 1 : 200


-3.00

Punti battuti Terreno

Quote Terreno

Distanze parziali Terreno

Distanze progressive Terreno

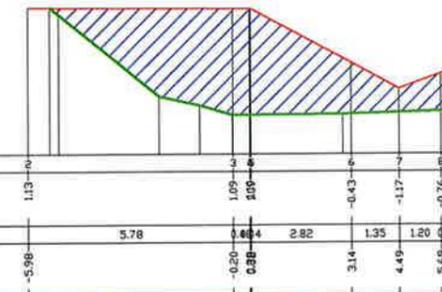

Sezione 4  
Progressiva 30.00 m


SUPERFICIE MQ 41.04

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
SCALA ALTEZZE 1 : 200

-4.00



-30.00

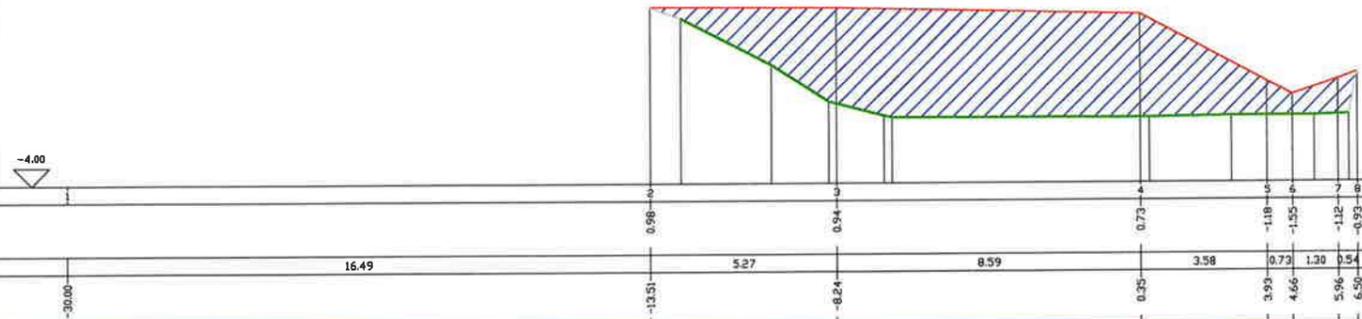



Sezione 6  
 Progressiva 50.00 m

SUPERFICIE MQ 41.61

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
 SCALA ALTEZZE 1 : 200


-4.00

Punti battuti Terreno

Quote Terreno

Distanze parziali Terreno

Distanze progressive Terreno



Sezione 7  
Progressiva 60.00 m

SUPERFICIE MQ 43.75

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
SCALA ALTEZZE 1 : 200


-5.00

Punti battuti Terreno

Quote Terreno

Distanze parziali Terreno

Distanze progressive Terreno



Sezione 8  
Progressiva 70.00 m

# SUPERFICIE MQ 13.90

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
SCALA ALTEZZE 1 : 200


-5.00

Punti battuti Terreno

Quote Terreno

Distanze parziali Terreno

Distanze progressive Terreno




Sezione 9  
Progressiva 80.00 m

# SUPERFICIE MQ 3.58

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
SCALA ALTEZZE 1 : 200

-5.00



## Rapporto di Prova N. 1030 240513 del 20/05/2024

Data di emissione: 20/05/2024

### Richiedente:

Spett.le

ECOCOSTRUZIONI SRL

S. PROVINCIALE STAFFOLO-JESI, 1/3

60030 MONTE ROBERTO (AN)

### Destinatario:

Spett.le

ECOCOSTRUZIONI SRL

S. PROVINCIALE STAFFOLO-JESI, 1/3

60030 MONTE ROBERTO (AN)

Categoria merceologica:

**RIFIUTI SOLIDI**

Prodotto:

**Rifiuto pericolosità-recupero**

Descrizione del campione:

**CROSTE DI ASFALTO**

**Luogo di produzione e prelievo del rifiuto: cantiere EDILBENINCASA c/o rotatoria ,  
Via della Sbrozzola - CAMERANO**

**CIG: 9502965EC9**

**CUP: H71B20000560002**

Processo produttivo

-

che genera il rifiuto:

Informazioni sul campione:

**EER: 17 03 02**

**miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01**

Prelevatore:

**Committente**

Modalità di campionamento:

**Campionamento effettuato dal committente**

Data campionamento:

**13/05/2024**

Data arrivo campione:

**13/05/2024**

Contratto/Commessa:

**P**

**Segue Rapporto di Prova N. 1030 240513 del 20/05/2024**

**RISULTATI ANALITICI**

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite rilevabilità	Data inizio analisi Data fine analisi	Limiti A	Limiti B
Stato fisico UNI 10802:2002 (app.A)	-	solido non pulverulento		0	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Colore ASTM D 4979-19	-	grigio - nero		0	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Residuo secco a 105°C IRSA CNR Q.64 Vol.2: 1984 m.2/Notiziario IRSA 2 2008	%	97,39		0,01	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Residuo a 600°C IRSA CNR Q.64 Vol.2: 1984 m.2/Notiziario IRSA 2 2008	%	93,17		0,01	13/05/2024 20/05/2024	-	-
pH CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Unità di pH	8,87		2,00	13/05/2024 20/05/2024	[5,5 - 12] (26)	-
Arsenico (As) CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg	0,9		0,5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Berillio (Be) CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg	< 1,0		1,0	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Cadmio (Cd) CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg	< 0,5		0,5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Cromo totale (Cr) CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg	3,1		1,0	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Cromo esavalente (Cr VI) CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1986 Metodo 16	mg/Kg	< 0,5		0,5	13/05/2024 20/05/2024	1000 (18)	-
Mercurio (Hg) CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3220 A Man 29 2003	mg/Kg	< 1,0		1,0	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Nichel (Ni) CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg	8,2		1,0	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Piombo (Pb) CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg	21,1		1,0	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Rame (Cu) CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg	4,6		0,5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Zinco (Zn) CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg	11,3		0,5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
IPA (rifiuti solidi)				0		-	-
Naftalene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-

**Segue Rapporto di Prova N. 1030 240513 del 20/05/2024**

**RISULTATI ANALITICI**

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite rilevabilità	Data inizio analisi Data fine analisi	Limiti A	Limiti B
Acenaftilene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Acenaftene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Fluorene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Fenantrene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Antracene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Fluorantene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Pirene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Benzo (a) antracene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Crisene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Benzo (b) fluorantene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Benzo (k) fluorantene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Benzo (j) fluorantene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Benzo (e) pirene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Benzo (a) pirene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Indeno (1,2,3 cd) pirene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Dibenzo (a,h) antracene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Benzo (g,h,i) perilene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Dibenzo (a,l) pirene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Dibenzo (a,e) pirene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-

## Segue Rapporto di Prova N. 1030 240513 del 20/05/2024

### RISULTATI ANALITICI

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite rilevabilità	Data Inizio analisi Data fine analisi	Limiti A	Limiti B
Dibenzo (a,i) pirene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-
Dibenzo (a,h) pirene EPA 3550 C 2007+ EPA 8270 D 2018	mg/Kg	< 5		5	13/05/2024 20/05/2024	-	-

### Riferimenti Normativi

- (18) D.Lgs 152/2006 Parte quarta Allegato D. Criteri per la classificazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti speciali pericolosi.  
(26) D.M.05/04/2006 n.186 - All. 3 e s.m.l.

### Conformità / non conformità ai requisiti e alle specifiche

## Segue Rapporto di Prova N. 1030 240513 del 20/05/2024

INDICE DI PERICOLOSITA' REGOLAMENTO UE 1357/2014 e s.m.i.

Sigla di pericolo - Caratt.di pericolo (Reg.1357/2014) - Concentrazione rilevata - (Concentrazione Limite)

HP 1 - Esplosivo - Caratteristica assente - Met.spec. Reg.440-08  
HP 2 - Comburente - Caratteristica assente - Met.spec. Reg.440-08  
HP 3 - Infiammabile - Inferiore al limite (=> 55°C)  
HP 4 - Irritante - Inferiore ai limiti specifici (=> 1-20%)  
HP 5 - Tossicità specifica - Inferiore ai limiti specifici (=> 1-20%)  
HP 6 - Tossicità acuta - Inferiore ai limiti specifici (=> 0,1-55%)  
HP 7 - Cancerogeno - Inferiore ai limiti specifici (=> 0,1-1%)  
HP 8 - Corrosivo - Inferiore al limite (=> 5 %)  
HP 9 - Infettivo - Caratteristica assente  
HP 10 - Tossico per la riproduzione - Inferiore ai limiti specifici (=> 0,3-3%)  
HP 11 - Mutageno - Inferiore ai limiti specifici (=> 0,1-1%)  
HP 12 - Liberaz. gas a tox.acuta - Caratteristica assente - Metodi e linee guida specifici  
HP 13 - Sensibilizzante - Inferiore al limite (=> 10%)  
HP 14 - Ecotossico - Caratteristica non attribuibile  
HP 15 - Rifiuto che non possiede pericoli precedenti, ma può manifestarli successivamente - Caratteristica assente

### VALUTAZIONI AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE

ai sensi della parte IV del D. Lgs. 152/06 del 03/04/06 e s.m.i. in accordo al Reg. UE 1357/2014, alla Dec. UE 955 del 18/12/14, Reg. UE 1272/08 così come mod. dal Reg. UE 1179/16 e dal Reg. UE 692 del 16/02/2022, Reg. UE 997/2017, Reg. UE 1021/19, linee guida SNPA Delib. n. 105/2021.

Al rifiuto, di cui al campione oggetto di analisi, il Produttore/Detentore, sulla base dell'attività che lo ha generato, ha attribuito il seguente codice EER: 17 03 02

Denominazione EER: Miscelate bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.

I parametri da determinare sono stati scelti in base alla tipologia del rifiuto ed alle indicazioni fornite dal produttore sulle materie prime utilizzate e sul ciclo produttivo, tenuto conto della L. 11 agosto 2014 n°116, del Reg. 1357/2014/UE e del Reg. UE 1272/08, come modificato dal Reg. CE 1179/16.

Ai sensi dell'allegato D del D. Lgs. del 3 dicembre 2010 n. 205, sulla base di quanto riportato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, come modif. dalla Dec. 2014/955/UE e dal Reg. n.2017/997/UE del 08/06/2017 (caratteristica di pericolo HP14), il campione in esame risulta:

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO (art.184. D.Lgs. n°152/2006 e Dec. 2000/532/CE e succ. mod. int.)

### VALUTAZIONI AI FINI DELLO SMALTIMENTO/RECUPERO

Considerati i caratteri chimico fisici del rifiuto in oggetto, esso è conforme ai requisiti richiesti al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 come modificato da D.M. n.186 del 05/04/06, pertanto può essere avviato al RECUPERO IN CENTRO AUTORIZZATO.

Il Resp. del sott. Chimico  
Dott. Chim. Augusto Gaggiotti

### Note

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio s.r.l. Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio, i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il Cliente è responsabile di tutte le informazioni fornite relative al campione.

I valori di incertezza contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità P=95%, gradi di libertà > 10 e fattore di copertura K= 2.

Iscrizione al numero 5 dell'elenco regionale della Regione Marche dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDPF n. 197/VSA del 19/12/2019.

Fine rapporto di prova.

## Rapporto di Prova N. 780 240327 del 18/04/2024

Data di emissione: 18/04/2024

### Richiedente:

Spett.le  
ECOCOSTRUZIONI SRL  
S. PROVINCIALE STAFFOLO-JESI, 1/3  
60030 MONTE ROBERTO (AN)

### Destinatario:

Spett.le  
ECOCOSTRUZIONI SRL  
S. PROVINCIALE STAFFOLO-JESI, 1/3  
60030 MONTE ROBERTO (AN)

Categoria merceologica: **SUOLO**  
Prodotto: **Suolo**  
Descrizione del campione: **TERRA DA SCAVO**  
**Sito di prelievo: c/o cantiere Edilbenincasa - Camerano**  
**CIG: 9502965EC9 - CUP: H71B20000560002**

### Note campione:

- Attività di scavo

Prelevatore: **Committente**  
Modalità di campionamento: **D.M.13/09/1999 ALLEGATO -1 Met. I.1\***  
Data campionamento: **27/03/2024**  
Data arrivo campione: **27/03/2024**  
Contratto/Commessa: **P**

## RISULTATI ANALITICI

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite rilevabilità	Data inizio analisi Data fine analisi	Limiti A	Limiti B
Residuo secco a 105°C DM 13/09/99 GU N° 248 21/10/99 Met.II.2 (calcolo)	% p/p	82,55		0,10	27/03/2024 15/04/2024	-	-
Umidità DM 13/09/99 GU N° 248 21/10/99 Met.II.2	% p/p	17,45		0,10	27/03/2024 15/04/2024	-	-
Frazione granulometrica da 2 cm a 2 mm (scheletro) DM 13/09/99 GU N° 248 21/10/99 Met.II.1	% p/p	0,7		0,1	27/03/2024 15/04/2024	-	-
RISULTATI ANALITICI SU FRAZ.GRAN.< 2mm ESPRESSI SUL TOT. DEI MAT. SECCHI	-	-		0	27/03/2024 15/04/2024	-	-
Arsenico (As) CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg s.s.	10,62		0,10	27/03/2024 15/04/2024	20 (8)	50 (10)
Cadmio (Cd) CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg s.s.	0,70		0,10	27/03/2024 15/04/2024	2 (8)	15 (10)

## Segue Rapporto di Prova N. 780 240327 del 18/04/2024

### RISULTATI ANALITICI

Parametro	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite rilevabilità	Data inizio analisi Data fine analisi	Limiti A	Limiti B
<b>Cobalto (Co)</b> CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg s.s.	5,6		0,5	27/03/2024 15/04/2024	20 (8)	250 (10)
<b>Cromo totale (Cr)</b> CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg s.s.	45,3		1,0	27/03/2024 15/04/2024	150 (8)	800 (10)
<b>Cromo esavalente (Cr VI)</b> EPA 3060 1996 + APAT CNR IRSA 3150 C 29/2003	mg/Kg s.s.	< 0,2		0,2	27/03/2024 15/04/2024	2 (8)	15 (10)
<b>Mercurio (Hg)</b> CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + EPA 245-1 r.3	mg/Kg s.s.	< 0,1		0,1	27/03/2024 15/04/2024	1 (8)	5 (10)
<b>Nichel (Ni)</b> CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg s.s.	44,3		1,0	27/03/2024 15/04/2024	120 (8)	500 (10)
<b>Piombo (Pb)</b> CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg s.s.	18,1		1,0	27/03/2024 15/04/2024	100 (8)	1.000 (10)
<b>Rame (Cu)</b> CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg s.s.	29,3		1,0	27/03/2024 15/04/2024	120 (8)	600 (10)
<b>Zinco (Zn)</b> CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/Kg s.s.	48,9		1,0	27/03/2024 15/04/2024	150 (8)	1.500 (10)
<b>Idrocarburi pesanti C &gt; 12</b> ISO 16703:2004	mg/Kg s.s.	< 5		5	27/03/2024 15/04/2024	50 (8)	750 (10)
<b>AMIANTO TOTALE</b> DM 06/09/1994 GU SG n°288 del 10/12/1994 all 1 met B#	mg/Kg s.s.	n.r. (Ved. All)		100	27/03/2024 15/04/2024	1000 (8)	1.000 (10)
<b>PROVE SU ELUATO DA TEST DI CESSIONE IN ACQUA (UNI EN 12457-2)</b> UNI EN 12457-2	-	-		0	27/03/2024 15/04/2024	-	-
<b>Cloruri (Cl)</b> APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	2,8		0,1	27/03/2024 15/04/2024	100 (26)	-
<b>Fluoruri (F)</b> APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,9		0,2	27/03/2024 15/04/2024	1,5 (26)	-
<b>Nitrati (NO3)</b> APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	4,7		0,1	27/03/2024 15/04/2024	50 (26)	-
<b>Solfati (SO4)</b> APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	2,6		1,0	27/03/2024 15/04/2024	250 (26)	-
<b>Cianuri (CN)</b> UNI EN 12457-2:2004 + EPA 9014/1996	microg/l	< 5,0		5,0	27/03/2024 15/04/2024	50 (26)	-
<b>Arsenico (As)</b> APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	microg/l	< 1,0		1,0	27/03/2024 15/04/2024	50 (26)	-

## Segue Rapporto di Prova N. 780 240327 del 18/04/2024

### RISULTATI ANALITICI

Parametro Metodo	Unità di misura	Risultato	Incertezza	Limite rilevabilità	Data inizio analisi Data fine analisi	Limiti A	Limiti B
Bario (Ba) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	< 0,05		0,05	27/03/2024 15/04/2024	1 (26)	-
Berillio (Be) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	microg/l	< 1,0		1,0	27/03/2024 15/04/2024	10 (26)	-
Cadmio (Cd) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	microg/l	< 0,1		0,1	27/03/2024 15/04/2024	5 (26)	-
Cobalto APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	microg/l	< 5		5	27/03/2024 15/04/2024	250 (26)	-
Cromo totale (Cr) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	microg/l	< 1,0		1,0	27/03/2024 15/04/2024	50 (26)	-
Mercurio (Hg) EPA 245-1 r.3.0	microg/l	< 0,1		0,1	27/03/2024 15/04/2024	1 (26)	-
Nichel (Ni) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	microg/l	< 0,1		0,1	27/03/2024 15/04/2024	10 (26)	-
Piombo (Pb) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	microg/l	< 1,0		1,0	27/03/2024 15/04/2024	50 (26)	-
Rame (Cu) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	< 0,005		0,005	27/03/2024 15/04/2024	0,05 (26)	-
Selenio (Se) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	microg/l	< 1,0		1,0	27/03/2024 15/04/2024	10 (26)	-
Vanadio (V) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	microg/l	< 10		10	27/03/2024 15/04/2024	250 (26)	-
Zinco (Zn) APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	< 0,01		0,01	27/03/2024 15/04/2024	3 (26)	-
Amianto (test cessione) MP-CHI-009-R0/2009	mg/l	< 3		3	27/03/2024 15/04/2024	30 (26)	-
COD (come O2) ISPRA Metodo 5135 Man. 117/2014	mg/l	22		1	27/03/2024 15/04/2024	30 (26)	-
pH (dell'eluato) APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	Unità di pH	7,83		2,00	27/03/2024 15/04/2024	[5,5 - 12] (26)	-

### Riferimenti Normativi

- (8) D.Lgs 152/2006 Parte quarta Tab.1 All.5 al titolo V - siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale  
 (26) D.M.05/04/2006 n.186 - All. 3 e s.m.i.  
 (10) D.Lgs 152/2006 Parte quarta Tab.1 All.5 al titolo V - siti ad uso commerciale e industriale

## Segue Rapporto di Prova N. 780 240327 del 18/04/2024

### Conformità / non conformità ai requisiti e alle specifiche

Il campione analizzato risulta conforme ai limiti per i siti destinati sia ad uso verde pubblico, privato e residenziale, sia ad uso commerciale e industriale, riportati dal D.Lgs. 152/06 parte quarta, Tab.1 All.5 al titolo V.

Il campione in oggetto presenta, sulla base delle analisi chimiche eseguite sull'eluato, valori analitici che rientrano nei limiti previsti dal Decreto n.186 del 05/04/2006 e s.m.i.

Il Resp. del sett. Chimico  
Dott. Chim. Augusto Gaggiotti



### Note

Il presente rapporto di prova si riferisce esclusivamente al campione oggetto di analisi. La riproduzione totale o parziale del presente rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto dal laboratorio Igienstudio s.r.l. Il campionamento è escluso dal campo dell'accreditamento. Nel caso in cui il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio, i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il Cliente è responsabile di tutte le informazioni fornite relative al campione. I valori di incertezza contenuti nel presente documento sono relativi ad un livello di probabilità  $P=95\%$ , gradi di libertà  $>10$  e fattore di copertura  $K=2$ .

Iscrizione al numero 5 dell'elenco regionale della Regione Marche dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari, come da Allegato A del DDPF n. 197/VSA del 19/12/2019.

Le prove contrassegnate (#) sono state eseguite presso il Laboratorio esterno CSG Palladio Srl.

Fine rapporto di prova.

**RAPPORTO DI PROVA N° 24CP0013521**

Data di emissione :10/04/2024



LAB N° 0662 L  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 1 di 2

Codice campione: **24CP0013521**      **Committente:** **IGIENSTUDIO S.r.l.**  
Data ricevimento: **09/04/2024**      Via: **VIALE DEL LAVORO 37/a**  
Data prelievo: **27/03/2024**      Città: **60035 JESI (AN)**  
Luogo e punto di prelievo: **CAMERANO - RICHIEDENTE:**  
**ECOCOSTRUZIONI**  
Campionamento eseguito da: **Cliente**

Data inizio prove: **09/04/2024**      Data fine prove: **10/04/2024**

Matrice: **Rifiuti solidi**

Descrizione campione: **87.005 - TERRENO**

La riproduzione parziale del presente Rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio Emittente.

**RISULTATI DELLE PROVE**

Denominazione prova	Unità di misura	Valore	LOQ	Metodo di prova
Amianto	mg/kg	n.r.	100	DM 06/09/1994 GU SG n° 288 10/12/1994 All. 1 Met. B



C.S.G. Palladio S.r.l. (facente parte del gruppo Lifeanalytics)

Sede operativa:

Strada Saviabona 278/1A - 36100 Vicenza (VI)

P.IVA 14996171006 C.F. 02644700243

Tel +39 0444 304091 - Fax +39 0444 313136

www.lifeanalytics.it

## RAPPORTO DI PROVA N° 24CP0013521

Data di emissione :10/04/2024



LAB N° 0662 L  
Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Pag. 2 di 2

### Altre informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati:

#### **I Risultati del presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.**

L'incertezza "I" riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che dà un livello di fiducia approssimativamente del 95%.

Per le analisi chimiche l'incertezza riportata si riferisce all'incertezza dell'analisi senza contributo dell'incertezza di campionamento.

Per le prove di amianto sulla matrice areiformi sono indicati il limite fiduciario inferiore (LFI) ed il limite fiduciario superiore (LFS) con il 95% di probabilità, fattore di copertura  $K=2$ . Per le ricerche microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95%  $K=2$ , o l'intervallo di confidenza stesso.

L'incertezza estesa riportata è calcolata in conformità alla norma UNI EN ISO 19036:2020 e successive integrazioni stimando separatamente i contributi tecnico, di matrice e di distribuzione.

I risultati delle prove microbiologiche sono emessi in accordo a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7218:2013.

Quando i risultati sono espressi con  $<4$  (UFC/ml) o  $<40$  (UFC/g) i microrganismi sono presenti ma in numero inferiore a 4 (UFC/ml) o 40 (UFC/g) rispettivamente.

'n.r.': < al Limite di Rilevabilità LOD (se non indicato si fa riferimento al Limite di Quantificazione LOQ). Per le prove microbiologiche qualitative non viene riportato.

Si precisa che ogni risultato espresso come 'n.r.' non indica, in ogni caso, l'assenza del parametro ricercato nel campione in esame.

LOQ: Limite di Quantificazione: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata con accettabile precisione (ripetibilità) e accuratezza in condizioni ben specificate.

LOD: Limite di Rilevabilità: è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere rilevata ma non necessariamente quantificata in condizioni ben specificate.

Nel caso di analisi esclusivamente quantitative non viene indicato.

NR/R: Non rilevabile; Rilevabile

P/N: Positivo; Negativo

Rec%: Recupero%, quando indicato rappresenta il valore del recupero che è stato applicato ai risultati, relativamente agli analiti risultati superiori al rispettivo LOQ.

Qualora il campionario non sia un tecnico del Laboratorio, i dati relativi alla descrizione del campione e del campionamento si intendono forniti dalla persona che ha eseguito lo stesso e il laboratorio declina la responsabilità di quelle informazioni che possono influenzare la validità dei risultati; i risultati contenuti nel Rapporto di Prova si riferiscono, in tal caso, esclusivamente al campione così come ricevuto ed il laboratorio declina la responsabilità dei risultati di quei parametri che potrebbero essere stati influenzati dagli scostamenti rispetto alle informazioni presenti all'interno del MD-26 "informativa al cliente" (es. tempi e contenitori), di cui il cliente è stato informato. In tal caso, verranno opportunamente indicati nel rapporto di prova, se il cliente ne confermerà la prosecuzione dell'analisi.

Qualora il campionamento non sia stato eseguito da un nostro tecnico, i risultati che tengono conto delle misure effettuate in fase di campionamento sono ottenuti mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi lo ha eseguito.

L'attività analitica è stata condotta su una frazione rappresentativa della totalità del campione accettato dal laboratorio. La preparazione di porzioni di prova rappresentative dal campione di laboratorio per la matrice rifiuti è stata effettuata secondo la norma UNI EN 15002:2015.

Le dichiarazioni di conformità a specifiche di legge o specifiche del cliente, se riportate, non tengono conto del contributo dell'incertezza di misura, tranne nei casi in cui la regola decisionale sia contenuta nella specifica stessa; che in tal caso verrà esplicitata.

Esclusioni ISO 17604:2015: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 8 della norma ISO 17604:2015 ed il cap. 9 della stessa nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.

Esclusioni ISO 18593:2018: qualora il campionamento sia eseguito dal cliente, si esclude il cap. 7 della norma ISO 18593:2018 ed il cap. 8 della stessa nel caso in cui anche il trasporto sia a carico del cliente; inoltre, si escludono i medesimi punti dai metodi di prova applicati dal laboratorio.

Data inizio prove: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso.

Data fine prove: si intende la data d'approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio.

**Responsabile di Laboratorio Dott.ssa Elena  
Monni**

**Iscritto all'ordine Interprovinciale dei Chimici e dei  
Fisici del Veneto N 803**

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente



C.S.G. Palladio S.r.l. (facente parte del gruppo Lifeanalytics)


Sede operativa:

Strada Saviabona 278/1A - 36100 Vicenza (VI)

P.IVA 14996171006 C.F. 02644700243

Tel +39 0444 304091 - Fax +39 0444 313136

www.lifeanalytics.it

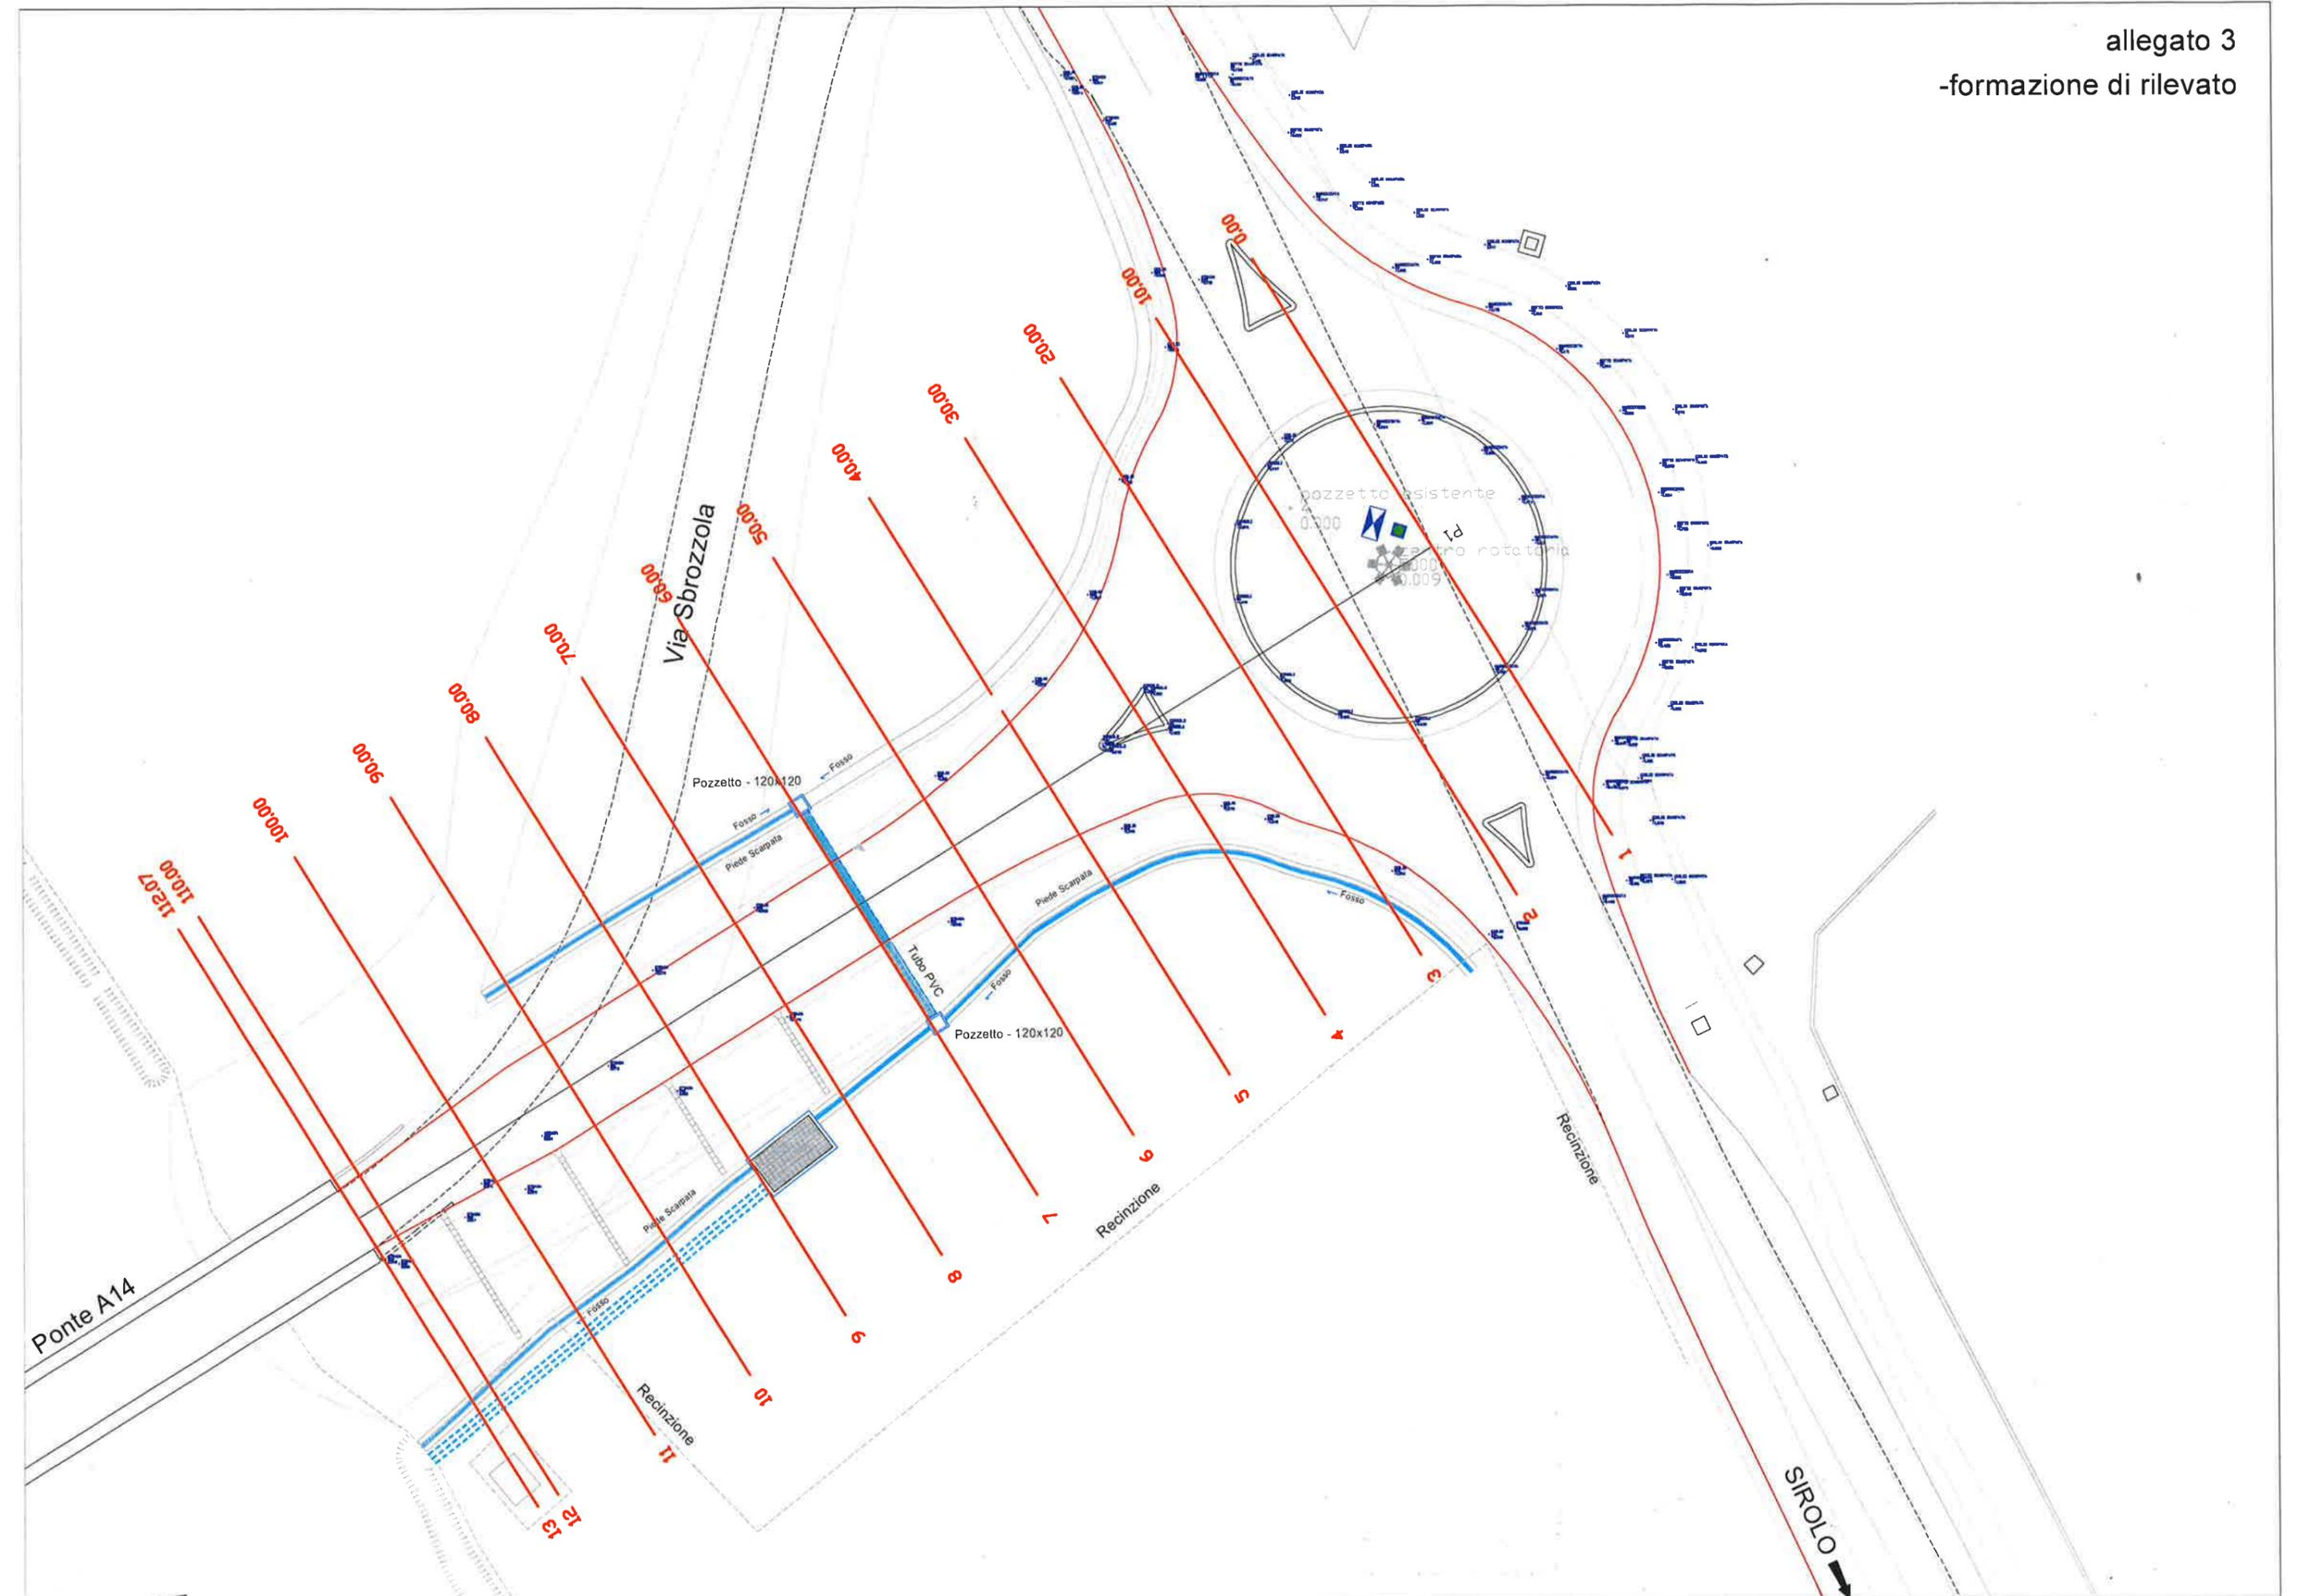

Sezione 1  
Progressiva 0.00 m

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
SCALA ALTEZZE 1 : 200

0.00

Punti battuti Terreno

Quote Terreno

Distanze parziali Terreno

60.00

Distanze progressive Terreno


0.00

30.00

Sezione 2  
 Progressiva 10.00 m

AREA RILEVATO 16.90 mq

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
 SCALA ALTEZZE 1 : 200




Punti battuti Terreno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote Terreno	-1.75	-1.64	-1.62		-0.88	-0.83	-0.90	-0.99	-0.93	-0.88	-1.00
Distanze parziali Terreno	0.04	3.22	0.75	25.01	1.37	8.30	2.88	2.18	1.23	0.93	
Distanze progressive Terreno	-30.00	-18.92	-18.65	-11.90	13.11	14.48	22.78	25.66	27.84	29.07	30.00

Sezione 3  
 Progressiva 20.00 m

AREA RILEVATO 47.40mq

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
 SCALA ALTEZZE 1 : 200




Sezione 4  
 Progressiva 30.00 m

AREA RILEVATO 39.83 mq

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
 SCALA ALTEZZE 1 : 200

-5.00




Sezione 5  
Progressiva 40.00 m

AREA RILEVATO 40.06 mq

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
SCALA ALTEZZE 1 : 200

-5.00




Punti battuti Terreno

Quote Terreno

Distanze parziali Terreno

Distanze progressive Terreno




Sezione 6  
Progressiva 50.00 m

AREA RILEVATO 48.32 mq

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
SCALA ALTEZZE 1 : 200

-5.00



Sezione 7  
Progressiva 60.00 m

AREA RILEVATO 58.11 mq

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
SCALA ALTEZZE 1 : 200

-6.00




Punti battuti Terreno

Quote Terreno

Distanze parziali Terreno

Distanze progressive Terreno

-30.00

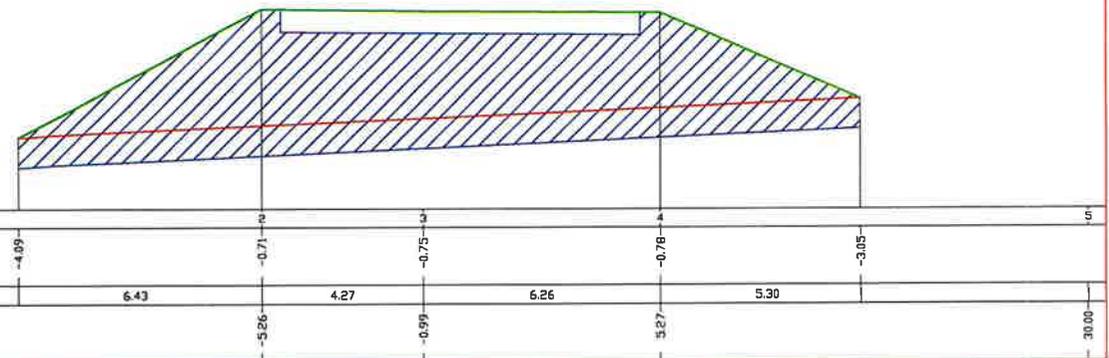

Sezione 8  
Progressiva 70.00 m

AREA RILEVATO 56.06 mq

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
SCALA ALTEZZE 1 : 200


-6.00

Punti battuti Terreno

Quote Terreno

Distanze parziali Terreno

Distanze progressive Terreno




Sezione 9  
Progressiva 80.00 m

AREA RILEVATO 36.21 mq

SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
SCALA ALTEZZE 1 : 200

-6.00




Punti battuti Terreno

Quote Terreno

Distanze parziali Terreno

Distanze progressive Terreno








Sezione 12  
Progressiva 110.00 m


AREA RILEVATO 7.45 mq


SCALA LUNGHEZZE 1 : 200  
SCALA ALTEZZE 1 : 200

-8.00



-mq 1166  -stabilizzato 0-70 sp. 25 cm  
-stabilizzato 0-25 sp. 15 cm

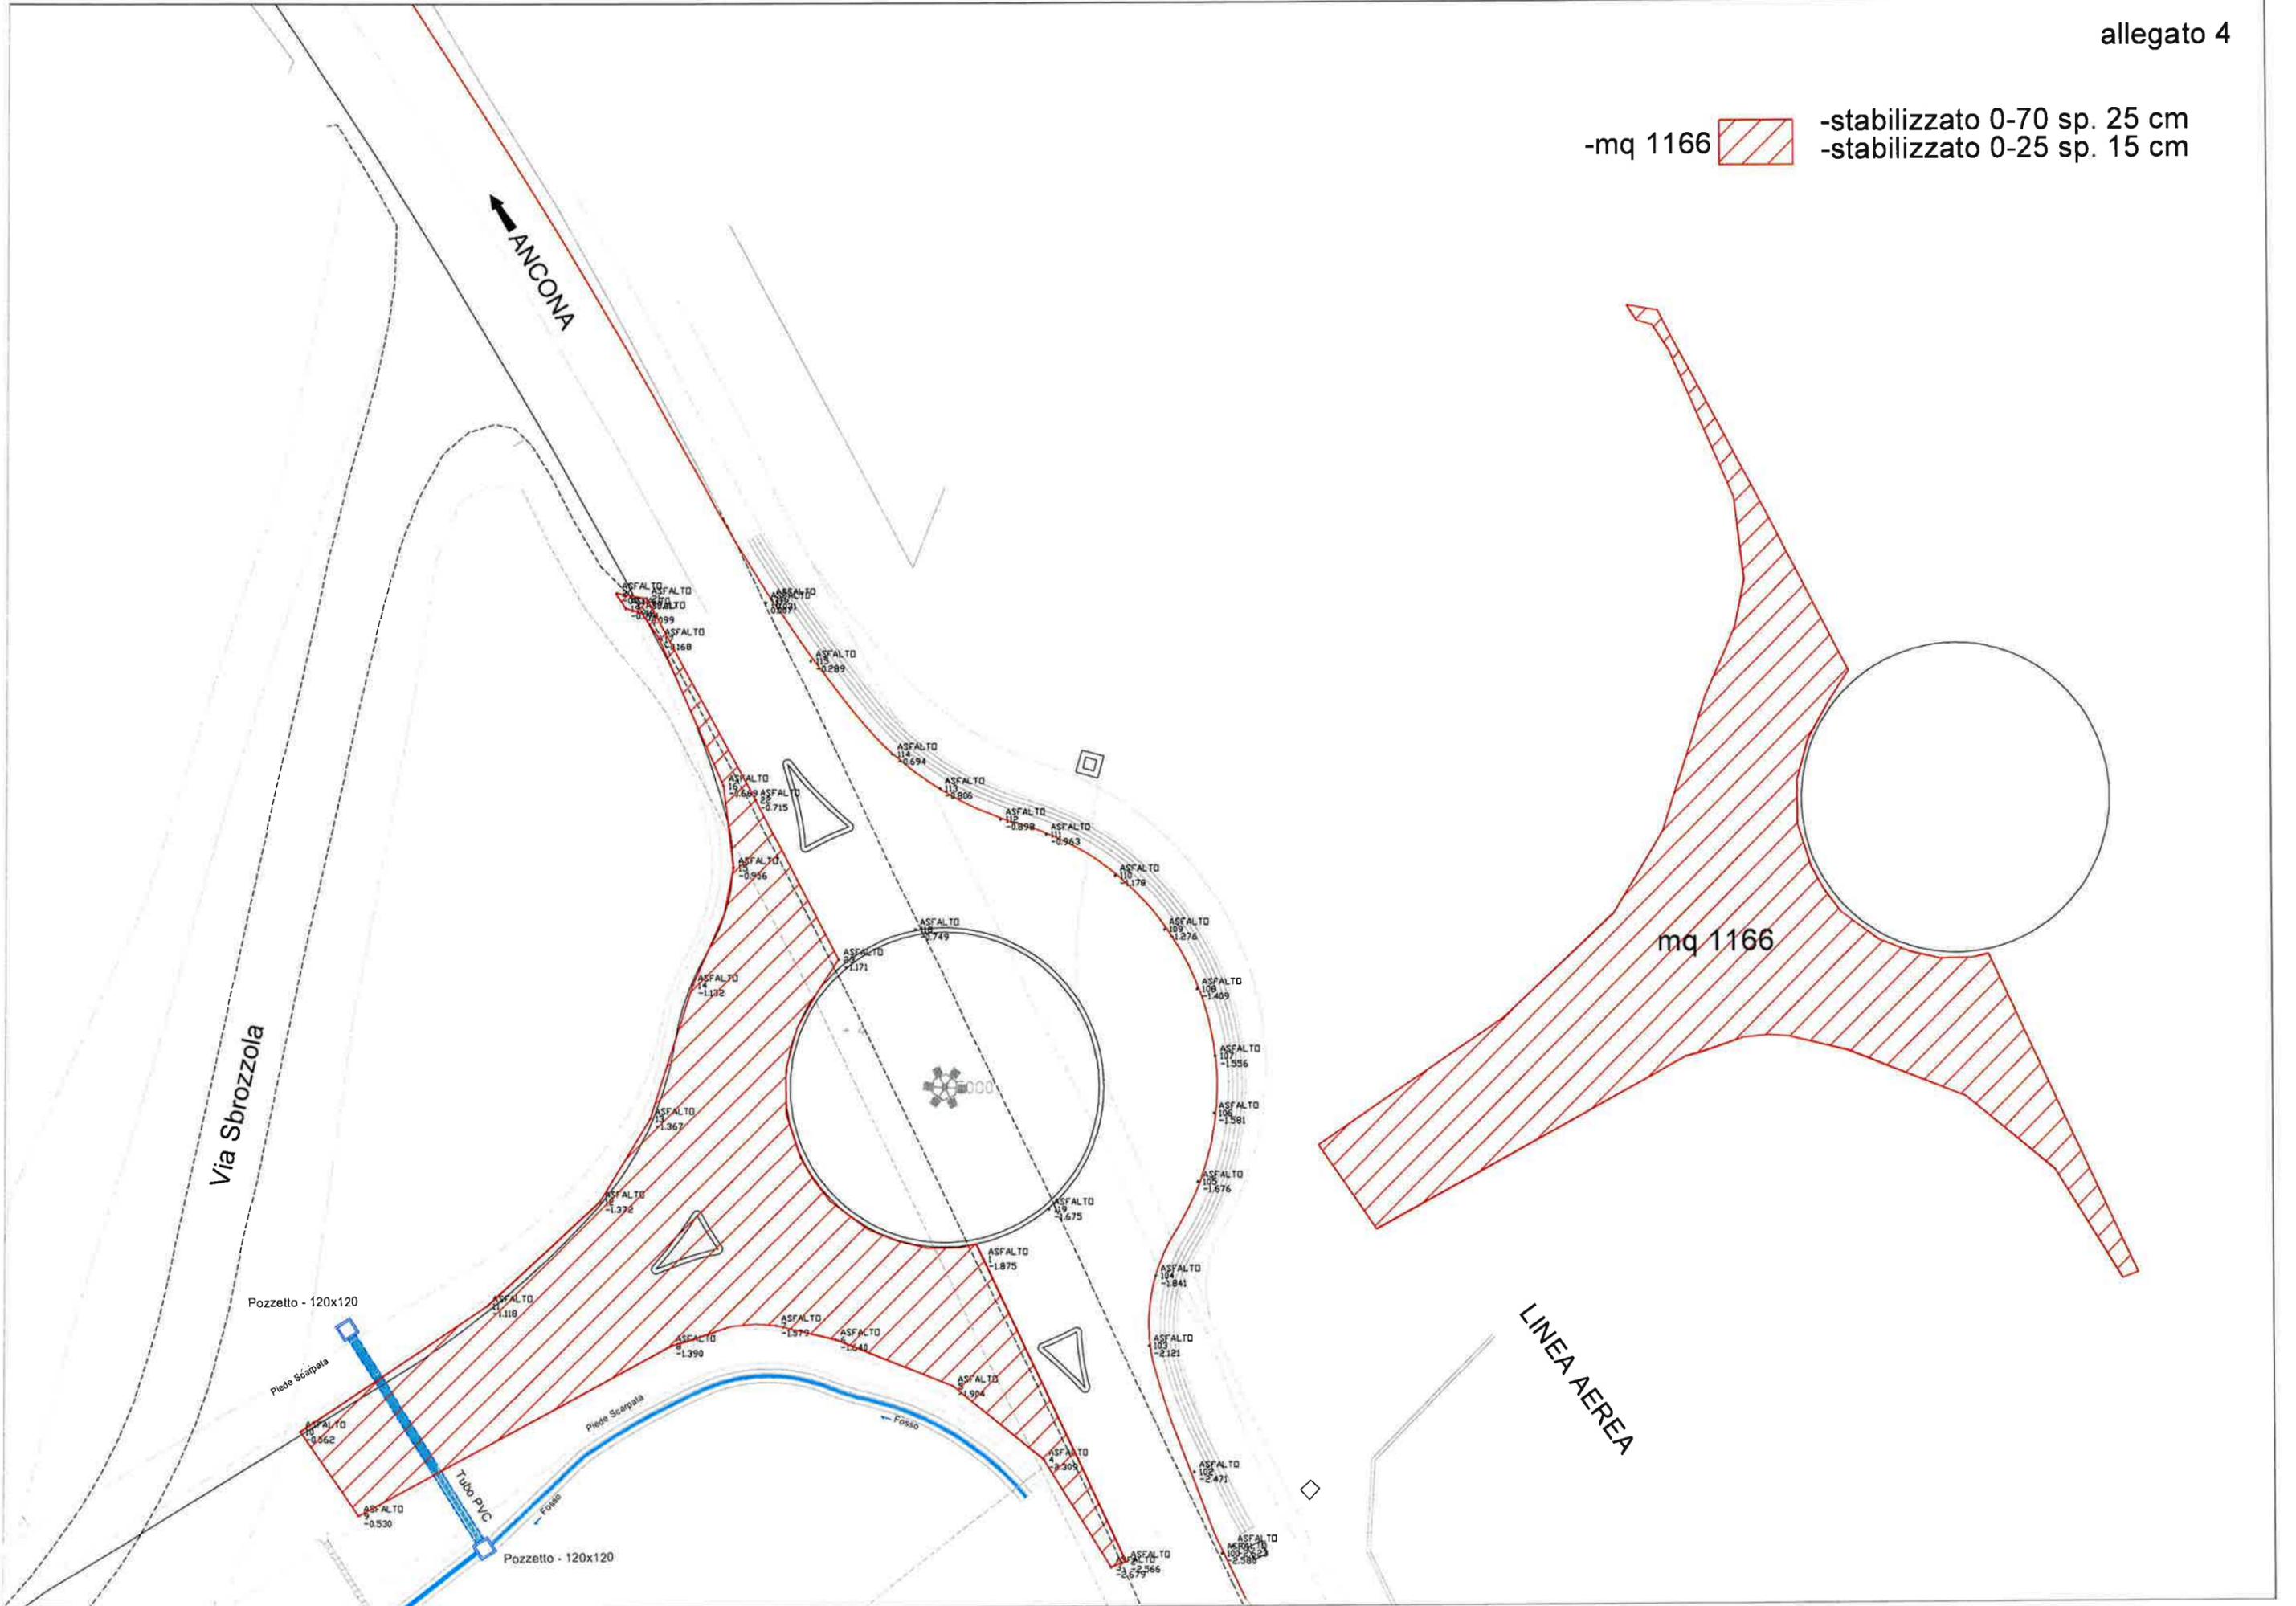

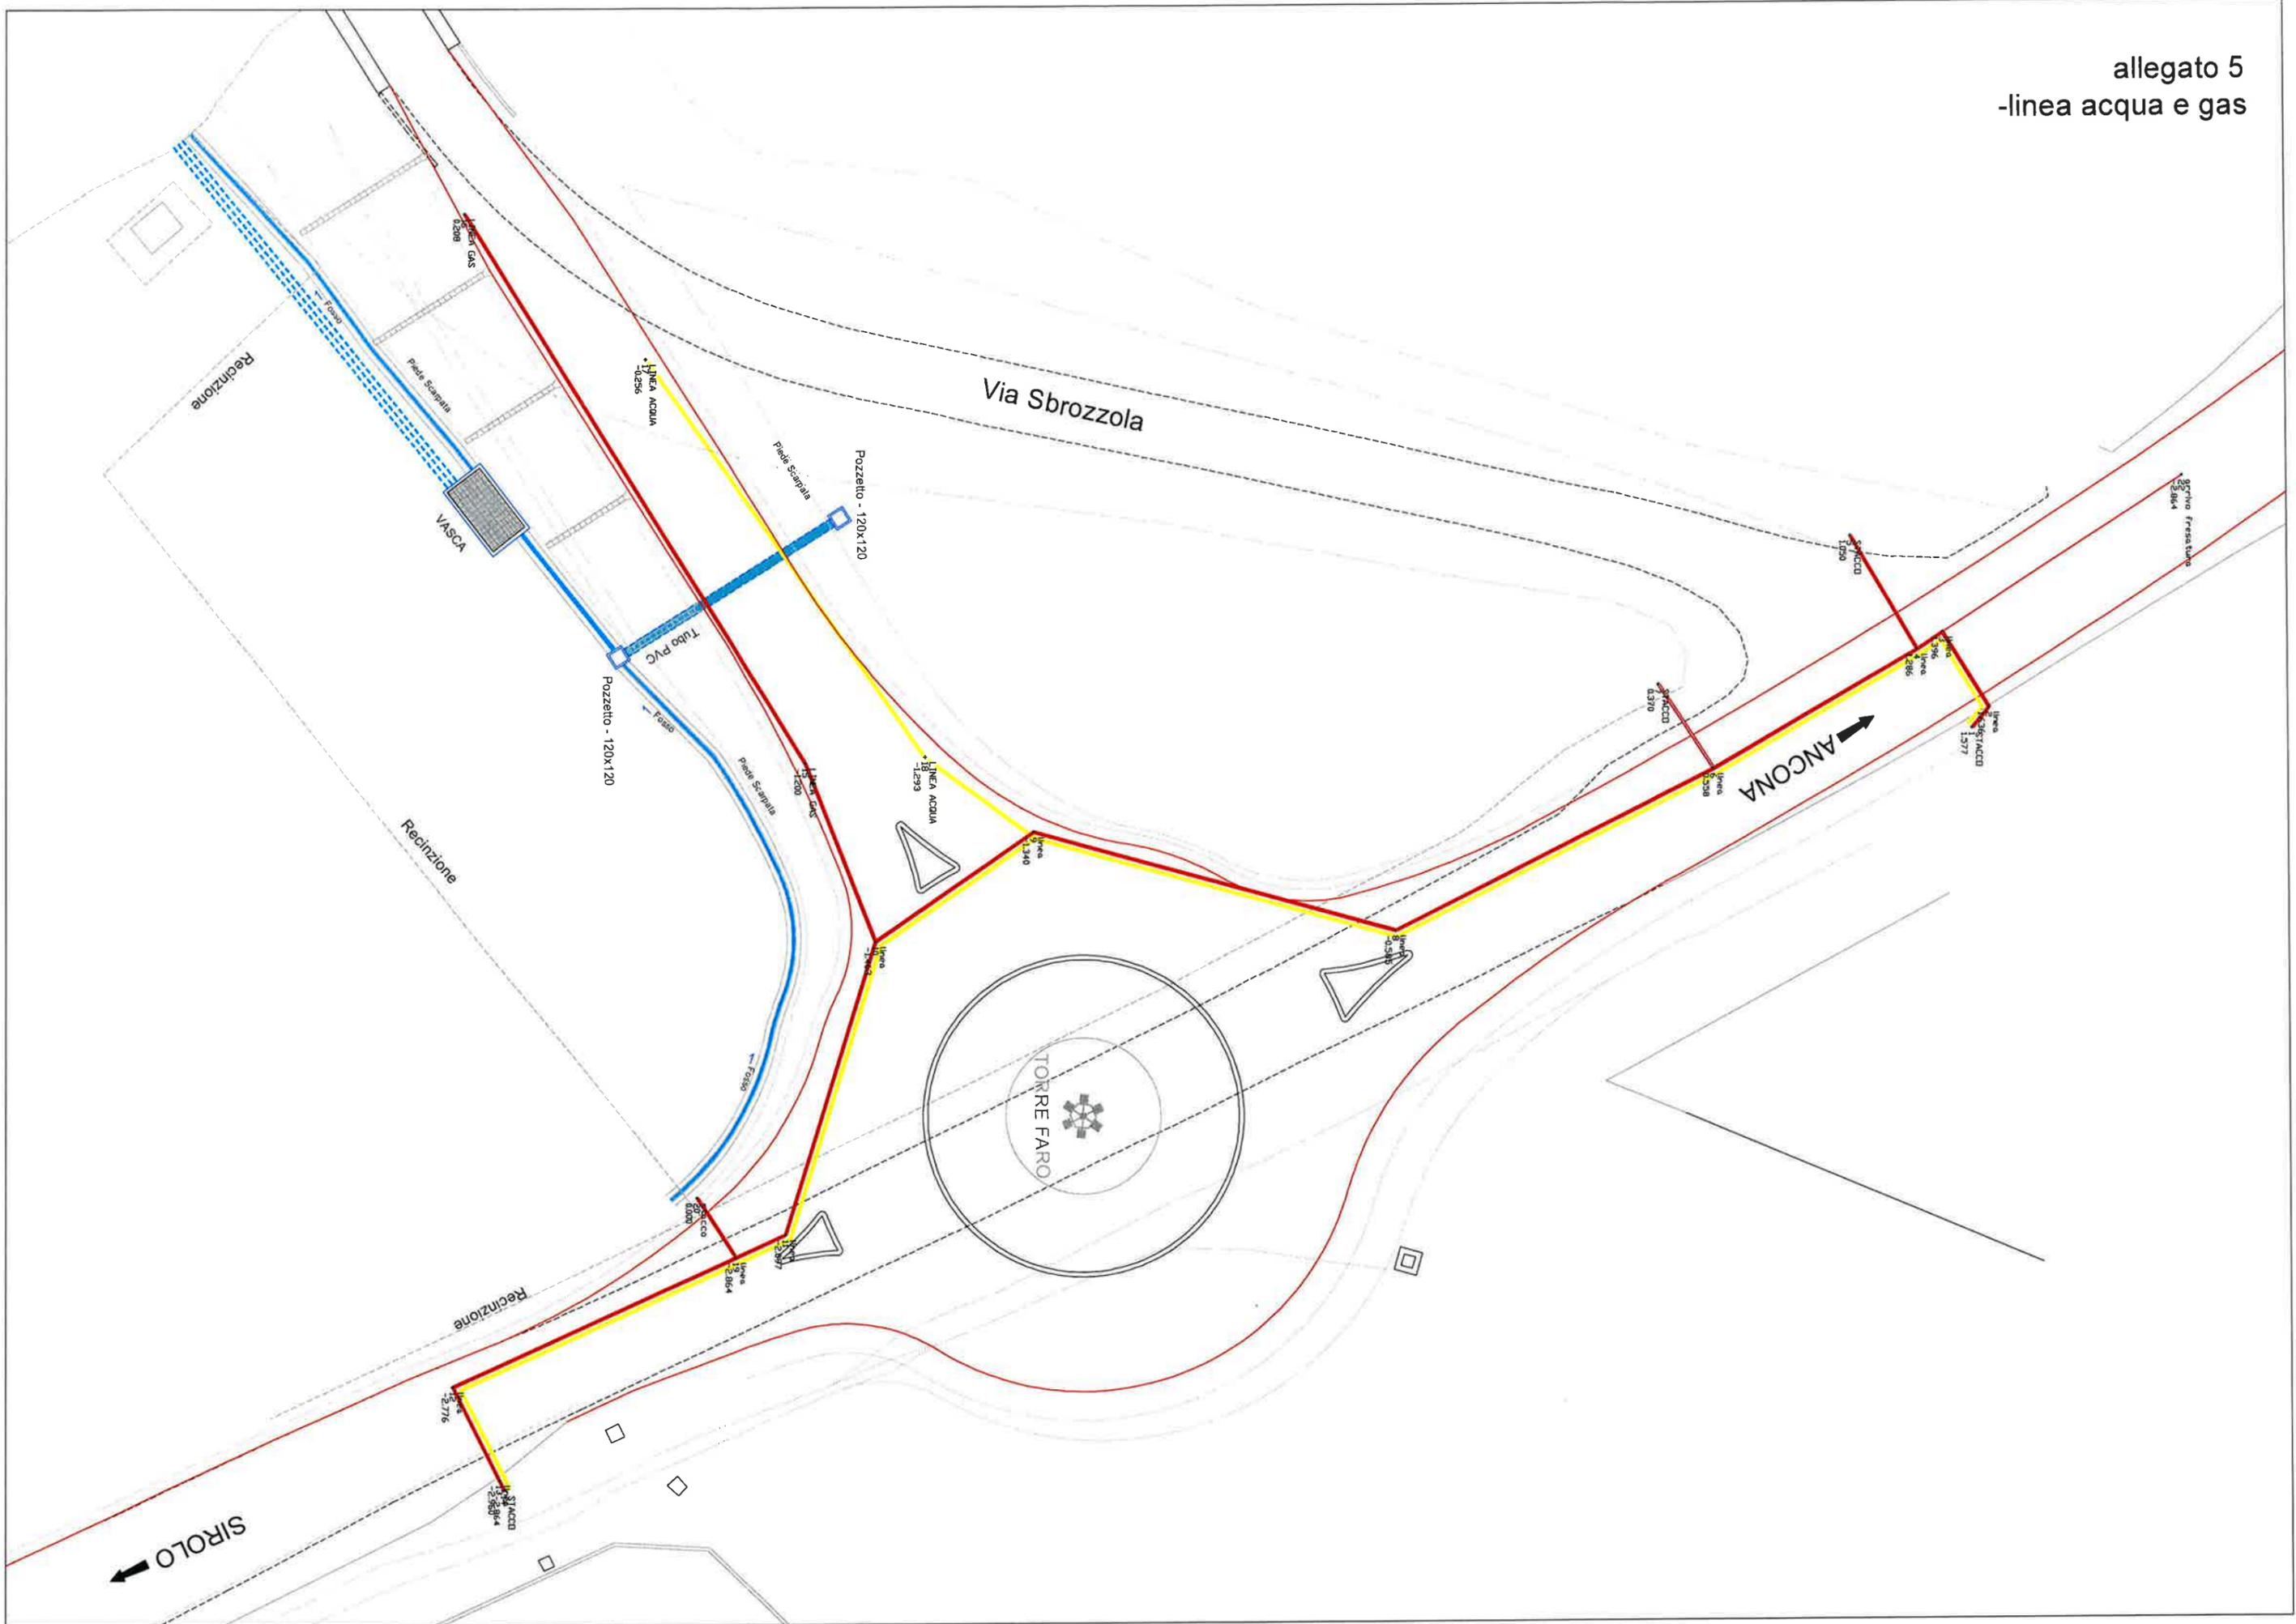

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

21/05/2024

DUG 935433 /2023

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Unità Locale



Strada Provinciale Staffolo Jesi, 1/3  
60030 MONTE ROBERTO (AN)  
Cod. Fisc. e P.IVA 02598590426

Cod. fisc.

N. Aut./Albo

del

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

SAVI ENRICO

Luogo di Destinazione

LOC. TA' BELLALUCE SNC LORETO (AN)

Cod. fisc.

SUANDCF3806FR52Y

N. Autorizz. / Albo

AVA N° 9278

del

20/04/21

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale



Strada Provinciale Staffolo Jesi, 1/3  
60030 MONTE ROBERTO (AN)  
Cod. Fisc. e P.IVA 02598590426

Indirizzo

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

AN09860

del

07/03/19

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

di CAMERANO VIA S. ROZZOLA

## ANNOTAZIONI

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CROSTE CATRAME

CODICE del RIFIUTO(\*)

CER 17-03-02

STATO FISICO

1 2 3 4

SOLIDO N.P.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NESSUNO

N. COLLI/CONTENITORI

01

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

## 6 QUANTITÀ

Kg.

Litri

20000

P. lordo

Tara

15400

Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

Eco Costruzioni

Marasca Simone

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

4N80SAS

Targa rimorchio

Cognome e Nome

Conducente

MARASCA SIMONE

Data e Ora Inizio trasporto

21/05/2024 09:15

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero

Accettato per la seguente quantità:

Kg.

Litri

21880

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

21/05/2024

Ora

10:08

Firma del Destinatario

SAVI ENRICO  
Via San Firmano, 49  
62010 Montelupone (MC)  
C.F. SVA N° 33506 F552Y  
P. IVA 00328470430

MODELLO CONFORME  
QUINTA SEZIONE  
GRUPPO BIFFETTI S.p.A. Via Filippo Casco, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2009/71206 del 9/11/2009

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

21/05/2024

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale



Unità Locale

Strada Provinciale Staffolo Jesi, 1/3  
60030 MONTE ROBERTO (AN)  
Cod. Fisc. e P.IVA 02598590426

Cod. fisc.

N. Aut./Albo

del

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

SAVI ENRICO

Luogo di Destinazione

LOC. TA' BELLALUCE SNC LORETO (AN)

Cod. fisc.

SVA NRC 53506 F552Y

N. Autorizz. / Albo

AVAN° 9778

del

20/04/21

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale



Indirizzo

Strada Provinciale Staffolo Jesi, 1/3  
60030 MONTE ROBERTO (AN)  
Cod. Fisc. e P.IVA 02598590426

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

AN09860

del

07/03/19

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

di CAMERANO VIA SBROZZOLA

## ANNOTAZIONI

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CROSTE CATRAME

CODICE del RIFIUTO(\*)

CER 17.03.02

STATO FISICO

1 2 3 4

S.N.P.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NESSUNO

N. COLLI/CONTENITORI

01

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

## 6 QUANTITÀ

Kg.

Litri

70000

P. lordo

Tara

15400

Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

Eco Costruzioni

Marasca Simone

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

GN805AS

Targa rimorchio

Cognome e Nome

Conducente

MARASCA SIMONE

Data e Ora Inizio trasporto

21/05/2024

10:50

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero

Accettato per la seguente quantità:

Kg.

Litri

23800

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

21/05/2024

Ora

11:25

Firma del Destinatario

SAVI ENRICO  
Via San Firmano 49  
62010 Montelupone (MC)  
C.F. SVA NRC 53506 F552Y  
P. IVA 00328470430



# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
 D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
 Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
 D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

21/05/2024

/2023  
DUG 935435

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Unità Locale



**Strada Provinciale Staffolo Jesi, 1/3  
 60030 MONTE ROBERTO (AN)  
 Cod. Fisc. e P.IVA 02598590426**

Cod. fisc.

N. Aut./Albo

del

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

SAUL ENRICO

Luogo di Destinazione

LOC. TA' BELLALUCE SNC LORETO (AN)

Cod. fisc.

SVA NRC 53506 F552Y

N. Autorizz. / Albo

AVAN 9778

del

2004/21

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo



**Strada Provinciale Staffolo Jesi, 1/3  
 60030 MONTE ROBERTO (AN)  
 Cod. Fisc. e P.IVA 02598590426**

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

AN09860

del

17/03/19

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

di CATERANO VIA SBROZZOLA

## ANNOTAZIONI

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CROSTE ASFALTO

CODICE del RIFIUTO(\*)

CER 17 03 02

STATO FISICO

1  2  3  4

S.N.P.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NESSUNO

N. COLLI/CONTENITORI

01

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

## 6 QUANTITÀ

Kg.

Litri

20000

P. lordo

Tara

15400

Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

Eco Costruzioni

Moroni Simoni

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

AN805AS

Targa rimorchio

Cognome e Nome

Conducente

MARASCA SIMONE

Data e Ora Inizio trasporto

21/05/2024 13:00

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero

Accettato per la seguente quantità:

Kg.

Litri

82460

Respianto per le seguenti motivazioni:

Data

21/05/2024 Ora 13:53

Firma del Destinatario

**SAVI ENRICO**  
 Via San Firmiano, 49  
 62010 Montelupone (MC)  
 C.F. SVA NRC 53506 F552Y  
 P. IVA 00328470430



# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

21/05/2024

DUG 935436 /2023

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Unità Locale

**eco costruzioni srl**  
Strada Provinciale Staffolo Jesi, 1/3  
60030 MONTE ROBERTO (AN)  
Cod. Fisc. e P.IVA 02598590426

Cod. fisc.

N. Aut./Albo

del

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

SAVI ENRICO

Luogo di Destinazione

LOC. TA' BELLALUCE SNC LORETO (AN)

Cod. fisc.

SUA NRC 53506 F552Y

N. Autorizz. / Albo

AVAN° 9778

del

20/04/21

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo

**eco costruzioni srl**  
Strada Provinciale Staffolo Jesi, 1/3  
60030 MONTE ROBERTO (AN)  
Cod. Fisc. e P.IVA 02598590426

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

AN09860

del

17/03/19

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

di CAMERANO VIA SBROZZOLA

## ANNOTAZIONI

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CROSTE ASFALTO

CODICE DEL RIFIUTO(\*)

CER 17.03.02

STATO FISICO

1 2 3 4

S.N.P.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NESSUNO

N. COLLI/CONTENITORI

01

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

## 6 QUANTITÀ

Kg.

Litri

2000

P. lordo

Tara 15400

Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

eco costruzioni

FIRMA DEL TRASPORTATORE

Marasca Simone

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

GN805AS

Targa rimorchio

Cognome e Nome

Conducente

MARASCA SIMONE

Data e Ora Inizio trasporto

21/05/2024

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero

Accettato per la seguente quantità:

Respinto per le seguenti motivazioni:

Kg.

Litri

25180

Data

21/05/2024

Ora

1516

Firma del Destinatario

**SAVI ENRICO**  
Via San Firmano, 49  
62010 Montalupone (MC)  
C.F. SVA NRC 53506 F552Y  
P. IVA 00328470430



MODELLO CONFORME VIDIMAZIONE QUINTA SEZIONE QUARTA SEZIONE TERZA SEZIONE SECONDA SEZIONE PRIMA SEZIONE Gruppo Buffetti S.p.A. Via Filippo Caruso, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Autorizz. Agenzia delle Entrate n. 2009/71206 del 9/11/2009

(\*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2014/955/UE (GIUE del 30 dicembre 2014) - Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

# FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e s.m.i.)  
 D.M. del 1° aprile 1998, n. 145  
 Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002  
 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 193 e succ. integr.  
 D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

21/05/2024

/2023  
DUG 935437

## 1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale



Unità Locale

Strada Provinciale Staffolo Jesi, 1/3  
 60030 MONTE ROBERTO (AN)  
 Cod. Fisc. e P.IVA 02598590426

Cod. fisc.

N. Aut./Albo

del

## 2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

SAVI ENRICO

Luogo di Destinazione

LOC. TA' BELLALUCE SNC LORETO (AN)

Cod. fisc.

S.V.A.N.R.C.5.3.S.06.F.552.Y

N. Autorizz. / Albo

AVAN° 9778

del

20/04/21

## 3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale



Indirizzo

Strada Provinciale Staffolo Jesi, 1/3  
 60030 MONTE ROBERTO (AN)  
 Cod. Fisc. e P.IVA 02598590426

Cod. fisc.

N. Autorizz. / Albo

AN09860

del

17/03/19

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

di CAMERANO VIA SBROZZOLA

## ANNOTAZIONI

## 4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CROSTE ASFALTO

CODICE del RIFIUTO(\*)

CER / 17.03.02

STATO FISICO

1 2 3 4

S.N.P.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

NESSUNO

N. COLLI/CONTENITORI

01

## 5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero  Smaltimento

R13

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

## 6 QUANTITÀ

Kg.

Litri

20000

P. lordo

Tara 15400

Peso da verificarsi a destino

## 7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

## 8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI

NO

## 9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE

FIRMA DEL TRASPORTATORE

Eco Costruzioni

Maraxia Simone

## 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo

CN805AS

Targa rimorchio

Cognome e Nome

Conducente

MARAXIA SIMONE

Data e Ora Inizio trasporto

21/05/2024

## 11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato:

Accettato per intero

Accettato per la seguente quantità:

Kg.

Litri

25660

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data

21/05/2024

Ora

1645

Firma del Destinatario


**SAVI ENRICO**  
 Via San Firmano, 49  
 62010 Montelupone (MC)  
 S.V.A.N.R.C.5.3.S.06.F.552.Y  
 P. IVA 00328470430



PRIMA SEZIONE  
 GRUPPO BUFFETTI S.p.A. Via Filippo Caruso, 23 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, loc. S. Palomba, Via dei Tamarindi, 48 - Aut. n. 2009/71206 del 9/11/2009  
 SECONDA SEZIONE  
 TERZA SEZIONE  
 QUARTA SEZIONE  
 QUINTA SEZIONE  
 MODELLO CONFORME  
 16581030F (a)  
 VIOMAZIONE

(\*) Dal primo giugno 2015 si applica il Nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti contenuto nella Decisione 2014/955/UE (GUUE del 30 dicembre 2014) - Ai sensi dell'art. 15, secondo comma della D.Lgs. n. 22/97, le copie devono essere conservate per 5 anni.

- linea Oper Fiber
- linea Fibra Telecom

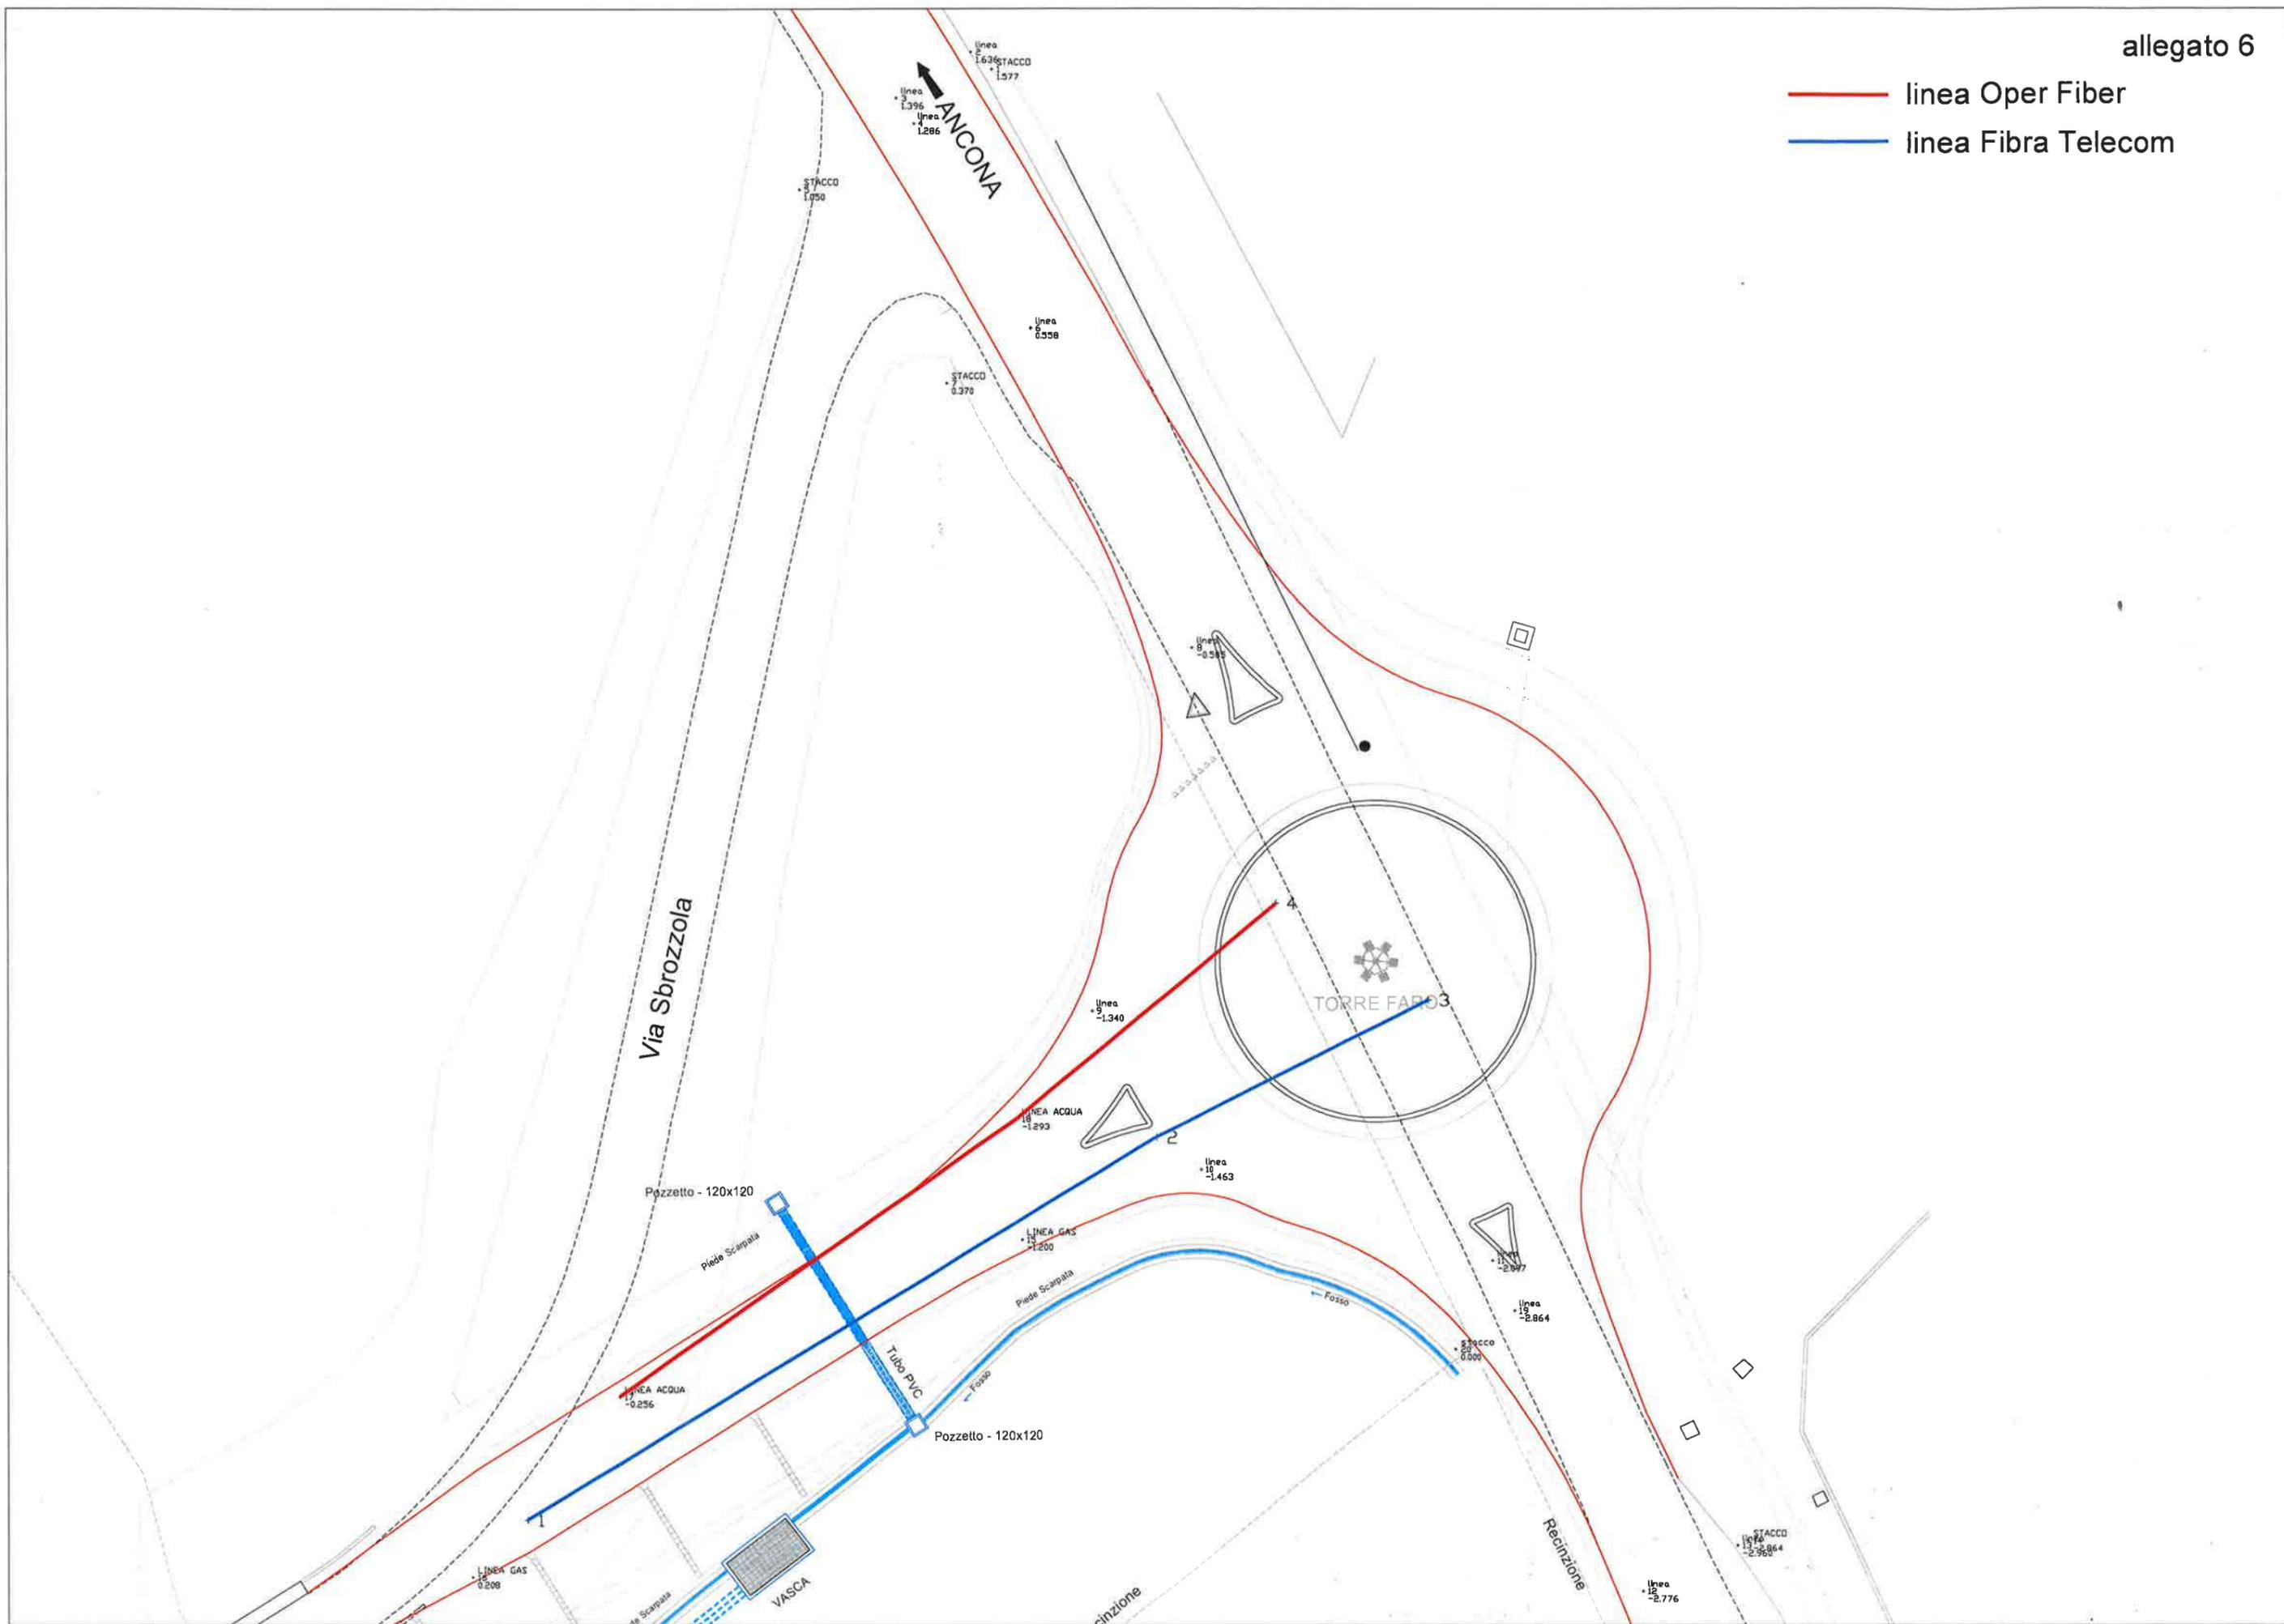

**FUTURA**  
**CONGLOMERATI S.r.l.**  
 unipersonale

Spett.

EDIL BENINCASA S.R.L.  
 VIA DELL'ECOLOGIA N. 28  
 87064 CORIGLIANO ROSSANO

CS

Destinazione documento

Numero documento	Data docum.	Pag.
59	29-02-2024	1

Tipo documento	Cod.cii/for	Partita iva	Pagamento	Maga
FATTURA	373	IT 02905640781	50 BONIFICO BANCARIO 60 GG. F.M.	00
Banca	Abi	Cab	Iban	Valuta
Unicredit - Fil. Osimo			IT45E0200837497000106092007	Euro

Codice Articolo	Descrizione	Um	Q.ta	Prezzo	Sconto	Totale	C.iv
RIF. DDT N.	291/ Del:15-02-2024						
	TAPPETO 0 - 12	TN		9,02			22
RIF. DDT N.	357/ Del:23-02-2024						
	BINDER CHIUSO 0 - 20	TN		19,04			22

CIG 9502965EC9  
 CUP H17B20000560002

COPIA CONFORME AL DOCUMENTO  
 INFORMATICO TRASMESSO ALLO SDI

TAPPETO  
 BINDER

9,02  
 19,04

**FUTURA CONGLOMERATI srl**  
S.P. 571 REGINA Km 3 + 00  
Località Molino Gatti, 4  
62018 POTENZA PICENA (MC)  
P.I. e C.F. 04939660429

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

(D.d.t.) D. PR. 472 del 14.08.1996 D. PR. 696 del 21.12.1996

N. 357 del 23/02/2004

a mezzo:  
 vettore  cedente  cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA

ESPOSIZIONE SRL

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONE

SPAZIO STROLO-SERIBOLLA

VIA DELL'ECOLOGIA

AL KM 8+380 STR COM

COGILIANO CAIABRO (CS)

VIA DELLA SERRATA CAIABRO

CAUSALE DEL TRASPORTO

VENDITA

VL. ORD. N. DEL  in conto  a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (1)
<u>T. 1904</u>	<u>BINDER CHIUSO 0/20</u>	<u>7,847</u>

**- CE**  
**- 22**  
**BINDER CHIUSO 0/20**  
**AC 14 BIN 70/100**  
**UNI EN 13108-1**  
**0474CPR0803**

CIG B502865 ECB

CUP H71B2000560002

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>SECCO</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
--	----------	---------	-------	----------

VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo	<input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario	DATA <u>23/02/2004</u>	ORA <u>15.25</u>	FIRMA DEL CONCESSIONE <i>Calder</i>
ANNOTAZIONI - IMPIAZZATI		NUMERO PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIONARIO <i>Calder</i>

**FUTURA CONGLOMERATI srl**  
 S.P. 571 REGINA Km 3 + 00  
 Località Molino Gatti, 4  
 62018 POTENZA PICENA (MC)  
 P.I. e C.F. 01833860438

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 D.P.R. 696 del 21.12.1995

N. 291 del 15/02/2014

a mezzo:  
 vettore  cedente  cessionario

ESPORTATORE (Ditta, Indirizzo, Numero e Numero) - Porto di  
**EDILBENINARA srl**  
 Via DELL'ECOLOGIA 28  
 GALLURU (CABRIO) P. IVA 02903640781  
 CAUSALE DEL TRASPORTO: Vendita

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del traslocatore e VARAZIONE)  
 SP 2  
 MARCO DENIGLIANO 1 1984  
 75M CANT. VIA BELLA 390  
 18702016  
 in conto  
 a saldo

**QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO**

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
Tn 9,02	TAPPETO 0/12	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>-CE</b> <b>-22</b> TAPPETO 0/12 AC 10 SURF 70/100 UNI EN 13108-1 0474CPR0803</p> </div>	1.180,9
	Gc 9502965E CP	
	CP 114 B2 000006 0002	

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <i>Scus</i>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	<b>TOTALE €</b>
---	----------	---------	-------	-----------------

**VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza** **DATA E ORA DEL RITIRO** **FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo <input checked="" type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario	DATA 15/02/2014	ORA 10:49	FIRMA DEL CONSTATANTE
ANNOTAZIONE - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL CESSIARIO

# FUTURA

## CONGLOMERATI S.r.l.

unipersonale

Spett.  
 EDIL BENINCASA S.R.L.  
 VIA DELL'ECOLOGIA N. 28  
 87064 CORIGLIANO ROSSANO  
 Destinazione documento

CS

Numero documento	Data docum.	Pag.
190	31-05-2024	1

Tipo documento	Cod.cli/for	Partita iva	Pagamento	Maga
FATTURA	373	IT 02905640781	70 BONIFICO BANCARIO	00
Banca		Abi Cab Iban	Valuta	
Unicredit - Fil. Osimo		IT45E0200837497000106092007	Euro	

Codice Articolo	Descrizione	Um	Q.ta	Prezzo	Sconto	Totale	C.iv
RIF. DDT N.	1042/ Del:28-05-2024 BASE	TN		27,14			22
RIF. DDT N.	1043/ Del:28-05-2024 BASE	TN		21,12			22
RIF. DDT N.	1044/ Del:28-05-2024 BASE	TN		27,08			22
RIF. DDT N.	1046/ Del:28-05-2024 BASE	TN		27,04			22
RIF. DDT N.	1048/ Del:28-05-2024 BASE	TN		33,38			22
RIF. DDT N.	1049/ Del:28-05-2024 BASE	TN		31,64			22
RIF. DDT N.	1050/ Del:28-05-2024 BASE	TN		26,44			22
RIF. DDT N.	1051/ Del:28-05-2024 BINDER CHIUSO 0 - 20	TN		26,98			22
RIF. DDT N.	1053/ Del:28-05-2024 BASE	TN		27,50			22
RIF. DDT N.	1054/ Del:28-05-2024 BINDER CHIUSO 0 - 20	TN		30,84			22
RIF. DDT N.	1055/ Del:28-05-2024 BINDER CHIUSO 0 - 20	TN		27,04			22
RIF. DDT N.	1056/ Del:28-05-2024 BINDER CHIUSO 0 - 20	TN		26,42			22

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese trasporto	Totale imponibile	Totale imposta
--------------	----------	-------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------

Riepiloghi IVA					Bolli
c.iva	Spese Accessorie	Imponibile	iva %	Imposta	
					<b>Totale Documento</b>
					Acconto
					Omaggio
<b>Iva ad esigibilità immediata</b>					<b>SEGUE - &gt;</b>

Scadenza rate e relativo importo					

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA  
 IMPIANTO DI PRODUZIONE  
 S.P. Regina km. 3+00 - Località Molino Gatti, 4  
 62018 Potenza Picena (MC)

Tel. : 0733 687787  
 E-mail: futuraconglomerati@libero.it  
 PEC: futuraconglomeratists@pec.it

Part.Iva - Cod.Fisc. 01833860438  
 Reg. Imprese: MC 01833860438  
 Capitale Sociale: Euro 900,00 i.v.

**FUTURA**  
**CONGLOMERATI S.r.l.**  
 unipersonale

Spett.

EDIL BENINCASA S.R.L.  
 VIA DELL'ECOLOGIA N. 28  
 87064 CORIGLIANO ROSSANO

CS

Destinazione documento

Numero documento	Data docum.	Pag. 2
190	31-05-2024	

Tipo documento	Cod.cli/for	Partita iva	Pagamento	Maga
FATTURA	373	IT 02905640781	70 BONIFICO BANCARIO	00
Banca	Abi Cab Iban			Valuta
Unicredit - Fil. Osimo	IT45E0200837497000106092007			Euro

Codice Articolo	Descrizione	Um	Q.ta	Prezzo	Sconto	Totale	C.iv
-----------------	-------------	----	------	--------	--------	--------	------

CIG 9502965EC9  
 CUP H71B20000560002  
 COPIA CONFORME AL DOCUMENTO  
 INFORMATICO TRASMESSO ALLO SDI

BASE 221,34  
 BINDER 11,28

Scadenza rate e relativo importo

31-05-2024					
32.602,45					

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA  
 IMPIANTO DI PRODUZIONE  
 S.P. Regina km. 3+00 - Località Molino Gatti, 4  
 62018 Potenza Picena (MC)

Tel. : 0733 687787  
 E-mail: futuraconglomerati@libero.it  
 PEC: futuraconglomeratils@pec.it

Part.Iva - Cod.Fisc. 01833860438  
 Reg. Imprese: MC 01833860438  
 Capitale Sociale: Euro 900,00 i.v.

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

**FUTURA CONGLOMERATI srl**  
 S.P. 571 REGINA Km 3 + 00  
 Località Molino Gatti, 4  
 62018 POTENZA PICENA (MC)  
 P.I. 03080280423

N. 1001 del 28/05/2024

a mezzo:  
 vettore  cedente  cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

Ed. Benincasa

Camporano

Via della Resistenza 28 località Benincasa

CARABE DEL TRASPORTO

in conto  
 a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO (€)
14 26,98	Binder cm 15 0/20	1.496

- CE  
- 22

BINDER CHIUSO 0/20  
 AC 14 BIN 70/100  
 UNI EN 13108-1  
 0474CPR0803

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI <u>8000</u>	N. COLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
---	---------	---------	-------	----------

VETTORE: Ditta, Domicilio e Residenza      DATA E ORA DEL RITIRO      FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo cessionario DATA 28/05/2024 ORA 11:15 FIRMA DEL CONDIZIONE

ANNOVAZIONE - VARIAZIONI      FIRMA DEL CESSIONARIO

1607CD33 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.  
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

FUTURA CONGLOMERATI SRL

ID : NUMERO :      TARGA :  
 0 423

TARA PREDET.      14800 kg  
 28-MAG-2024 11:15 BIL1

---

LORDO      41780 kg

NETTO      26980 kg

CLIENTE: Ditta, Dipendenza, Direzione e Residenza, Porto IVA

**FUTURA CONGLOMERATI srl**  
S.P.A. 571 REGINA Km 3 + 00  
Località Molino Gatti, 4  
32018 POTENZA PICENA (MC)  
P.I.C.F. 01933350438

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1995 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 1054 del 23052024

di mezzo:  
 vettore  cedente  cessionario

ESPORTATORE: Ditta, Dipendenza, Direzione e Residenza, Porto IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

Via Bell'Isola 20 - Genova, Italia

CAMPANO (AV)

CAUSALE DEL TRASPORTO

visione

VS. DIR. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
 in conto  a saldo

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
30,84	BINDER CHIUSO 0/20	1111,11
	AC 14 BIN 70/100	
	UNI EN 13108-1	
	0474CPR0803	

- CE  
- 22  
BINDER CHIUSO 0/20  
AC 14 BIN 70/100  
UNI EN 13108-1  
0474CPR0803

ASPETTO ESTERIORE DEL BENE	N. COLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
30,84				
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME
SUALDESI NUNZIO GAETANO Srl Via E. de Amicis, 122 62030 BOLMURANO (MC) P.I.C.F. 01933350438		20250214/1303		[Firma]
Consegna e inizio trasporto a mezzo	cedente / cessionario	DATA	ORA	FIRMA DEL CONDOTTOR
				[Firma]
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI	NUMERO PROGRESSIVO		FIRMA DEL DEPOSITARIO	

1607CD33 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.  
(2) A sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

**FUTURA CONGLOMERATI SRL**

ID : NUMERO : TARGA :  
0 425

TARA PREDET. 15300 Kg  
28-MAG-2024 13:08 BILL1  
LORDO 46140 Kg  
NETTO 30840 Kg

**FUTURA CONGLOMERATI srl**  
S.P. 571 REGINA Km 3 + 00  
Località Molino Gatti, 4  
62018 POTENZA PICENA (MC)  
P.I. e C.F. 01933850438

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.04.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 1055 del 28/05/2024

a mezzo:  
 vettore  cedente  cessionario

CESSIONARIO: Data, Dedenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) e VARIAZIONE

Colmurano MC  
via della Madonna - 78  
Futura Conglomerati Potenza

Colmurano MC

CAUSALE DEL TRASPORTO

INCONTRO IN  
MATERIA DI  
VE. DDT N. DEL  in conto  
 a saldo

ve-dita

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
1	Binder chiuso 0/20 AC 14 BIN 70/100 UNI EN 13108-1 0474CPR0803	1

**- CE**  
**- 22**  
BINDER CHIUSO 0/20  
AC 14 BIN 70/100  
UNI EN 13108-1  
0474CPR0803

ASPECTO ESTERNO DEL BOM	N. COLLI	RESO PG.	PORTE	TOTALE €
SFUSO				
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza		DATA E ORA DEL RITIRO		FIRME

**GUALDESI NUNZIO GAETANO Srl**  
Viale E. de Amicis, 122  
62020 COLMURANO (MC)  
P. IVA 01933850438  
Tel. 0733/508135 Fax 0733/508135  
Albo Trasportatori MC 6453789/K  
COLLA N° REA MC - 103055

28/05/2024 13:32  
FIRMA DEL CONSIGLIARIO  
FIRMA DEL CESSIONARIO

1807CD33 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.  
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

**FUTURA CONGLOMERATI SRL**

ID : NUMERO : TARGA :

0 426

TARA PREDET. 15200 Kg

28-MAG-2024 13:32 BILL1

LORDO 42240 Kg

NETTO 27040 Kg

CEDENTE: Ditta, Dipendente, Domus o Residenza, Partita IVA

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

**FUTURA CONGLOMERATI srl**  
S.P. 571 REGINA Km 3 + 00  
Località Molino Gatti, 4  
62018 POTENZA PICENA (MC)  
P.I. 0471550236

N. 056 del 28/05/2024

a mezzo:  
 vettore  cedente  cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendente, Domus o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONE

DESCRIZIONE CASA SRL  
VIA DELL'EROSOGA n. 28

03020 CAMERANO

CALISLE DEL TRASPORTO

VS. OPC. N. DEL  in conto  a saldo

VEDUTA

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
<u>276,42</u>	<u>BINDER chiuso d/p</u>	<u>5000,5460</u>

**-CE**  
**-22**  
BINDER CHIUSO 0/20  
AC 14 BIN 70/100  
UNI EN 13108-1  
0474CPR0803

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <u>Sr-Sr</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio e Residenza				FIRME
DATA E ORA DEL RITIRO				

Consegna o inizio trasporto a mezzo  
Cedente / Cessionario: 28/05/2024

1607CD33 (a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.  
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

**FUTURA CONGLOMERATI SRL**

ID: NUMERO: **0 427** TARGA:

TARA PREDET. **14800 kg**

28-MAG-2024 14:03 BILL1

LORDO **41220 kg**

NETTO **26420 kg**

# FUTURA

## CONGLOMERATI S.r.l.

unipersonale

Spett.  
 EDIL BENINCASA S.R.L.  
 VIA DELL'ECOLOGIA N. 28  
 87064 CORIGLIANO ROSSANO  
 Destinazione documento

CS

Numero documento	Data docum.	Pag.
156	30-04-2024	1

Tipo documento	Cod.cli/for	Partita iva	Pagamento	Maga
FATTURA	373	IT 02905640781	70 BONIFICO BANCARIO	00
Banca	Abi	Cab	Iban	Valuta
Unicredit - Fil. Osimo			IT45E0200837497000106092007	Euro

Codice Articolo	Descrizione	Um	Q.ta	Prezzo	Sconto	Totale	C.iv
RIF. DDT N.	718/ Del:15-04-2024						
	BASE	TN		27,34			22
RIF. DDT N.	720/ Del:15-04-2024						
	BASE	TN		27,32			22
RIF. DDT N.	721/ Del:15-04-2024						
	BASE	TN		27,56			22
RIF. DDT N.	722/ Del:15-04-2024						
	BASE	TN		27,32			22
RIF. DDT N.	723/ Del:15-04-2024						
	BASE	TN		27,44			22
RIF. DDT N.	725/ Del:15-04-2024						
	BASE	TN		27,40			22
RIF. DDT N.	726/ Del:15-04-2024						
	BASE	TN		27,50			22
RIF. DDT N.	727/ Del:15-04-2024						
	BASE	TN		27,54			22
RIF. DDT N.	728/ Del:15-04-2024						
	BASE	TN		27,42			22
RIF. DDT N.	731/ Del:15-04-2024						
	BINDER CHIUSO 0 - 20	TN		27,32			22
RIF. DDT N.	733/ Del:15-04-2024						
	BINDER CHIUSO 0 - 20	TN		27,44			22
RIF. DDT N.	734/ Del:15-04-2024						
	BINDER CHIUSO 0 - 20	TN		27,32			22
RIF. DDT N.	735/ Del:15-04-2024						

Totale Merce	Sconto %	Netto Merce	Spese Varie	Spese trasporto	Totale imponibile	Totale imposta
--------------	----------	-------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------

Riepiloghi IVA					Bolli
c.iva	Spese Accessorie	Imponibile	iva %	Imposta	
					<b>Totale Documento</b>
					Acconto
					Omaggio
<b>Iva ad esigibilità immediata</b>					<b>SEGUE - &gt;</b>

Scadenza rate e relativo importo				

**FUTURA**  
**CONGLOMERATI S.r.l.**  
 unipersonale

Spett.  
 EDIL BENINCASA S.R.L.  
 VIA DELL'ECOLOGIA N. 28  
 87064 CORIGLIANO ROSSANO  
 Destinazione documento

CS

Numero documento	Data docum.	Pag.	2
156	30-04-2024		

Tipo documento	Cod.cli/for	Partita iva	Pagamento	Maga
FATTURA	373	IT 02905640781	70 BONIFICO BANCARIO	00
Banca	Abi Cab Iban			Valuta
Unicredit - Fil. Osimo	IT45E0200837497000106092007			Euro

Codice Articolo	Descrizione	Um	Q.ta	Prezzo	Sconto	Totale	C.iv
	BINDER CHIUSO 0 - 20	TN	27,24				22
RIF. DDT N.	737/ Del:16-04-2024						
	BINDER CHIUSO 0 - 20	TN	27,34				22
RIF. DDT N.	738/ Del:16-04-2024						
	TAPPETO 0 - 12	TN	5,40				22
	BINDER CHIUSO 0 - 20	TN	15,22				22
	CIG 9502965EC9						
	CUP H71B20000560002						
	COPIA CONFORME AL DOCUMENTO						
	INFORMATICO TRASMESSO ALLO SDI						

BASE 246,84  
 BINDER 151,88  
 TAPPETO 5,40

SPED. in abb. postale - autorizz. a. Prov. di Potenza - 7000/04

### DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) - (D.P.R. 472 del 11.01.1995 - D.P.R. 696 del 21.12.1995)

**FUTURA CONGLOMERATI srl**  
S.P.: 571 REGINA Km 3 + 00  
Località Molino Gatti, 4  
62018 POTENZA PICENA (MC)  
P.I. e C.F. 01822860428

N. 731 del 150424/26

a mezzo:  vettore  cedente  cessionario

ESCIENTE: Via Anemone, 2 - Potenza, Potenza (PZ)

LUOGO DI DESTINAZIONE (per diversi indirizzi del destinatario e VARIAZIONI)

Edil Biondi srl  
Via dell'Industria 20 - Capurso (BA)  
PAZI 02405640721

CAPURSO (BA)

ORDINE DEL TRASPORTE

VS. ORD. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  in conto  a saldo

**QUANTITA'      DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)      IMPORTO**

TN 27,32      BINDER CHIUSO 0/20

**- CE**  
**- 22**  
BINDER CHIUSO 0/20  
AC 14 BIN 70/100  
UNI EN 13108-1  
0474CPR0803

1.176,00

CA 9502965ECP  
CA H 7132 0000 56 0000

ASPECTO ESTERNO DEI BENI: STUO      N. COLLI: \_\_\_\_\_      PESO KG: \_\_\_\_\_      PORTO: \_\_\_\_\_      TOTALE €: \_\_\_\_\_

**VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza      DATA E ORA DEL RITIRO      FIRME**

APP. TASCONE srl  
Via Cavour 33

150424/1401

FUGLIANO (AV)  
Consegna o inizio trasporto a mezzo  cedente  cessionario

VALUTAZIONE VARIAZIONI      NUMERO PROGRESSIVO

SENTE PER INFORMAZIONI TELEFONATE AL NUMERO VERDE

**FUTURA CONGLOMERATI srl**  
S.P. 571 REGINA Km 3 + 00  
Località Molino Gatti, 4  
62018 POTENZA PICENA (MC)  
P.I. 02995640781

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1998 D.P.R. 496 del 21.12.1998

N. **733** del **15/04/2024**

a mezzo:  
 vettore  cedente  cessionario

ESONERATO DALLA RESPONSABILITÀ DI DANNO PER PERDITA

Edil Beninuda del  
Via dell'Industria 28 - Grotte (MC)  
P.I. 02995640781

LUOGO DI DESTINAZIONE (in diversi dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

Comarone

ALSAE (PER TRASPORTO)

Verona

VS ORD. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ in conto a saldo

**QUANTITÀ** **DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)** **IMPORTO**

TA 27,44 Binder chiuso 0/20

- CE  
- 22  
BINDER CHIUSO 0/20  
AC 14 BIN 70/100  
UNI EN 13108-1  
0474CPR0803

T. 144C

CIG 95029652C9  
CUP H71B2000560002

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: **Sono** N. COPIE \_\_\_\_\_ PESO KG \_\_\_\_\_ PARTI \_\_\_\_\_ **TOTALE €** \_\_\_\_\_

**VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza** **DATA E ORA DEL RITIRO** **FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo  cedente  cessionario DATA: **15/04/2024** ORA: **15:04**

INNOVAZIONI - VARIAZIONI

EDIZIONE TRIENNALE (art. 10, comma 1, lett. a) del D.L. n. 112 del 30.06.1998

### DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) 15 PR. 1/2 del 14.08.1996 15 PR. 896 del 21.12.1998

**FUTURA CONGLOMERATI srl**  
S.P. 571 REGINA Km 3 + 00  
Località Molino Gatti, 4  
62018 POTENZA PICENA (MC)  
P.I. e C.F. 01832860438

N. 734 del 150424

a mezzo:  vettore  cedente  cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE (in diversi dall'indirizzo del mittente) E CARAZIONE

ESSE BENINASSI SRL  
Via dell'Industria 28 - Gubbio  
PIVA 0290640781

Cassino PA)  
Bassano (VI)

USATE SOLO PER:

Venduto

VS. ORD. N. \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ in conto a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
<u>TA 24,32</u>	<u>Binder unico colto</u>	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>-CE -22 BINDER CHIUSO 0/20 AC 14 BIN 70/100 UNI EN 13108-1 0474CPR0803</p> </div>	<u>T. 118,0</u>
	<u>CA 9502965FCY</u>	
	<u>CA 9502965FCY</u>	

VELETTI ESISTENTE DEI BENI <u>Stato</u>	N. COLLI	PESO KG	PORTO	TOTALE €
VETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza <u>ESSE BENINASSI SRL</u>		DATA E ORA DEL RITIRO <u>150424/1534</u>		FIRME
Consegna o inizio trasporto a mezzo <input checked="" type="checkbox"/> vettore <input type="checkbox"/> cedente <input type="checkbox"/> cessionario				
MODIFICAZIONI - VARIAZIONI		NUMERO PROGRESSIVO		

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

(D.d.t.) (L. PR. 472 del 14-08-1996 - D. PR. 696 del 21-12-1996)

**FUTURA CONGLOMERATI srl**  
S.P. 571 REGINA Km 3 + 00  
Località Molino Gatti, 4  
62018 POTENZA PICENA (MC)  
P.I. e C.F. 0122001000

N. 735 del 15/04/2004

a mezzo:  vettore  cedente  cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE (su libera scelta del cedente del cessionario) e VARIAZIONE

Edil Benincasa SRL  
Via dell'Industria 20 - Loc. Camporotondo (RN)  
P. EN 02305640481

CAMPOROTONDO (RN)

ALSAF DEL TRASPORTO  
Vendita

VS. ORA N. DEL in conto a saldo

**QUANTITA' DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità) IMPORTO**

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
Tot 23,24	BINDER CHIUSO 0/20	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           - CE - 22 BINDER CHIUSO 0/20 AC 14 BIN 70/100 UNI EN 13108-1 0474CPR0803         </div>	
	CE 95029657CP	
	CP 144 B 2,000560000	
		T. 136°C

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI: BUONO N. COLLI: PESO KG: PORTO: **TOTALE €**

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza DATA E ORA DEL RITIRO FIRME

Edil Benincasa SRL  
VIA DELL'INDUSTRIA 20  
CAMPOROTONDO  
15/04/2004  
16.01

Consegna o inizio trasporto a mezzo cedente cessionario

NUMERO PROGRESSIVO

**DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)**

**FUTURA CONGLOMERATI srl**  
 S.P. 571 REGINA Km 3 + 00  
 Località Molino Gatti, 4  
 62018 POTENZA PICENA (MC)  
 P.I. e C.F. 01832600438

N. **434** del **16/04/2014**

a mezzo:  
 vettore  cedente  cessionario

LUOGO DI ESPANSIONE (se libero dall'Autore del documento a VARIGOM)

**CAMERANO**

**Edil Baracchi snc**  
 Via San Felice 20 - Camerano  
 Brivio (V) - P.I. e C.F. 0205040781  
 Verania

QUANTITA	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
----------	---	---------

IN 24,34	Binder chiuso colore	
----------	----------------------	--

**- CE**  
**- 22**  
 BINDER CHIUSO 0/20  
 AC 14 BIN 70/100  
 UNI EN 13108-1  
 0474CPR0803

**T. 146 C**

**CIG 9302965E C9**  
**CUP H7H B2 UCCO 060002**

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PERICOLO	PORTO	TOTALE €
<b>OK</b>				

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza	DATA E ORA DEL RITIRO	FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo **cessionario** DATA **16/04/2014** ORA **16:00**

ANNOTAZIONI: VARIAZIONI

EDIZIONE 2014 - Modulo di trasporto - Standard Unico

**FUTURA CONGLOMERATI srl**  
S.P. 571 REGINA Km 3 + 00  
Località Molino Gatti, 4  
62018 POTENZA PICENA (MC)  
P.I.C.E. 01222222122

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
(D.d.t.)

OPPR 172 del 11/08/1996 - OPR 506 del 11/12/1996

N. **738** del **16/04/2024**

a mezzo:  
 vettore  cedente  cessionario

EDIC BENIGNUSO DEL  
Via DE' TORNABUONI 2B - CARRARA  
BOSSNO (CS) - P.IVA 0203640101

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

**CARRARA (CS)**

VALORE DEL TRASPORTO  
**Varia**

VS. QUOTAZIONE DEL  in conto a saldo

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
IN 5,40	TAPPETO 0/12	1.195,00
IN 15,22	BINDER CHIUSO 0/12	1.195,00

-CE  
-22  
TAPPETO 0/12  
AC 10 SURF 70/100  
UNI EN 13108-1  
0474CPR0803

-CE  
-22  
BINDER CHIUSO 0/12  
AC 14 BIN 70/100  
UNI EN 13108-1  
0474CPR0803


CIC 95029657C4  
CUA H.H.B 2000 560000

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESCO	PORTO	TOTALE €
<b>OK</b>				

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza DATA E ORA DEL RITIRO FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo  cessionario  vettore  
N. NOTAZIONI - VARIAZIONI **16024014**

— linea pubblica illuminazione

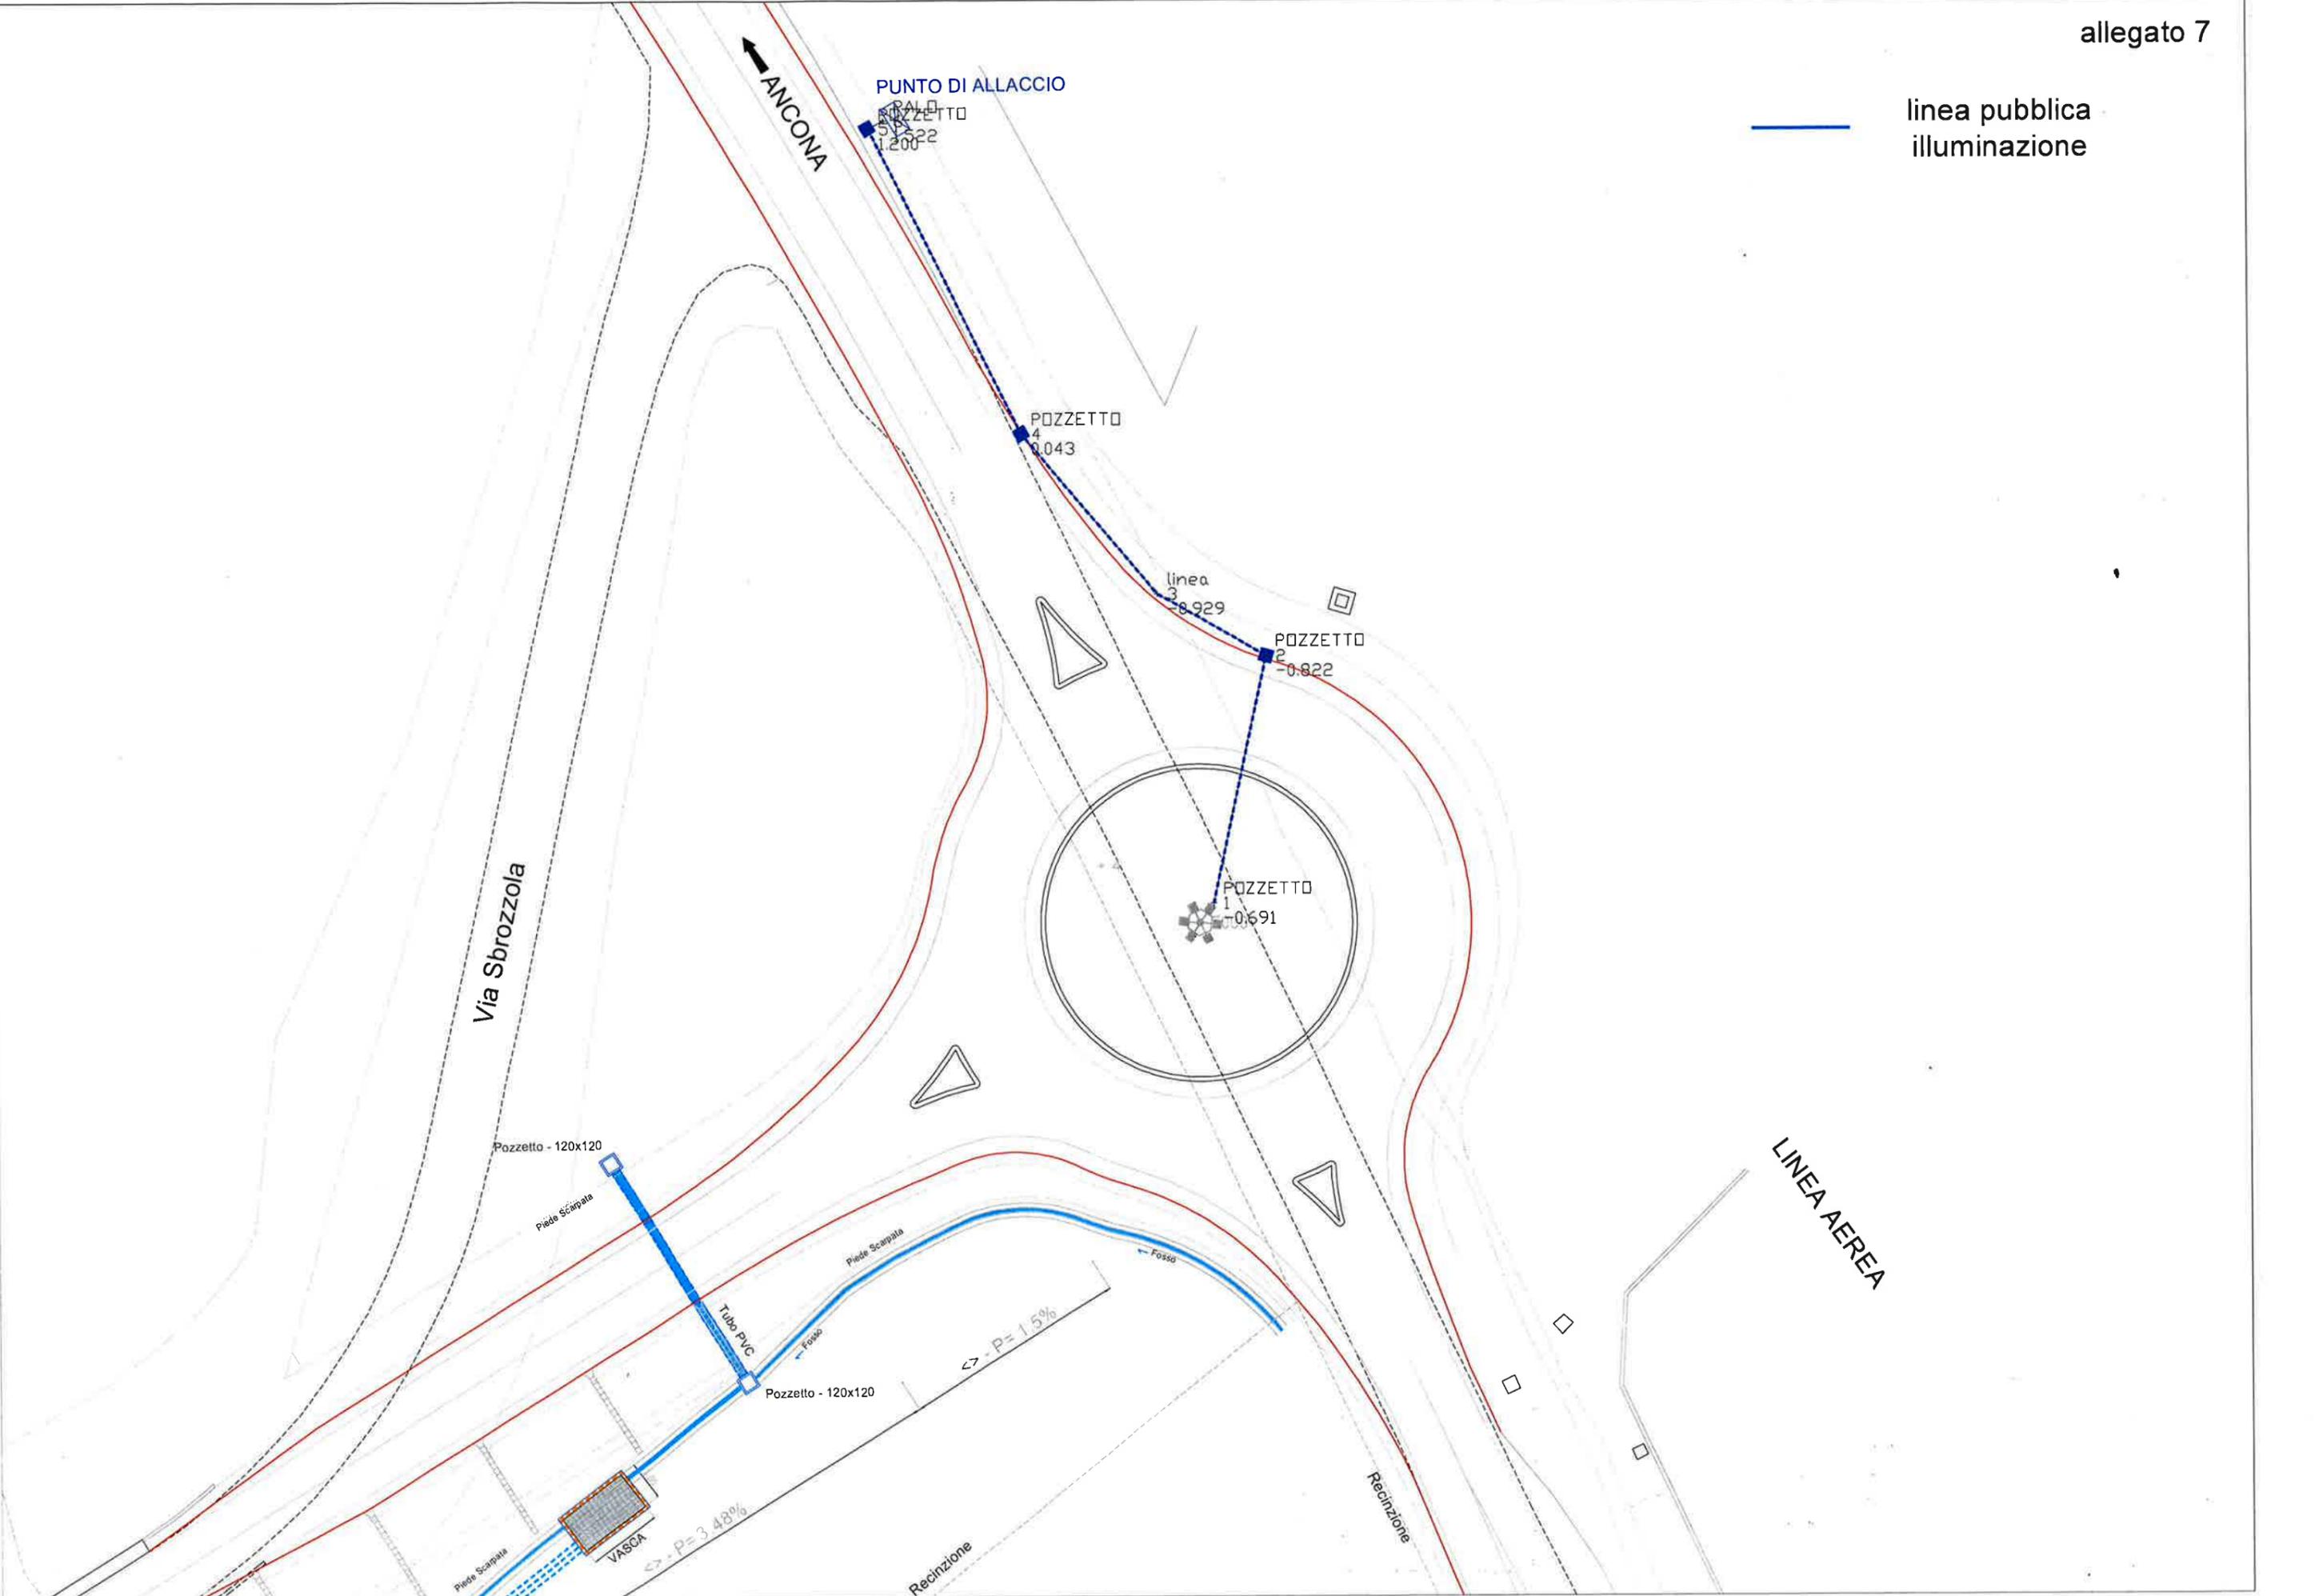

PUNTO DI ALLACCIO

POZZETTO  
5  
-0.922

POZZETTO  
4  
-0.043

linea  
3  
-0.929

POZZETTO  
2  
-0.922

POZZETTO  
1  
-0.691

Via Sbrozzola

Pozzetto - 120x120

Piede Scarpa

Piede Scarpa

Tubo PVC

Pozzetto - 120x120

P=1.5%

P=3.48%

VASCA

Recinzione

Recinzione

LINEA AEREA

ANCONA
