



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III - Area Viabilità - Gestione e Sviluppo

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE n. 2

OGGETTO: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 14+720 AL 17+650 CIRCA E SISTEMAZIONE DI TRATTI LIMITROFI. COMUNE DI OSTRA VETERE - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 92.01.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

IMPRESA: FLUMAR S.r.l.

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 4 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Stefano Belardinelli

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
8 19.13.011.00 1 10/06/2024	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 DETRAZIONE VOCE 1 LIBRETTO 1 PER ERRATA TRASCRIZIONE Vedi Allegato 1							
	fresature di attacco	-6,00	3,00	6,900	4,000		496,80	
	fresature accessi a raso e cordoli *(H/peso=(0+4)/2)		1000,00	2,000	2,000		4'000,00	
	fresature scavo abbassato dal km 17+650 al km 18+080 *(H/peso=(0+4)/2)	2,00	430,00	2,000	2,000		3'440,00	
	fresatura cordoli dal km 17+330 al km 17+650 *(H/peso=(0+4)/2)		320,00	2,000	2,000		1'280,00	
	fresature a cm 8							
	dal km 15+450 lato dx		75,00	2,500	7,000		1'312,50	
	dal km 15+520 lato sx		115,00	2,500	7,000		2'012,50	
	dal km 16+300 lato sx		120,00	2,500	7,000		2'100,00	
	dal km 16+630 lato sx		75,00	2,500	7,000		1'312,50	
	dal km 16+850 lato sx		30,00	3,500	7,000		735,00	
	dal km 16+880 lato sx		35,00	7,000	7,000		1'715,00	
	dal km 17+100 lato dx - radici		100,00	2,000	7,000		1'400,00	
	fresature accessi a raso e cordoli							
			83,00	2,000	2,000		332,00	
			355,50	2,000	2,000		1'422,00	
			50,70	4,500	4,000		912,60	
	(larg.=(4,5+2)/2)		31,60	3,250	4,500		462,15	
			15,00	2,000	2,000		60,00	
			113,00	2,000	2,000		452,00	
			22,00	2,000	2,000		88,00	
			26,00	2,000	2,000		104,00	
			6,00	2,000	2,000		24,00	
	(larg.=(10,60+7,2)/2)		18,50	8,900	4,000		658,60	
			355,50	2,000	2,000		1'422,00	
			46,00	2,000	2,000		184,00	
	FRESATURE SP 17 OSTRA VERETE-FIANCO DISTRIBUTORE							
			163,00	3,900	3,000	1'907,10		
	(larg.=(3,30+3,80)/2)		26,00	3,550	3,000	276,90		
	(larg.=(3,45+3,80)/2)		22,00	3,625	7,000	558,25		
	(larg.=(3,45+3,25)/2)		5,50	3,350	3,000	55,28		
	(larg.=(6,65+6,85)/2)		30,00	6,750	3,000	607,50		
	(larg.=(6,80+6,65)/2)		20,00	6,725	3,000	403,50		
	(larg.=(7,40+6,80)/2)		15,00	7,100	3,000	319,50		
	(larg.=(7,40+6,75)/2)		15,00	7,075	3,000	318,38		
			48,80	4,000	7,000	1'366,40		
	FRESATURE SP 17 19+250 CIRCA							
			8,70	2,500	3,000	65,25		
			6,25	2,500	3,000	46,88		
			6,00	2,500	3,000	45,00		
			6,30	2,500	3,000	47,25		
	FRESATURE SP 17 KM 15+900 PONGELLI							
			30,00	2,000	2,000	120,00		
	(larg.=(3,80+3,85)/2)		110,00	3,825	3,000	1'262,25		
			21,00	5,700	3,000	359,10		
			9,00	3,850	3,000	103,95		
	FRESATURE SP17 INCROCIO PONGELLI *(larg.=(12,90+6,75)/2)							
	(larg.=(6,75+7,05)/2)		7,50	9,825	4,000	294,75		
	(larg.=(7,05+7,40)/2)		33,50	6,900	4,000	924,60		
			24,00	7,225	4,000	693,60		
			30,00	7,300	4,000	876,00		
			256,00	2,000	2,000	1'024,00		
			178,50	2,000	2,000	714,00		
	A R I P O R T A R E						13'536,21	


Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO						13'536,21	
	FRESATURA SP17 - OSTR		113,00	2,000	2,000	452,00		
			83,00	2,000	2,000	332,00		
			22,00	2,000	2,000	88,00		
			26,00	2,000	2,000	104,00		
			6,00	2,000	2,000	24,00		
	(larg.=(7,20+10,60)/2)		18,50	8,900	4,000	658,60		
			80,00	2,000	2,000	320,00		
			80,00	2,000	2,000	320,00		
	(larg.=(6,30+6,60)/2)		67,50	6,450	4,000	1'741,50		
			208,00	2,000	2,000	832,00		
			208,00	2,000	2,000	832,00		
			55,00	4,500	4,500	1'113,75		
			31,60	4,500	4,500	639,90		
			15,00	2,000	2,000	60,00		
			46,00	2,000	2,000	184,00		
	FRESATURE SP17 - KM 18 CIRCA							
	(larg.=(7,55+8,40)/2)		12,50	7,975	4,000	398,75		
	(larg.=(7,70+8,40)/2)		10,00	8,050	4,000	322,00		
			10,75	7,700	4,000	331,10		
		2,00	395,00	2,000	2,000	3'160,00		
	FRESATURA ROTATORIA OSTR VETERE							
	(larg.=(6,75+6,85)/2)		26,00	6,800	4,000	707,20		
	(larg.=(6,7+6,85)/2)		24,00	6,775	4,000	650,40		
	(larg.=(6,70+7,75)/2)		8,50	7,225	4,000	245,65		
	(larg.=(10,45+7,75)/2)		3,50	9,100	4,000	127,40		
	(larg.=(16,50+10,45)/2)		6,20	13,475	4,000	334,18		
	(larg.=(16,50+20,35)/2)		14,15	18,425	4,000	1'042,86		
	(larg.=(10,70+7,50)/2)		16,55	9,100	4,000	602,42		
	Sommano positivi e negativi m²xcm					28'013,15	25'925,65	
	SOMMANO m²xcm					2'087,50		
9	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a							
19.13.011.00	freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso							
2	mediante particolare macchina fresatrice per spess ... to altro occorra							
10/06/2024	per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del							
	piano fresato. Per ogni cm in più							
	DETRAZIONE VOCE 1 LIBRETTO 1 PER ERRATA							
	TRASCRIZIONE							
	fresature a cm 8							
	dal km 15+450 lato dx		75,00	2,500	1,000		187,50	
	dal km 15+520 lato sx		115,00	2,500	1,000		287,50	
	dal km 16+300 lato sx		120,00	2,500	1,000		300,00	
	dal km 16+630 lato sx		75,00	2,500	1,000		187,50	
	dal km 16+850 lato sx		30,00	3,500	1,000		105,00	
	dal km 16+880 lato sx		35,00	7,000	1,000		245,00	
	dal km 17+100 lato dx - radici		100,00	2,000	1,000		200,00	
	FRESATURE SP 17 OSTR VERETE-FIANCO DISTRIBUTORE							
	(larg.=(3,80+3,45)/2)		22,00	3,625	0,500	39,88		
	dal km 17+100 lato dx - radici		48,80	4,000	1,000	195,20		
	dal km 17+100 lato dx - radici							
	Sommano positivi e negativi m²xcm					235,08	1'512,50	
	SI DETRAGGONO m²xcm						1'277,42	
	Ancona, 06/12/2024							
	L'Impresa							
	A RIPORTARE							

ALLEGATO 1 - FRESATURE

SP. 17


OSTRA VETORS

- Franco distrib.

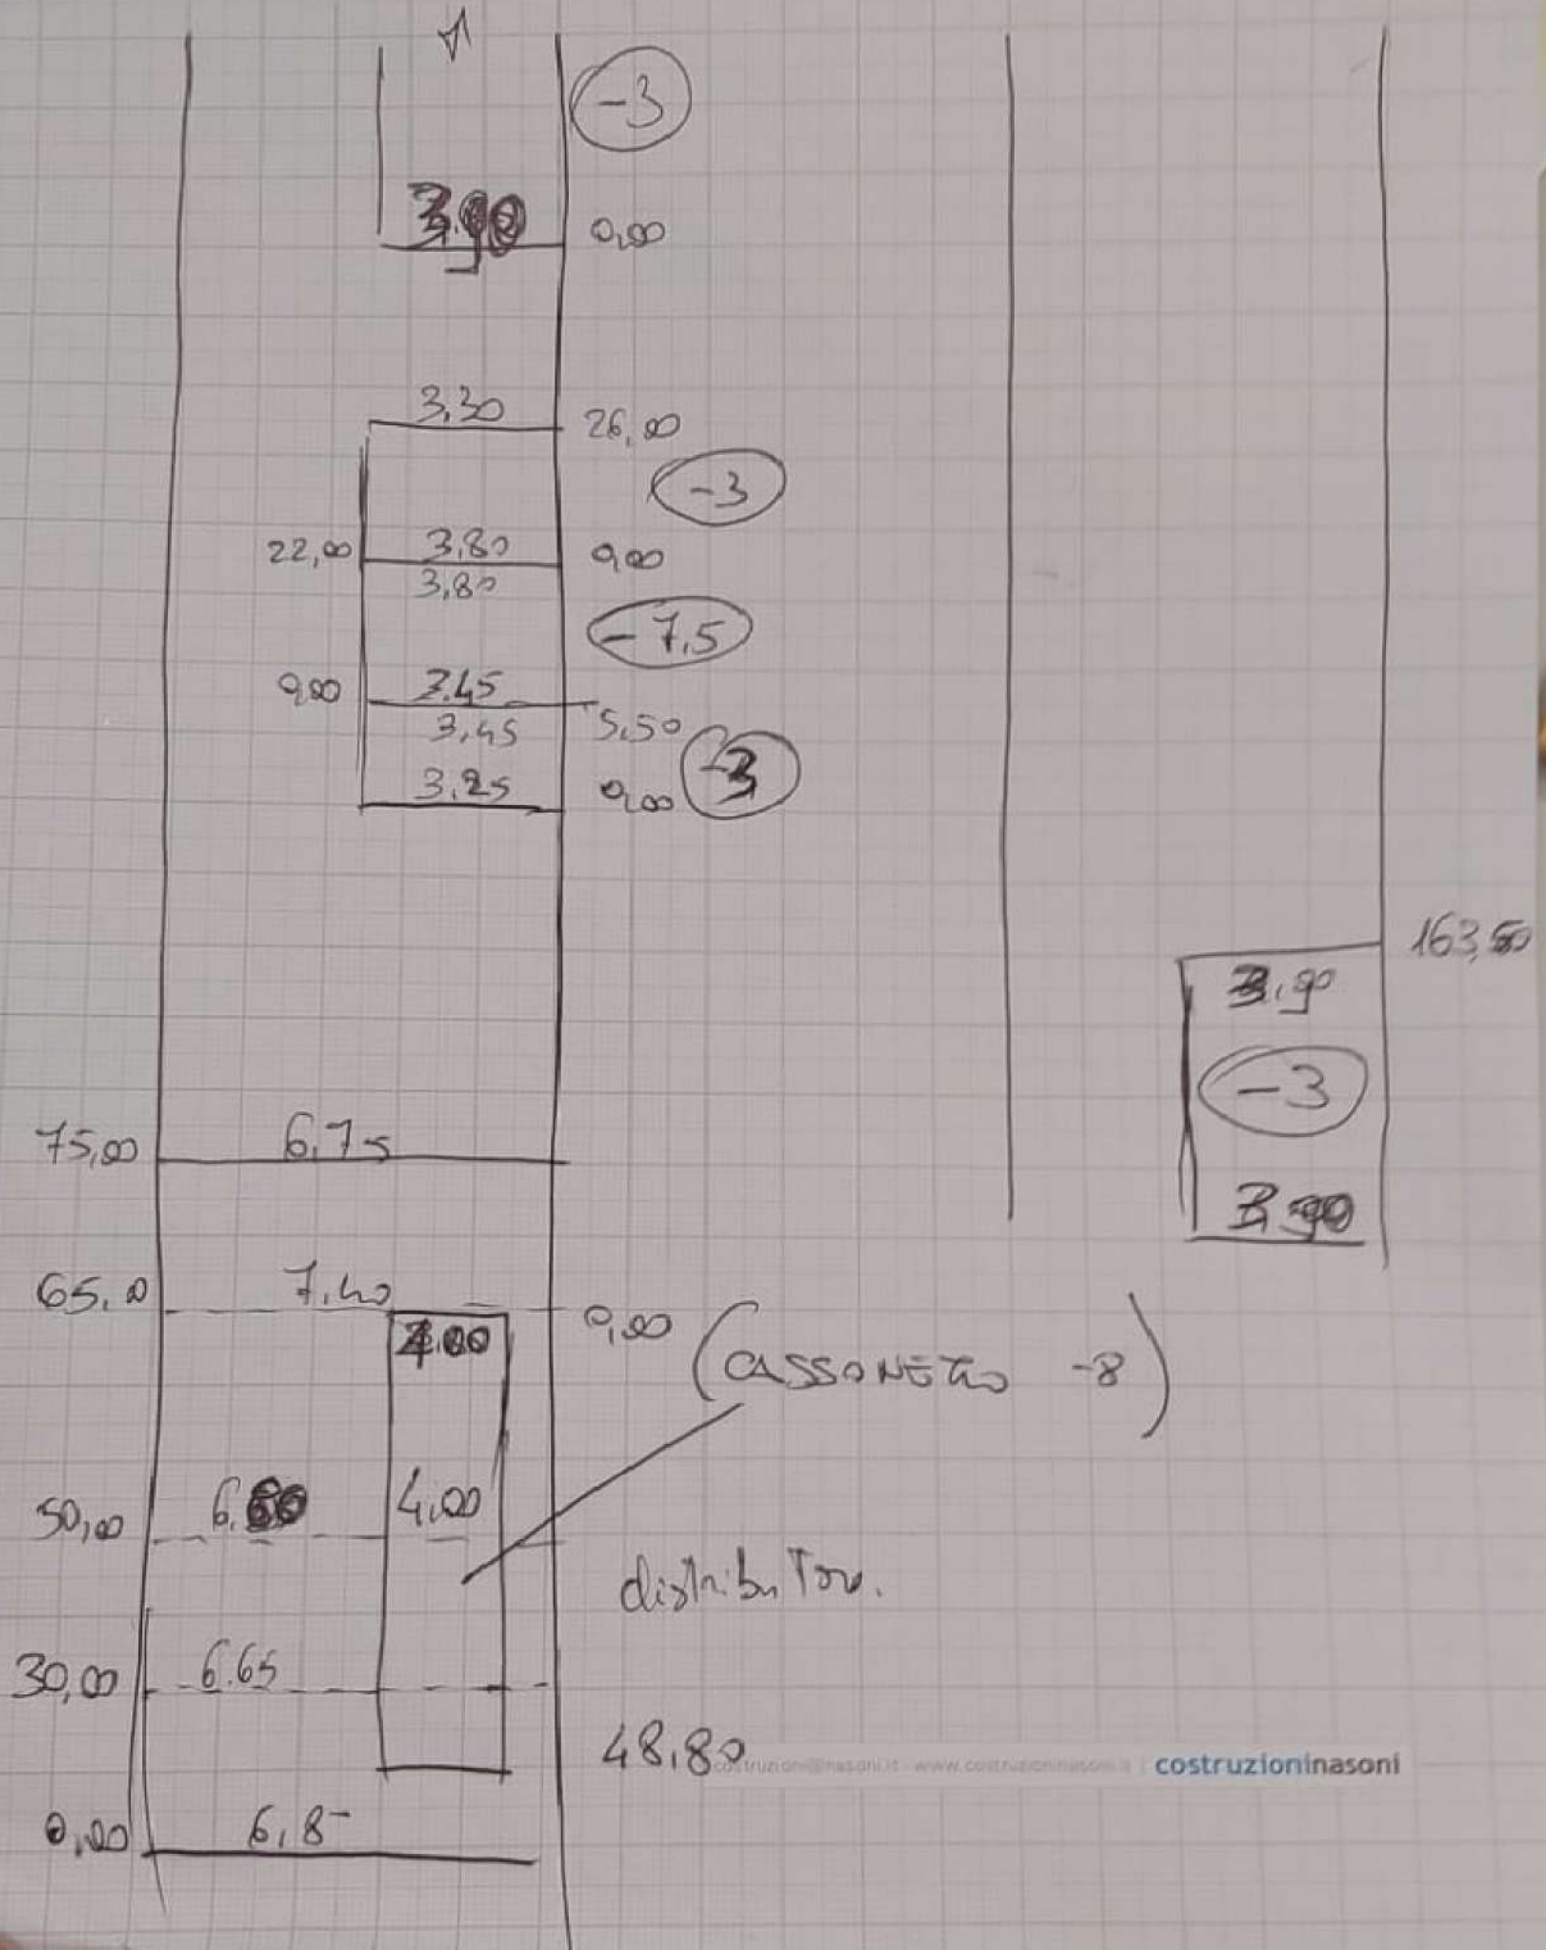


MISURE FRESATURA SP 17 Km 19+2
AL 18+600

①

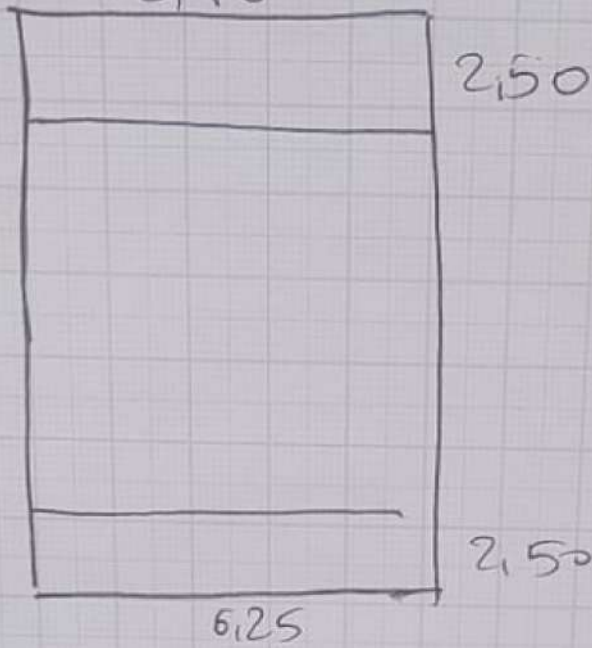

③

②

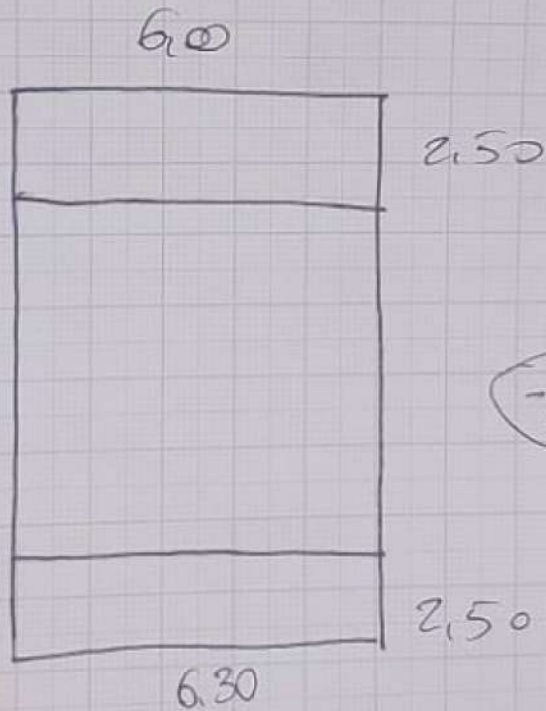


③

FRESATURA

SP 17 Km

15+80

PON GELI

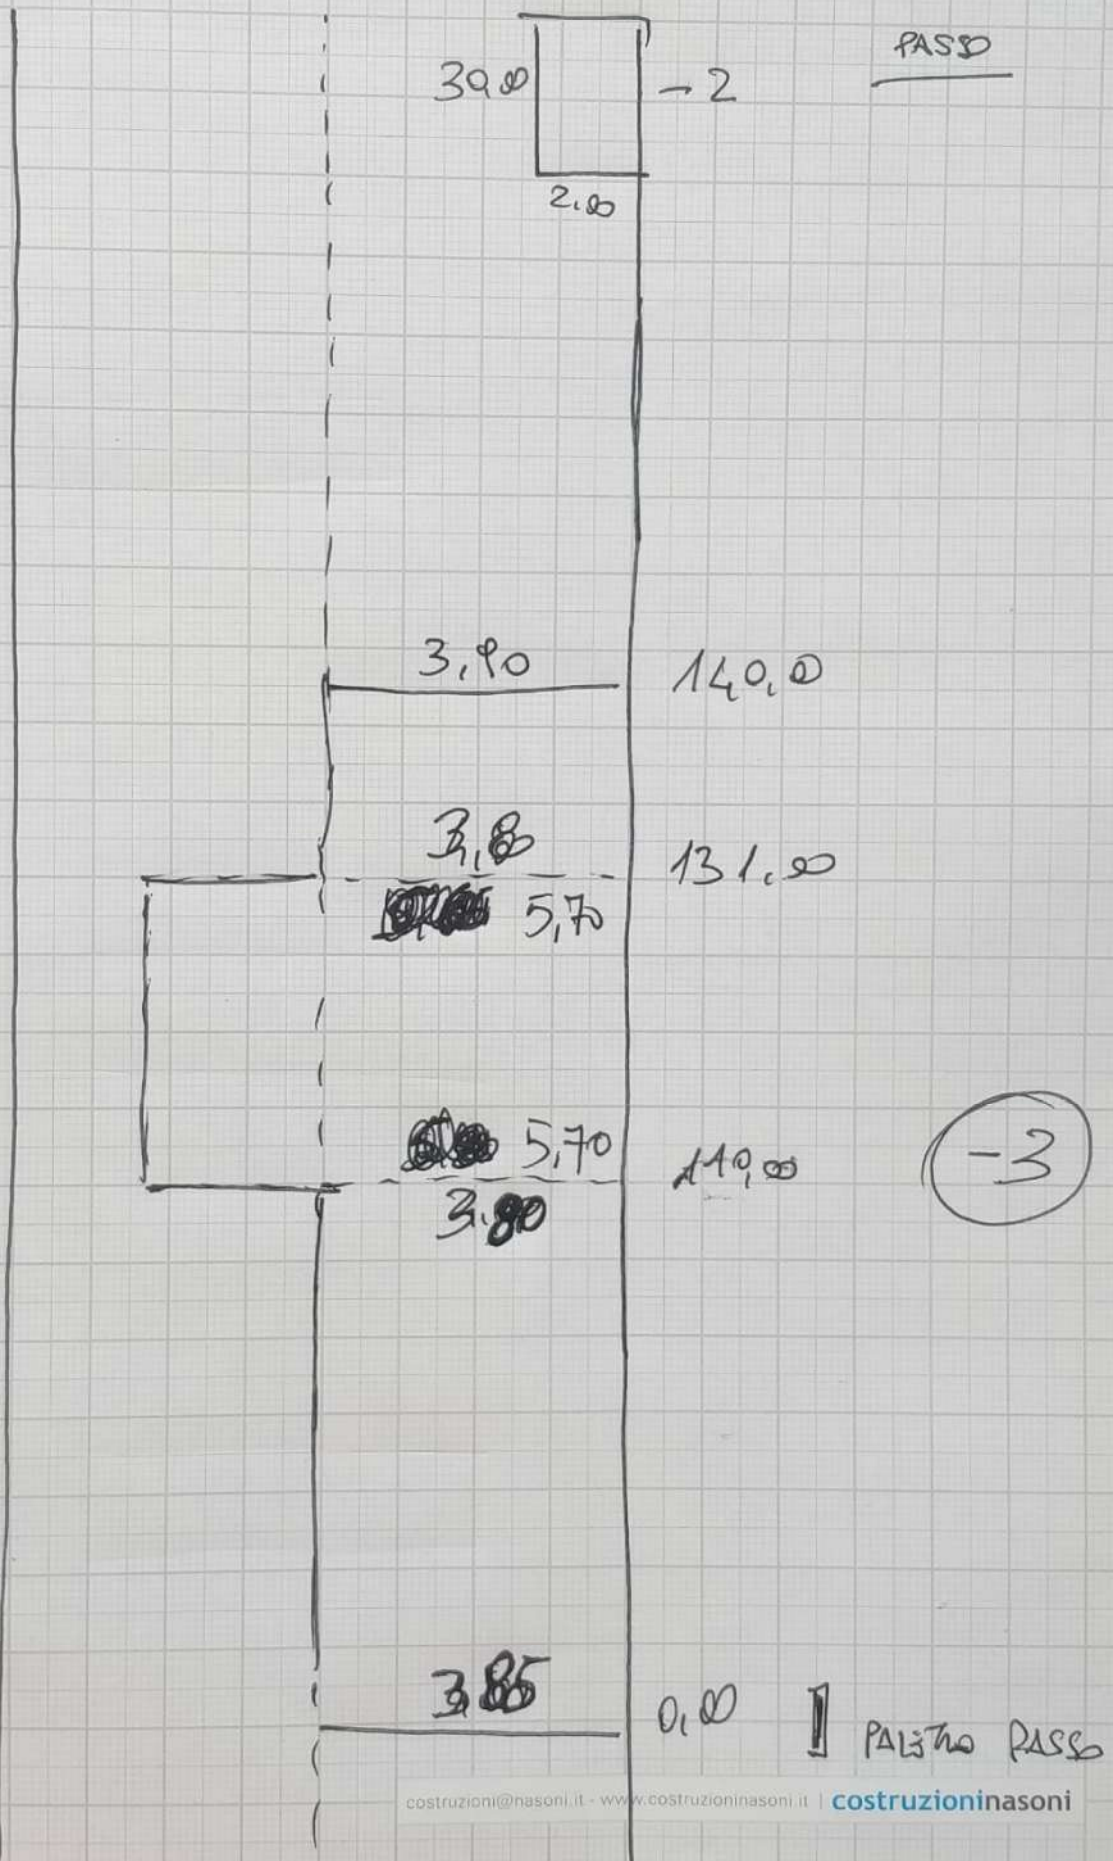

Km 15+80

3.85

0.00


! PALINHO PASS


OSTRA VETUS

FRESATURA


INNOVIO

FOR GELI'

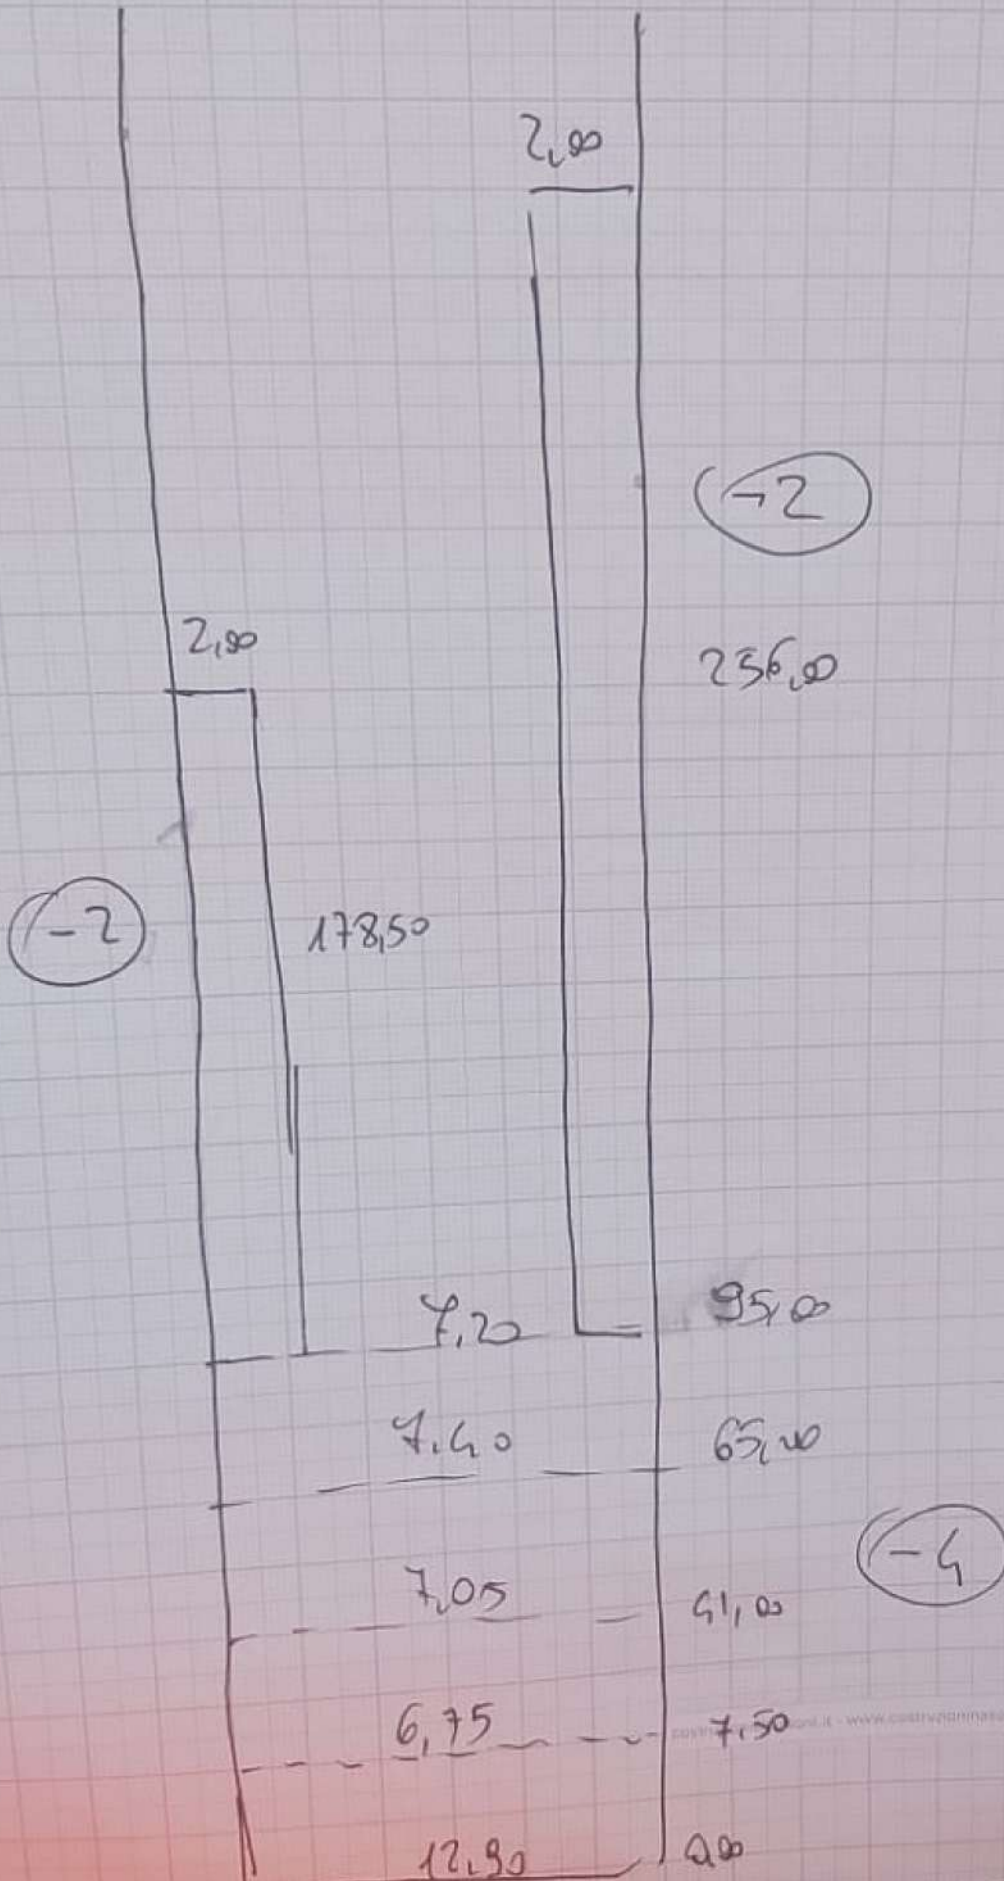

04/06/24 
OSTIA 0


FRESA CURS SP 17

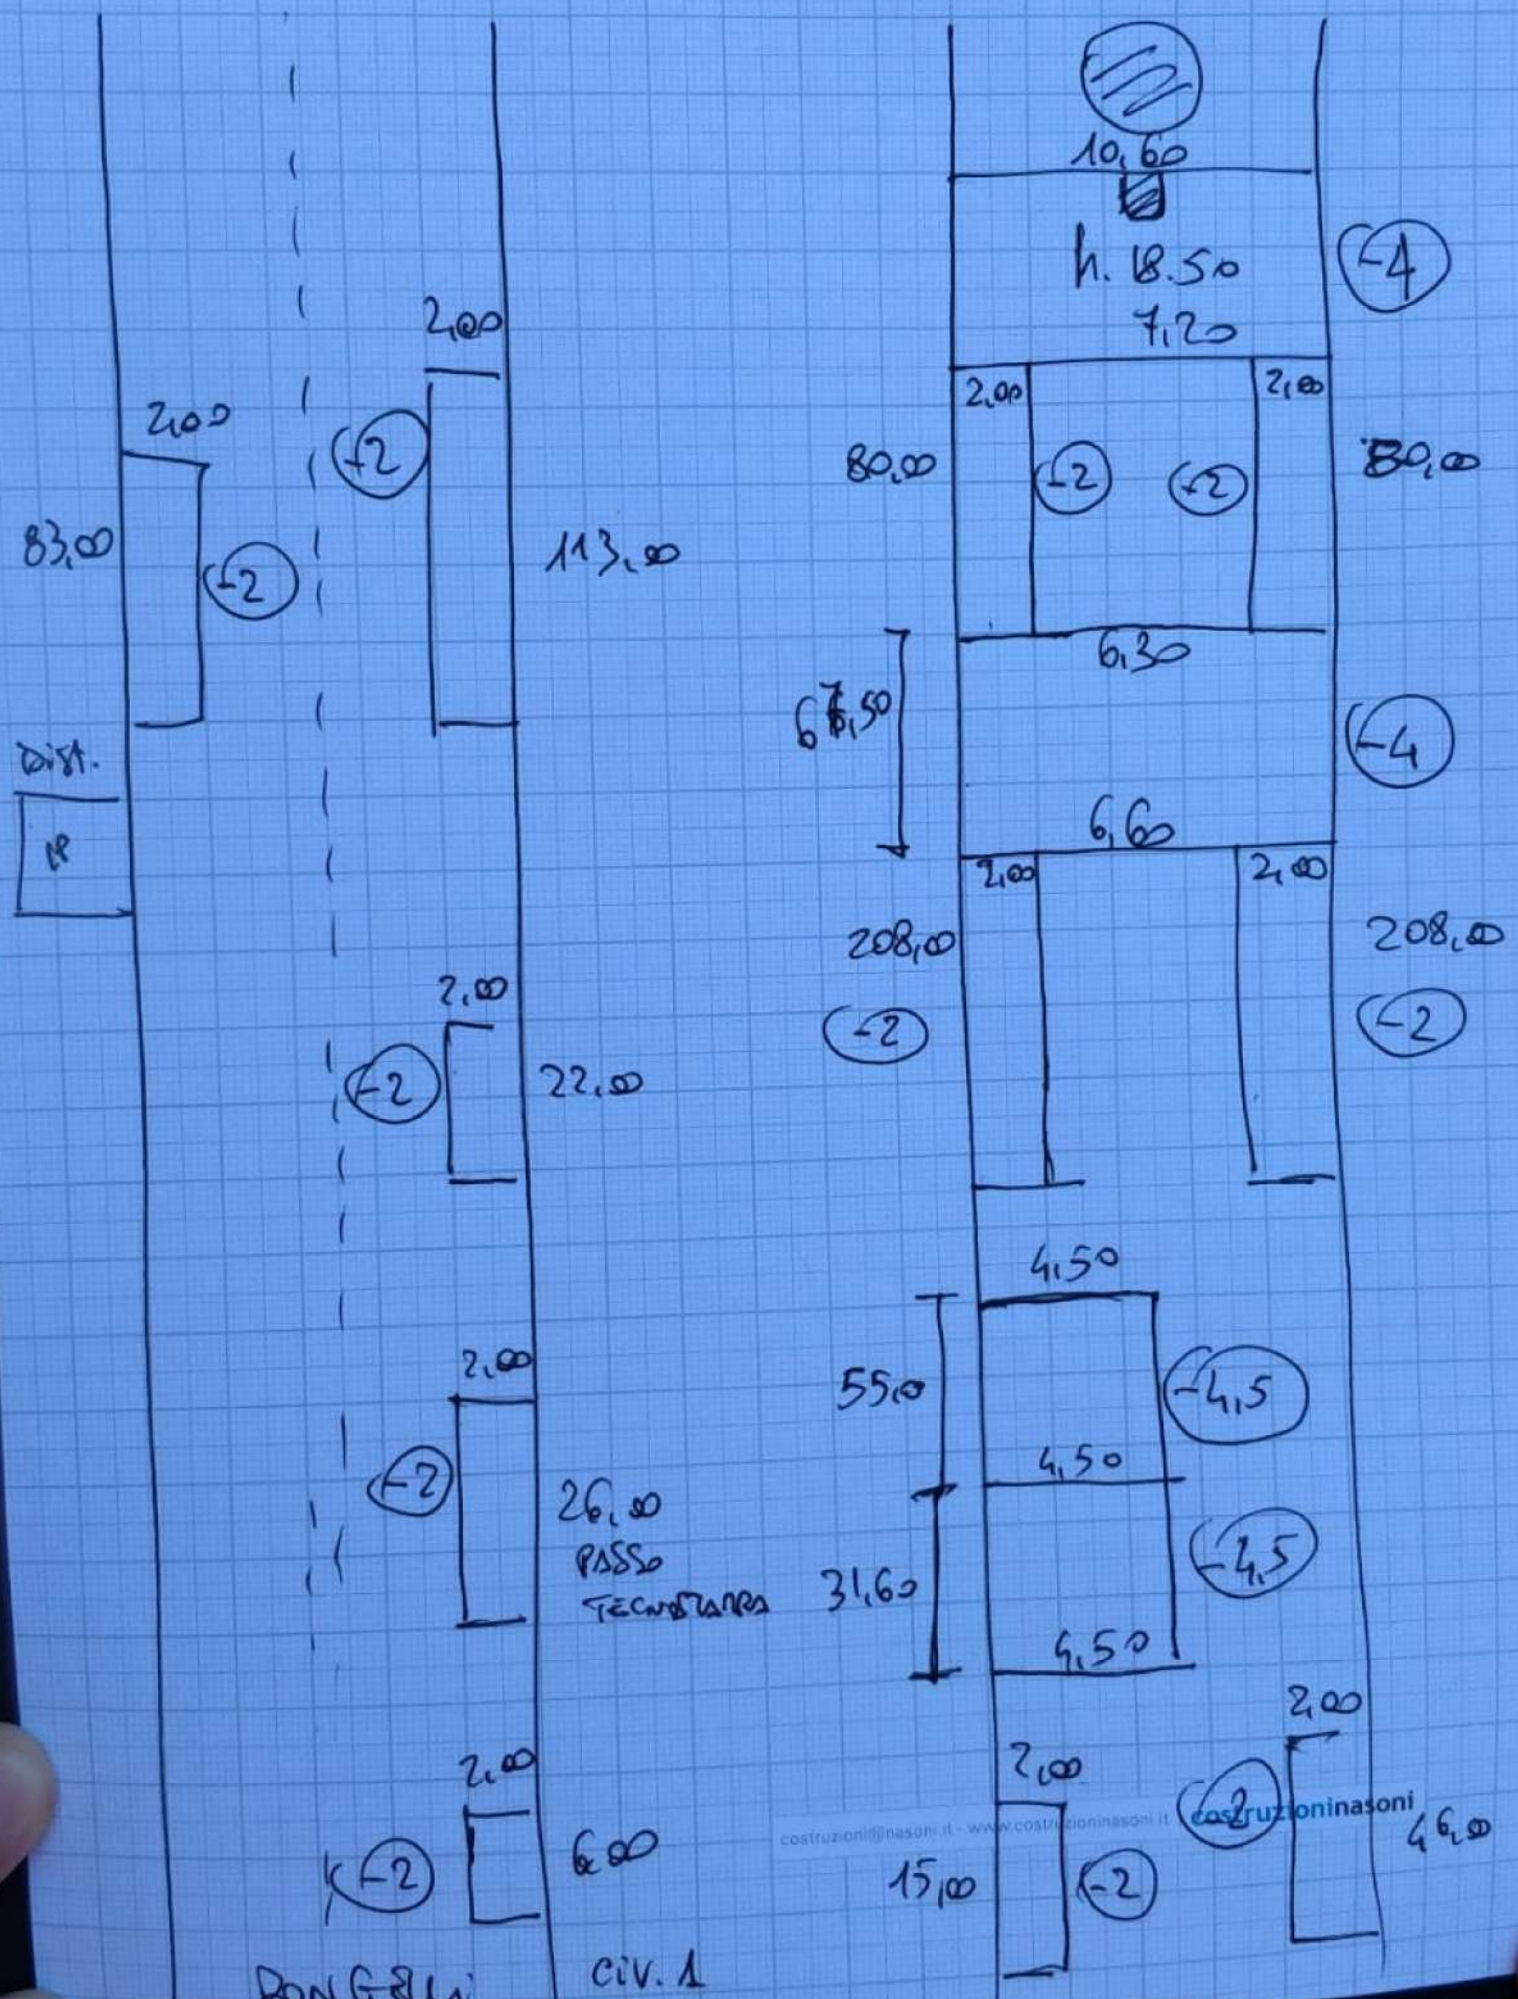

06/06/2024

FRESATURA Km 18,00

Benedetti

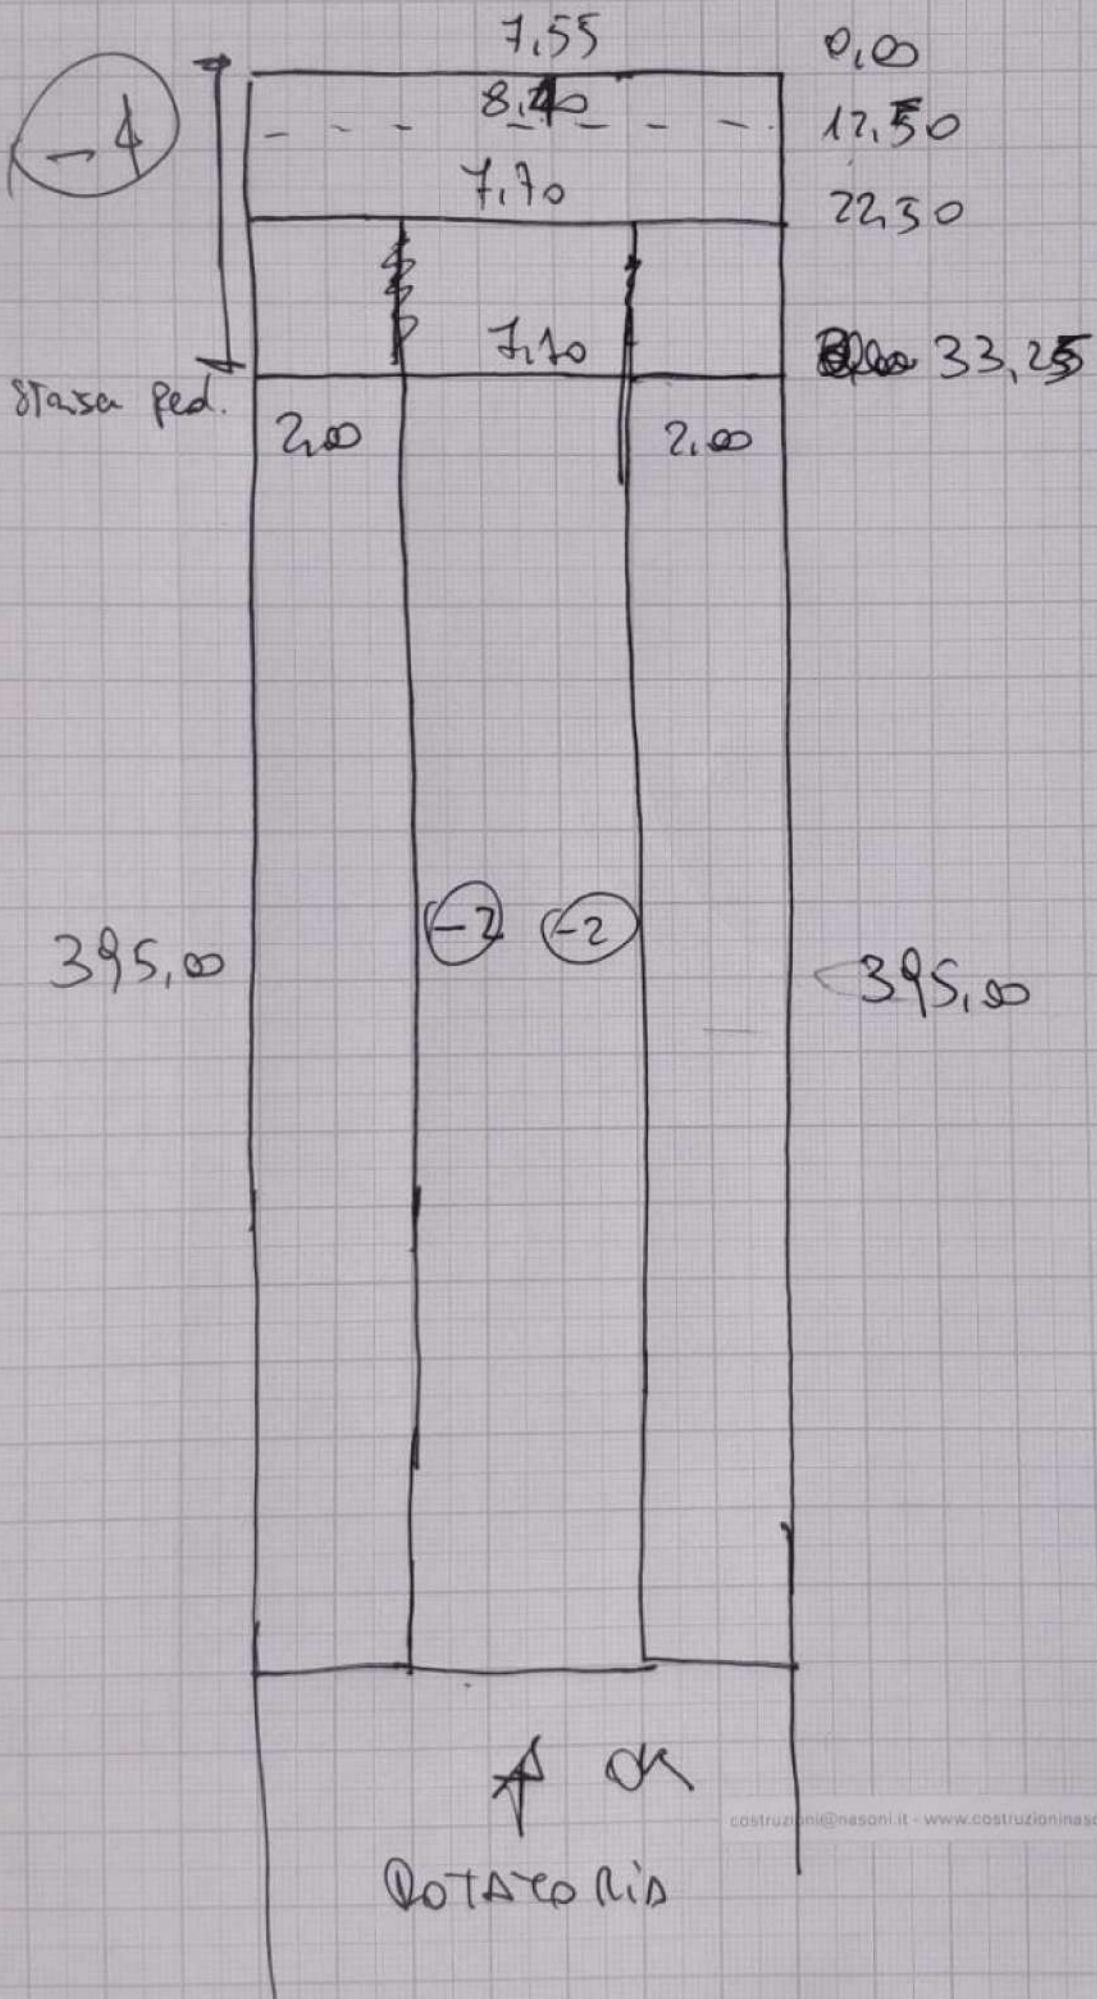

FASSURE

POTATURA

ESTIMO.

06/06/24

[Signature]
Bene

