# ALLEGATO n. 26

**LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, RECUPERO E DIFESA IDRAULICA SULLE OPERE D'ARTE (PONTI E VIADOTTI) - S.P. 18 "JESI-MONTERADO" AL KM 24+225 (OPERA N. 178) COMUNE DI TRECASTELLI - S.P. N. 14/1 "SENIGALLIAALBACINA" BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160 (OPERA N. 112) INTERVENTO LOCALE PER ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI - COMUNE DI ARCEVIA - R.O. DI SENIGALLIA. COD. INT. (86.05).**
**CUP: H47H18001370001 - CIG: 933605437C.**

**CONTO FINALE**

# CERTIFICAZIONI MATERIALI, CERTIFICAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA E DICHIARAZIONE CORRETTA INSTALLAZIONE.

Monica Ulissi
07.07.2025
08:04:42
GMT+01:00

Il Responsabile Unico del Procedimento
**Dott. Ing. Monica Ulissi**

RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova (GE)
Organismo autorizzato con Decreto del Presidente
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
dal Servizio Tecnico Centrale

# CERTIFICATO DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA N. CLS-0275

AI SENSI DEL §11.2.8. DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
DI CUI AL D.M. 17.01.2018
SI CERTIFICA CHE
IL CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA
DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
PRODOTTO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO
OPERATO DA

**COSTRUZIONI NASONI S.R.L.**

**Via Einaudi, 24 - 61032 Fano (PU)**

NELL'IMPIANTO DI

**Via Ripabianca, 12 - 60010 Monterado (AN)**

RISPETTA LE PRESCRIZIONI DELLE
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
(D.M. 17.01.2018)

QUESTO CERTIFICATO RIMANE VALIDO FINO A QUANDO NON SIANO SIGNIFICATIVAMENTE MODIFICATE LE CONDIZIONI STABILITE NELLE SPECIFICAZIONI TECNICHE RICHIAMATE O LE CONDIZIONI DI PRODUZIONE NELLA FABBRICA O IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FABBRICA STESSO
PRIMA EMISSIONE DEL 26/06/2014 AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008

| | |
|---|---|
| Prima emissione | 26/06/2014 |
| Emissione corrente | 03/09/2018 |
| Revisione n. | 1 |

**RINA Services S.p.A.**
IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Andrea ALLOISIO)

INFORMAZIONI AGGIORNATE CIRCA LA VALIDITÀ O EVENTUALI VARIAZIONI INTERVENUTE NELLO STATO DEL PRESENTE CERTIFICATO SONO DISPONIBILI CONTATTANDO IL N. TELEFONICO +39 01053851, L'INDIRIZZO E-MAIL INFO@RINA.ORG OPPURE CONSULTANDO IL SITO WEB WWW.RINA.ORG O IL SITO WEB WWW.OSSERVATORIOCA.IT

costruzioninasoni

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/1996)

| D.D.T. NUMERO | DATA | PAGINE |
|---|---|---|
| 7246 | 18/12/24 | 1 di 1 |

| COD. CLIENTE | PARTITA IVA | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| 00191 | IT00982160426 | 00982160426 |


**Costruzioni Nasoni s.r.l.**
Cap. Soc.€ 500.000,00 i.v.
Partita IVA 00675940415
C.F./Reg. Imprese di Pesaro 00675940415
R.E.A. (PU) 87972
**Sede Amministrativa**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Sede legale**
Via Einaudi, 24
61032 Fano (PU)

**Ufficio tecnico**
Via Cesanense, 174
61040 Monteporzio (PU)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Impianto produzione**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950040

costruzioni@nasoni.it
www.costruzioninasoni.it


SPETTABILE

**IMPR. COSTR. MENTUCCI ALDO S.R.L.**
VIA MARCHE, 38
60019 SENIGALLIA (AN)

TIPO DOCUMENTO

**DOCUMENTO DI TRASPORTO ● CALCESTRUZZO**

| INCARICATO DEL TRASPORTO | | | | CAUSALE DEL TRASPORTO |
|---|---|---|---|---|
| VETTORE MARIOTTI MIRCO | | | | VENDITA |
| **DATA TRASPORTO** | **ORA TRASPORTO** | **TARGA AUTOMEZZO** | **TARGA RIMORCHIO** | **DESTINAZIONE DELLA MERCE** |
| 18/12/24 | 07:54 | BT342DP | | S. LORENZO IN CAMPO -PONTE SUL CESANO- |

| PRODOTTI, BENI, SERVIZI<br>Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| C45S525D3 | CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE C35/45 S5 D25 XD3 | mc | 10,00 |
| POMPAGGIO | POMPAGGIO | mc | 10,00 |

| TEMPERATURA °C | TIPOLOGIA CEMENTO | DIAM. MAX | CONSISTENZA CLASSE | CLASSE DI ESPOSIZIONE | FIRMA OPERATORE IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IV/A (V) 42.5 | 25 | S5 | XD3 | |
| **CONDIZIONI METEO** | **ACQUA/CEMENTO MAX.** | **CLORURI** | **MASSA VOLUMICA** | **ADDITIVI** | |
| | 0,45 | < 0,40 | | | |

OGGETTO

**COPIA PER IL DESTINATARIO**

| OGGETTO<br>**Aggiunte in cantiere richieste dal cliente (o suo delegato)** | | ORA DI INIZIO CARICO | |
|---|---|---|---|
| AGGIUNTA ACQUA | FIRMA PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ | ORA DI ARRIVO IN CANTIERE | |
| AGGIUNTA DI MATERIALE | Le aggiunte indicate sono state richieste dal cliente (o suo delegato) sotto Sua esclusiva responsabilità. | INIZIO SCARICO | Il legale rappresentante, MARIA NASONI |
| CODICE CUP | CODICE CIG<br>933605437C | FINE SCARICO | FIRMA DESTINATARIO |
| NOTE | | | Con la firma del presente d.d.t. vengono integralmente accettate dal ricevente tutte le condizioni generali in uso per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il calcestruzzo di cui al presente d.d.t. è rispondente a quanto ordinato e deve essere impiegato ai sensi della legge n.1086 del 5/10/1971 e successive modifiche. |



I certificati originali sono disponibili nel nostro sito web www.costruzioninasoni.it oppure potrete richiederne copia al numero di fax 071 7950286

Certificato numero CLS-0275, del processo di produzione di fabbrica ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

RINA
PROCESSO CERTIFICATO
D.M. 14/01/2008
Calcestruzzo
Preconfezionato

costruzioninasoni

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/1996)

| D.D.T. NUMERO | DATA | PAGINE |
|---|---|---|
| 7248 | 18/12/24 | 1 di 1 |

| COD. CLIENTE | PARTITA IVA | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| 00191 | IT00982160426 | 00982160426 |


**Costruzioni Nasoni s.r.l.**
Cap. Soc.€ 500.000,00 i.v.
Partita IVA 00675940415
C.F./Reg. Imprese di Pesaro 00675940415
R.E.A. (PU) 87972
**Sede Amministrativa**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Sede legale**
Via Einaudi, 24
61032 Fano (PU)

**Ufficio tecnico**
Via Cesanense, 174
61040 Monteporzio (PU)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Impianto produzione**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950040

costruzioni@nasoni.it
www.costruzioninasoni.it


SPETTABILE

**IMPR. COSTR. MENTUCCI ALDO S.R.L.**
VIA MARCHE, 38
60019 SENIGALLIA (AN)

TIPO DOCUMENTO

**DOCUMENTO DI TRASPORTO ● CALCESTRUZZO**

| INCARICATO DEL TRASPORTO | CAUSALE DEL TRASPORTO |
|---|---|
| MITTENTE | VENDITA |

| DATA TRASPORTO | ORA TRASPORTO | TARGA AUTOMEZZO | TARGA RIMORCHIO | DESTINAZIONE DELLA MERCE |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/24 | 08:16 | ER586LT | | S. LORENZO IN CAMPO -PONTE SUL CESANO- |

| PRODOTTI, BENI, SERVIZI Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| C45S525D3 | CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE C35/45 S5 D25 XD3 | mc | 8,00 |
| POMPAGGIO | POMPAGGIO | mc | 8,00 |

| TEMPERATURA °C | TIPOLOGIA CEMENTO | DIAM. MAX | CONSISTENZA CLASSE | CLASSE DI ESPOSIZIONE | FIRMA OPERATORE IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IV/A (V) 42.5 | 25 | S5 | XD3 | |
| CONDIZIONI METEO | ACQUA/CEMENTO MAX. | CLORURI | MASSA VOLUMICA | ADDITIVI | |
| | 0,45 | < 0,40 | | | |

OGGETTO

**COPIA PER IL DESTINATARIO**

| OGGETTO | ORA DI INIZIO CARICO | |
|---|---|---|
| **Aggiunte in cantiere richieste dal cliente (o suo delegato)** | | FIRMA DEL CONDUCENTE |
| AGGIUNTA ACQUA | ORA DI ARRIVO IN CANTIERE | DICHIARAZIONE MERCI TRASPORTATE IN CONTO PROPRIO Estratto dell'art. 39 della legge 298/74. Il sottoscritto titolare di licenza dell'autotrasporto di cose in conto proprio n° C8D4HH dichiara che le cose trasportate sono da noi prodotte e vendute. |
| AGGIUNTA DI MATERIALE | INIZIO SCARICO | Il legale rappresentante, MARIA NASONI |
| FIRMA PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ Le aggiunte indicate sono state richieste dal cliente (o suo delegato) sotto Sua esclusiva responsabilità. | | |
| CODICE CUP | CODICE CIG 933605437C | FINE SCARICO |
| NOTE | | FIRMA DEL DESTINATARIO Con la firma del presente d.d.t. vengono integralmente accettate dal ricevente tutte le condizioni generali in uso per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il calcestruzzo di cui al presente d.d.t. è rispondente a quanto ordinato e deve essere impiegato ai sensi della legge n.1086 del 5/10/1971 e successive modifiche. |



I certificati originali sono disponibili nel nostro sito web www.costruzioninasoni.it oppure potrete richiederne copia al numero di fax 071 7950286

Certificato numero CLS-0275, del processo di produzione di fabbrica ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

RINA PROCESSO CERTIFICATO

costruzioninasoni

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/1996)

| D.D.T. NUMERO | DATA | PAGINE |
|---|---|---|
| 7247 | 18/12/24 | 1 di 1 |

| COD. CLIENTE | PARTITA IVA | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| 00191 | IT00982160426 | 00982160426 |


**Costruzioni Nasoni s.r.l.**
Cap. Soc.€ 500.000,00 i.v.
Partita IVA 00675940415
C.F./Reg. Imprese di Pesaro 00675940415
R.E.A. (PU) 87972
**Sede Amministrativa**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Sede legale**
Via Einaudi, 24
61032 Fano (PU)

**Ufficio tecnico**
Via Cesanense, 174
61040 Monteporzio (PU)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Impianto produzione**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950040

costruzioni@nasoni.it
www.costruzioninasoni.it


SPETTABILE

**IMPR. COSTR. MENTUCCI ALDO S.R.L.**
VIA MARCHE, 38
60019 SENIGALLIA (AN)

TIPO DOCUMENTO

**DOCUMENTO DI TRASPORTO ● CALCESTRUZZO**

| INCARICATO DEL TRASPORTO | CAUSALE DEL TRASPORTO |
|---|---|
| MITTENTE | VENDITA |

| DATA TRASPORTO | ORA TRASPORTO | TARGA AUTOMEZZO | TARGA RIMORCHIO | DESTINAZIONE DELLA MERCE |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/24 | 08:14 | DB956PY | | S. LORENZO IN CAMPO -PONTE SUL CESANO- |

| PRODOTTI, BENI, SERVIZI Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| C45S525D3 | CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE C35/45 S5 D25 XD3 | mc | 8,00 |
| POMPAGGIO | POMPAGGIO | mc | 8,00 |

| TEMPERATURA °C | TIPOLOGIA CEMENTO | DIAM. MAX | CONSISTENZA CLASSE | CLASSE DI ESPOSIZIONE | FIRMA OPERATORE IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IV/A (V) 42.5 | 25 | S5 | XD3 | |
| CONDIZIONI METEO | ACQUA/CEMENTO MAX. | CLORURI | MASSA VOLUMICA | ADDITIVI | |
| | 0,45 | < 0,40 | | | |

OGGETTO

**COPIA PER IL DESTINATARIO**

OGGETTO
**Aggiunte in cantiere richieste dal cliente (o suo delegato)**

| AGGIUNTA ACQUA | | ORA DI INIZIO CARICO | |
|---|---|---|---|
| | FIRMA PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ | ORA DI ARRIVO IN CANTIERE | 8.50 |
| AGGIUNTA DI MATERIALE | Le aggiunte indicate sono state richieste dal cliente (o suo delegato) sotto Sua esclusiva responsabilità. | INIZIO SCARICO | 8.55 |
| CODICE CUP | CODICE CIG 933605437C | FINE SCARICO | 9.15 |

NOTE

DICHIARAZIONE MERCI TRASPORTATE IN CONTO PROPRIO
Estratto dell'art. 39 della legge 298/74. Il sottoscritto titolare di licenza dell'autotrasporto di cose in conto proprio n° C8D4HH dichiara che le cose trasportate sono da noi prodotte e vendute.

Il legale rappresentante, MARIA NASONI

FIRMA PER DESTINATARIO

Con la firma del presente d.d.t. vengono integralmente accettate dal ricevente tutte le condizioni generali in uso per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il calcestruzzo di cui al presente d.d.t. è rispondente a quanto ordinato e deve essere impiegato ai sensi della legge n.1086 del 5/10/1971 e successive modifiche.



I certificati originali sono disponibili nel nostro sito web www.costruzioninasoni.it oppure potrete richiederne copia al numero di fax 071 7950286

Certificato numero CLS-0275, del processo di produzione di fabbrica ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

RINA
PROCESSO CERTIFICATO

costruzioninasoni

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/1996)

| D.D.T. NUMERO | DATA | PAGINE |
|---|---|---|
| 7258 | 18/12/24 | 1 di 1 |

| COD. CLIENTE | PARTITA IVA | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| 00191 | IT00982160426 | 00982160426 |


**Costruzioni Nasoni s.r.l.**
Cap. Soc.€ 500.000,00 i.v.
Partita IVA 00675940415
C.F./Reg. Imprese di Pesaro 00675940415
R.E.A. (PU) 87972
**Sede Amministrativa**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Sede legale**
Via Einaudi, 24
61032 Fano (PU)

**Ufficio tecnico**
Via Cesanense, 174
61040 Monteporzio (PU)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Impianto produzione**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950040

costruzioni@nasoni.it
www.costruzioninasoni.it


SPETTABILE

**IMPR. COSTR. MENTUCCI ALDO S.R.L.**
VIA MARCHE, 38
60019 SENIGALLIA (AN)

TIPO DOCUMENTO

**DOCUMENTO DI TRASPORTO ● CALCESTRUZZO**

| INCARICATO DEL TRASPORTO | CAUSALE DEL TRASPORTO |
|---|---|
| MITTENTE | VENDITA |

| DATA TRASPORTO | ORA TRASPORTO | TARGA AUTOMEZZO | TARGA RIMORCHIO | DESTINAZIONE DELLA MERCE |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/24 | 10:05 | DB956PY | | S. LORENZO IN CAMPO -PONTE SUL CESANO- |

| PRODOTTI, BENI, SERVIZI<br>Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| C45S525D3 | CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE C35/45 S5 D25 XD3 | mc | 8,00 |
| POMPAGGIO | POMPAGGIO | mc | 8,00 |

| TEMPERATURA °C | TIPOLOGIA CEMENTO | DIAM. MAX | CONSISTENZA CLASSE | CLASSE DI ESPOSIZIONE | FIRMA OPERATORE IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IV/A (V) 42.5 | 25 | S5 | XD3 | |
| CONDIZIONI METEO | ACQUA/CEMENTO MAX. | CLORURI | MASSA VOLUMICA | ADDITIVI | |
| | 0,45 | < 0,40 | | | |

OGGETTO

**COPIA PER IL DESTINATARIO**

OGGETTO

**Aggiunte in cantiere richieste dal cliente (o suo delegato)**

| AGGIUNTA ACQUA | ORA DI INIZIO CARICO | |
|---|---|---|
| | ORA DI ARRIVO IN CANTIERE | 11.10 |
| AGGIUNTA DI MATERIALE | INIZIO SCARICO | 11.15 |
| Le aggiunte indicate sono state richieste dal cliente (o suo delegato) sotto Sua esclusiva responsabilità. | | |
| CODICE CUP | CODICE CIG: 933605437C | FINE SCARICO 11.30 |

NOTE

DICHIARAZIONE MERCI TRASPORTATE IN CONTO PROPRIO
Estratto dell'art. 39 della legge 298/74. Il sottoscritto titolare di licenza dell'autotrasporto di cose in conto proprio n° C8D4HH dichiara che le cose trasportate sono da noi prodotte e vendute.

Il legale rappresentante, MARIA NASONI

Con la firma del presente d.d.t. vengono integralmente accettate dal ricevente tutte le condizioni generali in uso per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il calcestruzzo di cui al presente d.d.t. è rispondente a quanto ordinato e deve essere impiegato ai sensi della legge n.1086 del 5/10/1971 e successive modifiche.



I certificati originali sono disponibili nel nostro sito web www.costruzioninasoni.it oppure potrete richiederne copia al numero di fax 071 7950286

Certificato numero CLS-0275, del processo di produzione di fabbrica ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

RINA
PROCESSO CERTIFICATO
D.M. 14/01/2008
Calcestruzzo Preconfezionato

costruzioninasoni

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/1996)

| D.D.T. NUMERO | DATA | PAGINE |
|---|---|---|
| 7259 | 18/12/24 | 1 di 1 |

| COD. CLIENTE | PARTITA IVA | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| 00191 | IT00982160426 | 00982160426 |


**Costruzioni Nasoni s.r.l.**
Cap. Soc.€ 500.000,00 i.v.
Partita IVA 00675940415
C.F./Reg. Imprese di Pesaro 00675940415
R.E.A. (PU) 87972
**Sede Amministrativa**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Sede legale**
Via Einaudi, 24
61032 Fano (PU)

**Ufficio tecnico**
Via Cesanense, 174
61040 Monteporzio (PU)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Impianto produzione**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950040

costruzioni@nasoni.it
www.costruzioninasoni.it


SPETTABILE

**IMPR. COSTR. MENTUCCI ALDO S.R.L.**
VIA MARCHE, 38
60019 SENIGALLIA (AN)

TIPO DOCUMENTO

**DOCUMENTO DI TRASPORTO ● CALCESTRUZZO**

| INCARICATO DEL TRASPORTO | | | | CAUSALE DEL TRASPORTO |
|---|---|---|---|---|
| MITTENTE | | | | VENDITA |
| **DATA TRASPORTO** | **ORA TRASPORTO** | **TARGA AUTOMEZZO** | **TARGA RIMORCHIO** | **DESTINAZIONE DELLA MERCE** |
| 18/12/24 | 10:06 | ER586LT | | S. LORENZO IN CAMPO -PONTE SUL CESANO- |

PRODOTTI, BENI, SERVIZI

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| C45S525D3 | CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE C35/45 S5 D25 XD3 | mc | 8,00 |
| POMPAGGIO | POMPAGGIO | mc | 8,00 |

| TEMPERATURA °C | TIPOLOGIA CEMENTO | DIAM. MAX | CONSISTENZA CLASSE | CLASSE DI ESPOSIZIONE | FIRMA OPERATORE IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IV/A (V) 42.5 | 25 | S5 | XD3 | |
| **CONDIZIONI METEO** | **ACQUA/CEMENTO MAX.** | **CLORURI** | **MASSA VOLUMICA** | **ADDITIVI** | |
| | 0,45 | < 0,40 | | | |

OGGETTO

**COPIA PER IL DESTINATARIO**

| OGGETTO | | ORA DI INIZIO CARICO | |
|---|---|---|---|
| **Aggiunte in cantiere richieste dal cliente (o suo delegato)** | | | |
| AGGIUNTA ACQUA | FIRMA PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ | ORA DI ARRIVO IN CANTIERE | DICHIARAZIONE MERCI TRASPORTATE IN CONTO PROPRIO<br>Estratto dell'art. 39 della legge 298/74. Il sottoscritto titolare di licenza dell'autotrasporto di cose in conto proprio n° C8D4HH dichiara che le cose trasportate sono da noi prodotte e vendute.<br>Il legale rappresentante, MARIA NASONI |
| AGGIUNTA DI MATERIALE | Le aggiunte indicate sono state richieste dal cliente (o suo delegato) sotto Sua esclusiva responsabilità. | INIZIO SCARICO | |
| CODICE CUP | CODICE CIG<br>933605437C | FINE SCARICO | FIRMA DEL DESTINATARIO |
| NOTE | | | Con la firma del presente d.d.t. vengono integralmente accettate dal ricevente tutte le condizioni generali in uso per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il calcestruzzo di cui al presente d.d.t. è rispondente a quanto ordinato e deve essere impiegato ai sensi della legge n.1086 del 5/10/1971 e successive modifiche. |



I certificati originali sono disponibili nel nostro sito web www.costruzioninasoni.it oppure potrete richiederne copia al numero di fax 071 7950286

Certificato numero CLS-0275, del processo di produzione di fabbrica ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

RINA
PROCESSO CERTIFICATO
D.M. 14/01/2008
Calcestruzzo
Preconfezionato

costruzioninasoni

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/1996)

| D.D.T. NUMERO | DATA | PAGINE |
|---|---|---|
| 7265 | 18/12/24 | 1 di 1 |

| COD. CLIENTE | PARTITA IVA | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| 00191 | IT00982160426 | 00982160426 |


**Costruzioni Nasoni s.r.l.**
Cap. Soc.€ 500.000,00 i.v.
Partita IVA 00675940415
C.F./Reg. Imprese di Pesaro 00675940415
R.E.A. (PU) 87972
**Sede Amministrativa**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Sede legale**
Via Einaudi, 24
61032 Fano (PU)

**Ufficio tecnico**
Via Cesanense, 174
61040 Monteporzio (PU)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Impianto produzione**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950040

costruzioni@nasoni.it
www.costruzioninasoni.it


SPETTABILE

**IMPR. COSTR. MENTUCCI ALDO S.R.L.**
VIA MARCHE, 38
60019 SENIGALLIA (AN)

TIPO DOCUMENTO
**DOCUMENTO DI TRASPORTO ● CALCESTRUZZO**

| INCARICATO DEL TRASPORTO | | | | CAUSALE DEL TRASPORTO |
|---|---|---|---|---|
| MITTENTE | | | | VENDITA |
| **DATA TRASPORTO** | **ORA TRASPORTO** | **TARGA AUTOMEZZO** | **TARGA RIMORCHIO** | **DESTINAZIONE DELLA MERCE** |
| 18/12/24 | 11:05 | GA389NC | | S. LORENZO IN CAMPO -PONTE SUL CESANO- |

PRODOTTI, BENI, SERVIZI

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| C45S525D3 | CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE C35/45 S5 D25 XD3 | mc | 10,00 |
| POMPAGGIO | POMPAGGIO | mc | 10,00 |

| TEMPERATURA °C | TIPOLOGIA CEMENTO | DIAM. MAX | CONSISTENZA CLASSE | CLASSE DI ESPOSIZIONE | FIRMA OPERATORE IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IV/A (V) 42.5 | 25 | S5 | XD3 | |
| **CONDIZIONI METEO** | **ACQUA/CEMENTO MAX.** | **CLORURI** | **MASSA VOLUMICA** | **ADDITIVI** | |
| | 0,45 | < 0,40 | | | |

OGGETTO
**COPIA PER IL DESTINATARIO**

| OGGETTO | | ORA DI INIZIO CARICO | |
|---|---|---|---|
| **Aggiunte in cantiere richieste dal cliente (o suo delegato)** | | | |
| AGGIUNTA ACQUA | FIRMA PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ | ORA DI ARRIVO IN CANTIERE | DICHIARAZIONE MERCI TRASPORTATE IN CONTO PROPRIO Estratto dell'art. 39 della legge 298/74. Il sottoscritto titolare di licenza dell'autotrasporto di cose in conto proprio n° C8D4HH dichiara che le cose trasportate sono da noi prodotte e vendute. |
| AGGIUNTA DI MATERIALE | Le aggiunte indicate sono state richieste dal cliente (o suo delegato) sotto Sua esclusiva responsabilità. | INIZIO SCARICO | Il legale rappresentante, MARIA NASONI |
| CODICE CUP | CODICE CIG 933605437C | FINE SCARICO | FIRMA DEL DESTINATARIO |
| NOTE | | | Con la firma del presente d.d.t. vengono integralmente accettate dal ricevente tutte le condizioni generali in uso per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il calcestruzzo di cui al presente d.d.t. è rispondente a quanto ordinato e deve essere impiegato ai sensi della legge n.1086 del 5/10/1971 e successive modifiche. |



I certificati originali sono disponibili nel nostro sito web www.costruzioninasoni.it oppure potrete richiederne copia al numero di fax 071 7950286

Certificato numero CLS-0275, del processo di produzione di fabbrica ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

RINA PROCESSO CERTIFICATO D.M. 14/01/2008 Calcestruzzo Preconfezionato

costruzioninasoni

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/1996)

| D.D.T. NUMERO | DATA | PAGINE |
|---|---|---|
| 7264 | 18/12/24 | 1 di 1 |

| COD. CLIENTE | PARTITA IVA | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| 00191 | IT00982160426 | 00982160426 |


**Costruzioni Nasoni s.r.l.**
Cap. Soc.€ 500.000,00 i.v.
Partita IVA 00675940415
C.F./Reg. Imprese di Pesaro 00675940415
R.E.A. (PU) 87972
**Sede Amministrativa**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Sede legale**
Via Einaudi, 24
61032 Fano (PU)

**Ufficio tecnico**
Via Cesanense, 174
61040 Monteporzio (PU)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Impianto produzione**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950040

costruzioni@nasoni.it
www.costruzioninasoni.it


SPETTABILE

**IMPR. COSTR. MENTUCCI ALDO S.R.L.**
VIA MARCHE, 38
60019 SENIGALLIA (AN)

TIPO DOCUMENTO

**DOCUMENTO DI TRASPORTO ● CALCESTRUZZO**

| INCARICATO DEL TRASPORTO | | | | CAUSALE DEL TRASPORTO |
|---|---|---|---|---|
| MITTENTE | | | | VENDITA |
| **DATA TRASPORTO** | **ORA TRASPORTO** | **TARGA AUTOMEZZO** | **TARGA RIMORCHIO** | **DESTINAZIONE DELLA MERCE** |
| 18/12/24 | 10:43 | FJ964KG | | S. LORENZO IN CAMPO -PONTE SUL CESANO- |

| PRODOTTI, BENI, SERVIZI | | | |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | **U.M.** | **Quantità** |
| C45S525D3 | CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE C35/45 S5 D25 XD3 | mc | 10,00 |
| POMPAGGIO | POMPAGGIO | mc | 10,00 |

| TEMPERATURA °C | TIPOLOGIA CEMENTO | DIAM. MAX | CONSISTENZA CLASSE | CLASSE DI ESPOSIZIONE | FIRMA OPERATORE IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | IV/A (V) 42.5 | 25 | S5 | XD3 | |
| **CONDIZIONI METEO** | **ACQUA/CEMENTO MAX.** | **CLORURI** | **MASSA VOLUMICA** | **ADDITIVI** | |
| | 0,45 | < 0,40 | | | |

OGGETTO

**COPIA PER IL DESTINATARIO**

| OGGETTO | | ORA DI INIZIO CARICO | |
|---|---|---|---|
| **Aggiunte in cantiere richieste dal cliente (o suo delegato)** | | | |
| AGGIUNTA ACQUA | FIRMA PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ | ORA DI ARRIVO IN CANTIERE | DICHIARAZIONE MERCI TRASPORTATE IN CONTO PROPRIO Estratto dell'art. 39 della legge 298/74. Il sottoscritto titolare di licenza dell'autotrasporto di cose in conto proprio n° C8D4HH dichiara che le cose trasportate sono da noi prodotte e vendute. |
| AGGIUNTA DI MATERIALE | Le aggiunte indicate sono state richieste dal cliente (o suo delegato) sotto Sua esclusiva responsabilità. | INIZIO SCARICO | Il legale rappresentante, MARIA NASONI |
| CODICE CUP | CODICE CIG 933605437C | FINE SCARICO | FIRMA DEL DESTINATARIO |
| NOTE | | | Con la firma del presente d.d.t. vengono integralmente accettate dal ricevente tutte le condizioni generali in uso per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il calcestruzzo di cui al presente d.d.t. è rispondente a quanto ordinato e deve essere impiegato ai sensi della legge n.1086 del 5/10/1971 e successive modifiche. |



I certificati originali sono disponibili nel nostro sito web www.costruzioninasoni.it oppure potrete richiederne copia al numero di fax 071 7950286

Certificato numero CLS-0275, del processo di produzione di fabbrica ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

RINA
PROCESSO CERTIFICATO
D.M. 14/01/2008
Calcestruzzi
Preconfezionato

costruzioninasoni

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/1996)

| D.D.T. NUMERO | DATA | PAGINE |
|---|---|---|
| 7253 | 18/12/24 | 1 di 1 |

| COD. CLIENTE | PARTITA IVA | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| 00191 | IT00982160426 | 00982160426 |


**Costruzioni Nasoni s.r.l.**
Cap. Soc.€ 500.000,00 i.v.
Partita IVA 00675940415
C.F./Reg. Imprese di Pesaro 00675940415
R.E.A. (PU) 87972
**Sede Amministrativa**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Sede legale**
Via Einaudi, 24
61032 Fano (PU)

**Ufficio tecnico**
Via Cesanense, 174
61040 Monteporzio (PU)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Impianto produzione**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950040

costruzioni@nasoni.it
www.costruzioninasoni.it


SPETTABILE

**IMPR. COSTR. MENTUCCI ALDO S.R.L.**
VIA MARCHE, 38
60019 SENIGALLIA (AN)

TIPO DOCUMENTO

**DOCUMENTO DI TRASPORTO ● CALCESTRUZZO**

| INCARICATO DEL TRASPORTO | | | | CAUSALE DEL TRASPORTO |
|---|---|---|---|---|
| MITTENTE | | | | VENDITA |
| **DATA TRASPORTO** | **ORA TRASPORTO** | **TARGA AUTOMEZZO** | **TARGA RIMORCHIO** | **DESTINAZIONE DELLA MERCE** |
| 18/12/24 | 09:23 | GA389NC | | S. LORENZO IN CAMPO -PONTE SUL CESANO- |

| PRODOTTI, BENI, SERVIZI | | | |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | **U.M.** | **Quantità** |
| C45S525D3 | CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE C35/45 S5 D25 XD3 | mc | 10,00 |
| POMPAGGIO | POMPAGGIO | mc | 10,00 |

| TEMPERATURA °C | TIPOLOGIA CEMENTO | DIAM. MAX | CONSISTENZA CLASSE | CLASSE DI ESPOSIZIONE | FIRMA OPERATORE IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IV/A (V) 42.5 | 25 | S5 | XD3 | |
| **CONDIZIONI METEO** | **ACQUA/CEMENTO MAX.** | **CLORURI** | **MASSA VOLUMICA** | **ADDITIVI** | |
| | 0,45 | < 0,40 | | | |

OGGETTO

**COPIA PER IL DESTINATARIO**

| OGGETTO | | ORA DI INIZIO CARICO | |
|---|---|---|---|
| **Aggiunte in cantiere richieste dal cliente (o suo delegato)** | | | |
| AGGIUNTA ACQUA | FIRMA PER ACCETTAZIONE E RESPONSABILITÀ | ORA DI ARRIVO IN CANTIERE | DICHIARAZIONE MERCI TRASPORTATE IN CONTO PROPRIO<br>Estratto dell'art. 39 della legge 298/74. Il sottoscritto titolare di licenza dell'autotrasporto di cose in conto proprio n° C8D4HH dichiara che le cose trasportate sono da noi prodotte e vendute.<br>Il legale rappresentante, MARIA NASONI |
| AGGIUNTA DI MATERIALE | Le aggiunte indicate sono state richieste dal cliente (o suo delegato) sotto Sua esclusiva responsabilità. | INIZIO SCARICO | |
| CODICE CUP | CODICE CIG<br>933605437C | FINE SCARICO | FIRMA PER RICEVUTA DESTINATARIO<br>Con la firma del presente d.d.t. vengono integralmente accettate dal ricevente tutte le condizioni generali in uso per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il calcestruzzo di cui al presente d.d.t. è rispondente a quanto ordinato e deve essere impiegato ai sensi della legge n.1086 del 5/10/1971 e successive modifiche. |
| NOTE | | | |



I certificati originali sono disponibili nel nostro sito web www.costruzioninasoni.it oppure potrete richiederne copia al numero di fax 071 7950286

Certificato numero CLS-0275, del processo di produzione di fabbrica ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

RINA
PROCESSO CERTIFICATO

costruzioninasoni

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/1996)

| D.D.T. NUMERO | DATA | PAGINE |
|---|---|---|
| 7245 | 18/12/24 | 1 di 1 |

| COD. CLIENTE | PARTITA IVA | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| 00191 | IT00982160426 | 00982160426 |


**Costruzioni Nasoni s.r.l.**
Cap. Soc.€ 500.000,00 i.v.
Partita IVA 00675940415
C.F./Reg. Imprese di Pesaro 00675940415
R.E.A. (PU) 87972
**Sede Amministrativa**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Sede legale**
Via Einaudi, 24
61032 Fano (PU)

**Ufficio tecnico**
Via Cesanense, 174
61040 Monteporzio (PU)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Impianto produzione**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950040

costruzioni@nasoni.it
www.costruzioninasoni.it


SPETTABILE

**IMPR. COSTR. MENTUCCI ALDO S.R.L.**
VIA MARCHE, 38
60019 SENIGALLIA (AN)

TIPO DOCUMENTO
**DOCUMENTO DI TRASPORTO ● CALCESTRUZZO**

| INCARICATO DEL TRASPORTO | CAUSALE DEL TRASPORTO |
|---|---|
| MITTENTE | VENDITA |

| DATA TRASPORTO | ORA TRASPORTO | TARGA AUTOMEZZO | TARGA RIMORCHIO | DESTINAZIONE DELLA MERCE |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/24 | 07:28 | GA389NC | | S. LORENZO IN CAMPO -PONTE SUL CESANO- |

PRODOTTI, BENI, SERVIZI

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| C45S525D3 | CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE C35/45 S5 D25 XD3 | mc | 10,00 |
| POMPA | POMPA CHIAMATA FISSA | n. | 1,00 |
| POMPAGGIO | POMPAGGIO | mc | 10,00 |

| TEMPERATURA °C | TIPOLOGIA CEMENTO | DIAM. MAX | CONSISTENZA CLASSE | CLASSE DI ESPOSIZIONE | FIRMA OPERATORE IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IV/A (V) 42.5 | 25 | S5 | XD3 | |
| CONDIZIONI METEO | ACQUA/CEMENTO MAX. | CLORURI | MASSA VOLUMICA | ADDITIVI | |
| | 0,45 | < 0,40 | | | |

OGGETTO
**COPIA PER IL DESTINATARIO**

OGGETTO
**Aggiunte in cantiere richieste dal cliente (o suo delegato)**

| AGGIUNTA ACQUA | | ORA DI INIZIO CARICO | |
|---|---|---|---|
| AGGIUNTA DI MATERIALE | FIRMA PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ<br>Le aggiunte indicate sono state richieste dal cliente (o suo delegato) sotto Sua esclusiva responsabilità. | ORA DI ARRIVO IN CANTIERE | DICHIARAZIONE MERCI TRASPORTATE IN CONTO PROPRIO<br>Estratto dell'art. 39 della legge 298/74. Il sottoscritto titolare di licenza dell'autotrasporto di cose in conto proprio n° C8D4HH dichiara che le cose trasportate sono da noi prodotte e vendute.<br>Il legale rappresentante, MARIA NASONI |
| | | INIZIO SCARICO | |
| CODICE CUP | CODICE CIG<br>933605437C | FINE SCARICO | FIRMA DEL DESTINATARIO |
| NOTE | | | Con la firma del presente d.d.t. vengono integralmente accettate dal ricevente tutte le condizioni generali in uso per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il calcestruzzo di cui al presente d.d.t. è rispondente a quanto ordinato e deve essere impiegato ai sensi della legge n.1086 del 5/10/1971 e successive modifiche. |



I certificati originali sono disponibili nel nostro sito web www.costruzioninasoni.it oppure potrete richiederne copia al numero di fax 071 7950286

Certificato numero CLS-0275, del processo di produzione di fabbrica ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

RINA
PROCESSO CERTIFICATO
D.M. 14/01/2008
Calcestruzzo Preconfezionato

costruzioninasoni

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/1996)

| D.D.T. NUMERO | DATA | PAGINE |
|---|---|---|
| 7251 | 18/12/24 | 1 di 1 |

| COD. CLIENTE | PARTITA IVA | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| 00191 | IT00982160426 | 00982160426 |


**Costruzioni Nasoni s.r.l.**
Cap. Soc.€ 500.000,00 i.v.
Partita IVA 00675940415
C.F./Reg. Imprese di Pesaro 00675940415
R.E.A. (PU) 87972
**Sede Amministrativa**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Sede legale**
Via Einaudi, 24
61032 Fano (PU)

**Ufficio tecnico**
Via Cesanense, 174
61040 Monteporzio (PU)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Impianto produzione**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950040

costruzioni@nasoni.it
www.costruzioninasoni.it


SPETTABILE

**IMPR. COSTR. MENTUCCI ALDO S.R.L.**
VIA MARCHE, 38
60019 SENIGALLIA (AN)

TIPO DOCUMENTO

**DOCUMENTO DI TRASPORTO ● CALCESTRUZZO**

| INCARICATO DEL TRASPORTO | | | | CAUSALE DEL TRASPORTO |
|---|---|---|---|---|
| MITTENTE | | | | VENDITA |
| **DATA TRASPORTO** | **ORA TRASPORTO** | **TARGA AUTOMEZZO** | **TARGA RIMORCHIO** | **DESTINAZIONE DELLA MERCE** |
| 18/12/24 | 08:55 | FJ964KG | | S. LORENZO IN CAMPO -PONTE SUL CESANO- |

PRODOTTI, BENI, SERVIZI

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| C45S525D3 | CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE C35/45 S5 D25 XD3 | mc | 10,00 |
| POMPAGGIO | POMPAGGIO | mc | 10,00 |

| TEMPERATURA °C | TIPOLOGIA CEMENTO | DIAM. MAX | CONSISTENZA CLASSE | CLASSE DI ESPOSIZIONE | FIRMA OPERATORE IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IV/A (V) 42.5 | 25 | S5 | XD3 | |
| **CONDIZIONI METEO** | **ACQUA/CEMENTO MAX.** | **CLORURI** | **MASSA VOLUMICA** | **ADDITIVI** | |
| | 0,45 | < 0,40 | | | |

OGGETTO

**COPIA PER IL DESTINATARIO**

| OGGETTO | | ORA DI INIZIO CARICO | |
|---|---|---|---|
| **Aggiunte in cantiere richieste dal cliente (o suo delegato)** | | | |
| AGGIUNTA ACQUA | FIRMA E TIMBRO PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ | ORA DI ARRIVO IN CANTIERE | DICHIARAZIONE MERCI TRASPORTATE IN CONTO PROPRIO<br>Estratto dell'art. 39 della legge 298/74. Il sottoscritto titolare di licenza dell'autotrasporto di cose in conto proprio n° C8D4HH dichiara che le cose trasportate sono da noi prodotte e vendute.<br>Il legale rappresentante, MARIA NASONI |
| AGGIUNTA DI MATERIALE | Le aggiunte indicate sono state richieste dal cliente (o suo delegato) sotto Sua esclusiva responsabilità. | INIZIO SCARICO | |
| CODICE CUP | CODICE CIG<br>933605437C | FINE SCARICO | FIRMA DEL DESTINATARIO |
| NOTE | | | Con la firma del presente d.d.t. vengono integralmente accettate dal ricevente tutte le condizioni generali in uso per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il calcestruzzo di cui al presente d.d.t. è rispondente a quanto ordinato e deve essere impiegato ai sensi della legge n.1086 del 5/10/1971 e successive modifiche. |



I certificati originali sono disponibili nel nostro sito web www.costruzioninasoni.it oppure potrete richiederne copia al numero di fax 071 7950286

Certificato numero CLS-0275, del processo di produzione di fabbrica ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

RINA
PROCESSO CERTIFICATO
D.M. 14/01/2008
Calcestruzzo
Processo certificato

costruzioninasoni

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/1996)

| D.D.T. NUMERO | DATA | PAGINE |
|---|---|---|
| 7254 | 18/12/24 | 1 di 1 |

| COD. CLIENTE | PARTITA IVA | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| 00191 | IT00982160426 | 00982160426 |


**Costruzioni Nasoni s.r.l.**
Cap. Soc.€ 500.000,00 i.v.
Partita IVA 00675940415
C.F./Reg. Imprese di Pesaro 00675940415
R.E.A. (PU) 87972
**Sede Amministrativa**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Sede legale**
Via Einaudi, 24
61032 Fano (PU)

**Ufficio tecnico**
Via Cesanense, 174
61040 Monteporzio (PU)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Impianto produzione**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950040

costruzioni@nasoni.it
www.costruzioninasoni.it


SPETTABILE

**IMPR. COSTR. MENTUCCI ALDO S.R.L.**
VIA MARCHE, 38
60019 SENIGALLIA (AN)

TIPO DOCUMENTO

**DOCUMENTO DI TRASPORTO ● CALCESTRUZZO**

| INCARICATO DEL TRASPORTO | | | | CAUSALE DEL TRASPORTO |
|---|---|---|---|---|
| VETTORE MARIOTTI MIRCO | | | | VENDITA |
| DATA TRASPORTO | ORA TRASPORTO | TARGA AUTOMEZZO | TARGA RIMORCHIO | DESTINAZIONE DELLA MERCE |
| 18/12/24 | 09:25 | BT342DP | | S. LORENZO IN CAMPO -PONTE SUL CESANO- |

PRODOTTI, BENI, SERVIZI

| Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| C45S525D3 | CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE C35/45 S5 D25 XD3 | mc | 10,00 |
| POMPAGGIO | POMPAGGIO | mc | 10,00 |

| TEMPERATURA °C | TIPOLOGIA CEMENTO | DIAM. MAX | CONSISTENZA CLASSE | CLASSE DI ESPOSIZIONE | FIRMA OPERATORE IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IV/A (V) 42.5 | 25 | S5 | XD3 | |
| CONDIZIONI METEO | ACQUA/CEMENTO MAX. | CLORURI | MASSA VOLUMICA | ADDITIVI | |
| | 0,45 | < 0,40 | | | |

OGGETTO

**COPIA PER IL DESTINATARIO**

| OGGETTO | | ORA DI INIZIO CARICO | |
|---|---|---|---|
| **Aggiunte in cantiere richieste dal cliente (o suo delegato)** | | | |
| AGGIUNTA ACQUA | FIRMA PER ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ | ORA DI ARRIVO IN CANTIERE | |
| AGGIUNTA DI MATERIALE | Le aggiunte indicate sono state richieste dal cliente (o suo delegato) sotto Sua esclusiva responsabilità. | INIZIO SCARICO | Il legale rappresentante, MARIA NASONI |
| CODICE CUP | CODICE CIG 933605437C | FINE SCARICO | FIRMA DEL DESTINATARIO |
| NOTE | | | Con la firma del presente d.d.t. vengono integralmente accettate dal ricevente tutte le condizioni generali in uso per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il calcestruzzo di cui al presente d.d.t. è rispondente a quanto ordinato e deve essere impiegato ai sensi della legge n.1086 del 5/10/1971 e successive modifiche. |



I certificati originali sono disponibili nel nostro sito web www.costruzioninasoni.it oppure potrete richiederne copia al numero di fax 071 7950286

Certificato numero CLS-0275, del processo di produzione di fabbrica ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

RINA PROCESSO CERTIFICATO

costruzioninasoni

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/1996)

| D.D.T. NUMERO | DATA | PAGINE |
|---|---|---|
| 118 | 14/01/25 | 1 di 1 |

| COD. CLIENTE | PARTITA IVA | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| 00191 | IT00982160426 | 00982160426 |


**Costruzioni Nasoni s.r.l.**
Cap. Soc.€ 500.000,00 i.v.
Partita IVA 00675940415
C.F./Reg. Imprese di Pesaro 00675940415
R.E.A. (PU) 87972
**Sede Amministrativa**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Sede legale**
Via Einaudi, 24
61032 Fano (PU)

**Ufficio tecnico**
Via Cesanense, 174
61040 Monteporzio (PU)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Impianto produzione**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950040

costruzioni@nasoni.it
www.costruzioninasoni.it


SPETTABILE

**IMPR. COSTR. MENTUCCI ALDO S.R.L.**
VIA MARCHE, 38
60019 SENIGALLIA (AN)

TIPO DOCUMENTO

**DOCUMENTO DI TRASPORTO ● CALCESTRUZZO**

| INCARICATO DEL TRASPORTO | | | | CAUSALE DEL TRASPORTO |
|---|---|---|---|---|
| MITTENTE | | | | VENDITA |
| **DATA TRASPORTO** | **ORA TRASPORTO** | **TARGA AUTOMEZZO** | **TARGA RIMORCHIO** | **DESTINAZIONE DELLA MERCE** |
| 14/01/25 | 10:17 | GA389NC | | S. LORENZO IN CAMPO -PONTE SUL CESANO- |

| PRODOTTI, BENI, SERVIZI | | | |
|---|---|---|---|
| **Codice** | **Descrizione** | **U.M.** | **Quantità** |
| C45S525D3 | CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE C35/45 S5 D25 XD3 | mc | 8,00 |

| TEMPERATURA °C | TIPOLOGIA CEMENTO | DIAM. MAX | CONSISTENZA CLASSE | CLASSE DI ESPOSIZIONE | FIRMA OPERATORE IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IV/A (V) 42.5 | 25 | S5 | XD3 | |
| **CONDIZIONI METEO** | **ACQUA/CEMENTO MAX.** | **CLORURI** | **MASSA VOLUMICA** | **ADDITIVI** | |
| | 0,45 | < 0,40 | | | |

OGGETTO

**COPIA PER IL DESTINATARIO**

| OGGETTO | | ORA DI INIZIO CARICO | |
|---|---|---|---|
| **Aggiunte in cantiere richieste dal cliente (o suo delegato)** | | | |
| AGGIUNTA ACQUA | | ORA DI ARRIVO IN CANTIERE | DICHIARAZIONE MERCI TRASPORTATE IN CONTO PROPRIO Estratto dell'art. 39 della legge 298/74. Il sottoscritto titolare di licenza dell'autotrasporto di cose in conto proprio n° C8D4HH dichiara che le cose trasportate sono da noi prodotte e vendute. |
| AGGIUNTA DI MATERIALE | Le aggiunte indicate sono state richieste dal cliente (o suo delegato) sotto Sua esclusiva responsabilità. | INIZIO SCARICO | Il legale rappresentante, MARIA NASONI |
| CODICE CUP | CODICE CIG 933605437C | FINE SCARICO | |
| NOTE | | | Con la firma del presente d.d.t. vengono integralmente accettate dal ricevente tutte le condizioni generali in uso per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il calcestruzzo di cui al presente d.d.t. è rispondente a quanto ordinato e deve essere impiegato ai sensi della legge n.1086 del 5/10/1971 e successive modifiche. |



I certificati originali sono disponibili nel nostro sito web www.costruzioninasoni.it oppure potrete richiederne copia al numero di fax 071 7950286

Certificato numero CLS-0275, del processo di produzione di fabbrica ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

RINA
PROCESSO CERTIFICATO

costruzioninasoni

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472 14/08/1996)

| D.D.T. NUMERO | DATA | PAGINE |
|---|---|---|
| 141 | 15/01/25 | 1 di 1 |

| COD. CLIENTE | PARTITA IVA | CODICE FISCALE |
|---|---|---|
| 00191 | IT00982160426 | 00982160426 |


**Costruzioni Nasoni s.r.l.**
Cap. Soc.€ 500.000,00 i.v.
Partita IVA 00675940415
C.F./Reg. Imprese di Pesaro 00675940415
R.E.A. (PU) 87972
**Sede Amministrativa**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Sede legale**
Via Einaudi, 24
61032 Fano (PU)

**Ufficio tecnico**
Via Cesanense, 174
61040 Monteporzio (PU)
Tel. 071 7950310
Fax 071 7950286

**Impianto produzione**
Via Ripabianca, 12
60012 Trecastelli (AN)
Tel. 071 7950040

costruzioni@nasoni.it
www.costruzioninasoni.it


SPETTABILE

**IMPR. COSTR. MENTUCCI ALDO S.R.L.**
VIA MARCHE, 38
60019 SENIGALLIA (AN)

TIPO DOCUMENTO
**DOCUMENTO DI TRASPORTO ● CALCESTRUZZO**

| INCARICATO DEL TRASPORTO | | | | CAUSALE DEL TRASPORTO |
|---|---|---|---|---|
| MITTENTE | | | | VENDITA |
| **DATA TRASPORTO** | **ORA TRASPORTO** | **TARGA AUTOMEZZO** | **TARGA RIMORCHIO** | **DESTINAZIONE DELLA MERCE** |
| 15/01/25 | 09:13 | FJ964KG | | S. LORENZO IN CAMPO -PONTE SUL CESANO- |

| PRODOTTI, BENI, SERVIZI<br>Codice | Descrizione | U.M. | Quantità |
|---|---|---|---|
| C45S525D3 | CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE C35/45 S5 D25 XD3 | mc | 8,50 |

| TEMPERATURA °C | TIPOLOGIA CEMENTO | DIAM. MAX | CONSISTENZA CLASSE | CLASSE DI ESPOSIZIONE | FIRMA OPERATORE IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IV/A (V) 42.5 | 25 | S5 | XD3 | |
| CONDIZIONI METEO | ACQUA/CEMENTO MAX. | CLORURI | MASSA VOLUMICA | ADDITIVI | |
| | 0,45 | < 0,40 | | | |

OGGETTO
**COPIA PER IL DESTINATARIO**

OGGETTO
**Aggiunte in cantiere richieste dal cliente (o suo delegato)**

| AGGIUNTA ACQUA | FIRMA PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ | ORA DI INIZIO CARICO | |
|---|---|---|---|
| 90 | Le aggiunte indicate sono state richieste dal cliente (o suo delegato) sotto Sua esclusiva responsabilità. | ORA DI ARRIVO IN CANTIERE 10.00 | DICHIARAZIONE MERCI TRASPORTATE IN CONTO PROPRIO Estratto dell'art. 39 della legge 298/74. Il sottoscritto titolare di licenza dell'autotrasporto di cose in conto proprio n° C8D4HH dichiara che le cose trasportate sono da noi prodotte e vendute. |
| AGGIUNTA DI MATERIALE | | INIZIO SCARICO 10.00 | Il legale rappresentante, MARIA NASONI |
| CODICE CUP | CODICE CIG 933605437C | FINE SCARICO 10.35 | |
| NOTE | | | Con la firma del presente d.d.t. vengono integralmente accettate dal ricevente tutte le condizioni generali in uso per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato. Il calcestruzzo di cui al presente d.d.t. è rispondente a quanto ordinato e deve essere impiegato ai sensi della legge n.1086 del 5/10/1971 e successive modifiche. |



I certificati originali sono disponibili nel nostro sito web www.costruzioninasoni.it oppure potrete richiederne copia al numero di fax 071 7950286

Certificato numero CLS-0275, del processo di produzione di fabbrica ai sensi del decreto ministeriale infrastrutture 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"

RINA
PROCESSO CERTIFICATO
D.M. 14/01/2008
Calcestruzzo
Preconfezionato

FCI Ferro Centro Italia
centro sagomatura ferro per cemento armato
commercio e lavorazione prodotti siderurgici

FERRO CENTRO ITALIA S.R.L.
ViaC.Colombo, 10 62024 MATELICA MC
Partita Iva e Codice Fiscale 02636940427
telefono 0737.787458
e-mail ferrocentroitalia@gmail.com

# DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE ALLEGATA AL DOCUMENTO DI TRASPORTO n.1499 / MAT del 12/11/2024

**INTESTATO A SPETT.LE DITTA IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.**
VIA MARCHE N° 38
SENIGALLIA 60019 AN

Il materiale relativo all'allegato documento di trasporto è stato lavorato presso il nostro stabilimento di Matelica il giorno 08/11/2024 e sono stati eseguiti i controlli delle lavorazioni previsti al D.M. 14/01/2008 e prelevati i campioni da sottoporre alle prove previste dal D.M. 14/01/2018 a carico del Centro di Trasformazione da parte di un laboratorio qualificato

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale

## ATTESTATO DI DENUNCIA DELL'ATTIVITA' DI CENTRO DI TRASFORMAZIONE

**N. 3460/16**

In conformità al DM 14 gennaio 2008 **"Norme Tecniche per le Costruzioni"** si attesta che la Ditta:

**FERRO CENTRO ITALIA Srl**
Via Marina, 50/a – 60018 – MONTEMARCIANO (AN)

per il proprio stabilimento di:

**Via Cristoforo Colombo, 10 – 62024 – MATELICA (MC)**

ha depositato presso il **Servizio Tecnico Centrale** la documentazione inerente il possesso dei requisiti richiesti dalla norma per la lavorazione dell'acciaio finalizzata alla :

**SAGOMATURA FERRO PER C.A.**

Ogni confezione del prodotto lavorato è riconducibile alla Ditta di cui sopra, con tutte le informazioni utili ad individuare la commessa, attraverso la seguente etichetta:

FCI Ferro Centro Italia
Lavorazione acciaio per cemento armato
FERRO CENTRO ITALIA SRL

Il presente attestato di deposito ha il solo obiettivo di identificare il Centro di Trasformazione. In tal senso l'attestato di deposito non è finalizzato a certificare la concreta idoneità tecnica del prodotto di lavorazione alle diverse utilizzazioni in cui può essere destinato e non può trasferire la responsabilità del Centro di Trasformazione e del progettista al Servizio Tecnico Centrale, restando nella responsabilità delle figure suddette ogni specifica applicazione del prodotto. **L'attività di Centro di Trasformazione non include la produzione di reti e tralicci elettrosaldati, i quali sono soggetti alle procedure di qualificazione di cui al p.to 11.3.2.5 delle Norme Tecniche per le Costruzioni**
Il presente attestato ha validità sino a che le condizioni iniziali, sulla base delle quali è stato rilasciato, non subiscano modifiche significative.

*Roma, 14.12.2016*

*IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE III DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE*
***Ing. Marco PANECALDO***

*ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE TECNICA NAZIONALE AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008*

*VIA NOMENTANA, 2 -00161 ROMA- TEL. 06.4412.4101 WWW.CSLP.IT*

**IL DIRETTORE TECNICO** ***DOTT. ING. MARCO MODESTI***



FERRO CENTRO ITALIA S.R.L.
Partita Iva e Codice Fiscale 02636940427
Via C.Colombo,10 62024 MATELICA MC
telefono 0737.787458
e-mail info@ferrocentroitalia.it

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

*(d.p.r. 472 DEL 14/08/1996)*

| N. DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO |
|---|---|
| 1499 / MAT | 12/11/2024 |

*CAUSALE DEL TRASPORTO*
VENDITA

*ASPETTO ESTERIORE DEI BENI*
FASCI

*DESTINATARIO*
IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.

VIA MARCHE N° 38
60019 SENIGALLIA AN
*PARTITA IVA / CODICE FISCALE* 00982160426

*LUOGO DESTINAZIONE MERCE*
CANTIERE S.P.14/1 "SENIGALLIA-ALBACINA"
BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160
OPERA N.112 - COD.INT.86.05
*CIG* 933605437C *CUP* H47H18001370001

| COD | DESCRIZIONE ARTICOLO | UM | QUANTITA | COLLI |
|---|---|---|---|---|
| 100 | FERRO TONDINO B450C PRESAGOMATO | KG | 15.535 | 31 |

| DATA INIZIO TRASPORTO | ORA INIZIO TRASPORTO | TRASPORTO A CURA DEL | NUMERO DISTINTA |
|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | 7,30 | MITTENTE | 7634 |

CONTRIBUTO TRASPORTO N° 1

CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE N° 1

*VETTORE*

*NUMERO COLLI TOTALE* 31

PESO TOTALE KG 15.535

*NOTE*

SOSTA GRU MINUTI

*FIRMA DEL CONDUCENTE*

*FIRMA DEL DESTINATARIO*

FERRO CENTRO ITALIA S.R.L.
Partita Iva e Codice Fiscale 02636940427
Via C.Colombo,10 62024 MATELICA MC
telefono 0737.787458
e-mail info@ferrocentroitalia.it

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

*(d.p.r. 472 DEL 14/08/1996)*

| N. DOCUMENTO | DATA DOCUMENTO |
|---|---|
| 1520 / MAT | 15/11/2024 |

*CAUSALE DEL TRASPORTO*
VENDITA

*ASPETTO ESTERIORE DEI BENI*
FASCI

*DESTINATARIO*
IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L.

VIA MARCHE N° 38
60019 SENIGALLIA AN
*PARTITA IVA / CODICE FISCALE* 00982160426

*LUOGO DESTINAZIONE MERCE*
CANTIERE S.P.14/1 "SENIGALLIA-ALBACINA"
BRACCIO NIDASTORE AL KM 04+160
OPERA N.112 - COD.INT.86.05
*CIG* 933605437C *CUP* H47H18001370001

| COD | DESCRIZIONE ARTICOLO | UM | QUANTITA | COLLI |
|---|---|---|---|---|
| 100 | FERRO TONDINO B450C PRESAGOMATO | KG | 1.450 | 4 |

| DATA INIZIO TRASPORTO | ORA INIZIO TRASPORTO | TRASPORTO A CURA DEL | NUMERO DISTINTA |
|---|---|---|---|
| 15/11/2024 | 8,00 | MITTENTE | 7634 |

CONTRIBUTO TRASPORTO N° 1

CONTRIBUTO CERTIFICAZIONE N° 1

*VETTORE*

*NUMERO COLLI TOTALE* 4

PESO TOTALE KG 1.450

*NOTE*

SOSTA GRU MINUTI

*FIRMA DEL CONDUCENTE*

*FIRMA DEL DESTINATARIO*

FCI Ferro Centro Italia
centro sagomatura ferro per cemento armato
commercio e lavorazione prodotti siderurgici

FERRO CENTRO ITALIA S.R.L.
Via C.Colombo,10 62024 MATELICA MC
Partita Iva e Codice Fiscale 02636940427
telefono 0737.787458
e-mail ferrocentroitalia@gmail.com

**CERTIFICATO ALLEGATO AL DOCUMENTO DI TRASPORTO n.1499 / MAT del 12/11/2024**

***INTESTATO A SPETT.LE DITTA*** **IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.**
VIA MARCHE N° 38
SENIGALLIA 60019 AN

DBPix Evaluation

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale

## ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
## 036/23-CA

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

**ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO**

***B450C**, saldabile, in barre, nei diametri da 8 a 40 mm*

Marchio di laminazione




ovvero , con diversa disposizione delle nervature




prodotto da:

**FERRIERA VALSABBIA S.p.a**
**Via Marconi, 13/15 – 25076 Odolo (BS)**

nello stabilimento di:

**ODOLO (BS), Via Marconi, 13/15**

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale DICATA-Laboratorio Prove Materiali "Pietro Pisa" di Brescia e il **Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici** ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

**D.M. 17.01.2018: "Norme tecniche per le costruzioni"**

sono state applicate.

Il presente attestato rinnova il n. **042/18-CA** ed ha validità dal **04.12.2023** al **03.12.2028** o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 27.11.2023

ALESSANDRO PENTIMALLI MIMS 27.11.2023 15:05:22 UTC

IL DIRIGENTE DELLA DIV. I DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
*Dott. Ing. Alessandro Pentimalli*

VIA NOMENTANA 2 – 00161 ROMA
www.cslp.it

ORGANISMO DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE AI SENSI DEL D.M. 17.01.2018

www.ammara.com

FCI Ferro Centro Italia
centro sagomatura ferro per cemento armato
commercio e lavorazione prodotti siderurgici

FERRO CENTRO ITALIA S.R.L.
Via C.Colombo,10 62024 MATELICA MC
Partita Iva e Codice Fiscale 02636940427
telefono 0737.787458
e-mail ferrocentroitalia@gmail.com

# CERTIFICATO ALLEGATO AL DOCUMENTO DI TRASPORTO n.1499 / MAT del 12/11/2024

***INTESTATO A SPETT.LE DITTA*** **IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.**
VIA MARCHE N° 38
SENIGALLIA 60019 AN

DBPix Evaluation

FerrieraValsabbia

## Certificato di collaudo
in accordo con EN 10204:2004 - tipo 3.1

Cliente: **HABITAT SRL**
**VIA SENEGHINI 7 - 60043 CERRETO D'ESI (AN)**

Certificato prove meccaniche: **WPM39712/2024 - 06/11/2024** **Pag. 1 di 2**
Relativo a: **FI/018293 - 05/11/2024**
Prodotto: **B450C - D.M. 17 Gennaio 2018**

| Colata | Prova n° | Dn mm | De mm | Area mm² | Tol % | Fy N | fy N/mm² | Ft N | ft N/mm² | t/y | Fy/450 | $A_5$ % | $A_{gt}$ % | Ir | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4912 | 1 | 14,0 | 13,85 | 153,94 | -2,2 | 85.980 | 559 | 100.580 | 653 | 1,17 | 1,24 | 19,4 | 10,9 | 0,074 | + |
| Z4912 | 2 | 14,0 | 13,87 | 153,94 | -1,8 | 85.510 | 555 | 100.560 | 653 | 1,18 | 1,23 | 19,7 | 10,6 | 0,071 | + |
| Z4912 | 3 | 14,0 | 13,81 | 153,94 | -2,8 | 84.720 | 550 | 97.630 | 634 | 1,15 | 1,22 | 20,0 | 10,5 | - | + |
| Z4912 | 4 | 14,0 | 13,82 | 153,94 | -2,5 | 85.290 | 554 | 98.950 | 643 | 1,16 | 1,23 | 19,9 | 11,1 | - | + |
| Z4913 | 1 | 14,0 | 13,83 | 153,94 | -2,4 | 84.960 | 552 | 99.010 | 643 | 1,17 | 1,23 | 19,7 | 10,7 | 0,070 | + |
| Z4913 | 2 | 14,0 | 13,86 | 153,94 | -2,0 | 86.330 | 561 | 100.190 | 651 | 1,16 | 1,25 | 19,9 | 10,8 | 0,069 | + |
| Z4913 | 3 | 14,0 | 13,82 | 153,94 | -2,6 | 84.040 | 546 | 96.900 | 629 | 1,15 | 1,21 | 20,0 | 10,7 | - | + |
| Z4913 | 4 | 14,0 | 13,87 | 153,94 | -1,8 | 85.410 | 555 | 99.150 | 644 | 1,16 | 1,23 | 20,3 | 10,6 | - | + |
| Z5344 | 1 | 16,0 | 15,84 | 201,06 | -2,0 | 108.570 | 540 | 130.590 | 650 | 1,20 | 1,20 | 20,1 | 10,9 | 0,067 | + |
| Z5344 | 2 | 16,0 | 15,82 | 201,06 | -2,2 | 112.220 | 558 | 132.480 | 659 | 1,18 | 1,24 | 19,9 | 10,8 | 0,066 | + |
| Z5344 | 3 | 16,0 | 15,83 | 201,06 | -2,2 | 109.290 | 544 | 131.450 | 654 | 1,20 | 1,21 | 20,0 | 10,8 | - | + |
| Z5344 | 4 | 16,0 | 15,82 | 201,06 | -2,3 | 111.210 | 553 | 132.780 | 660 | 1,19 | 1,23 | 20,3 | 10,6 | - | + |
| Z5405 | 1 | 16,0 | 15,84 | 201,06 | -1,9 | 110.690 | 551 | 132.960 | 661 | 1,20 | 1,22 | 19,8 | 10,3 | 0,059 | + |
| Z5405 | 2 | 16,0 | 15,77 | 201,06 | -2,8 | 113.460 | 564 | 135.950 | 676 | 1,20 | 1,25 | 19,6 | 10,5 | 0,066 | + |
| Z5405 | 3 | 16,0 | 15,87 | 201,06 | -1,6 | 110.910 | 552 | 132.620 | 660 | 1,20 | 1,23 | 20,3 | 10,6 | - | + |
| Z5405 | 4 | 16,0 | 15,81 | 201,06 | -2,4 | 112.510 | 560 | 134.940 | 671 | 1,20 | 1,24 | 20,3 | 10,8 | - | + |
| Z5406 | 1 | 16,0 | 15,80 | 201,06 | -2,4 | 107.760 | 536 | 131.470 | 654 | 1,22 | 1,19 | 20,0 | 10,3 | 0,062 | + |
| Z5406 | 2 | 16,0 | 15,77 | 201,06 | -2,9 | 111.310 | 554 | 133.970 | 666 | 1,20 | 1,23 | 20,3 | 10,7 | 0,068 | + |
| Z5406 | 3 | 16,0 | 15,81 | 201,06 | -2,4 | 107.080 | 533 | 131.680 | 655 | 1,23 | 1,18 | 19,4 | 10,2 | - | + |
| Z5406 | 4 | 16,0 | 15,77 | 201,06 | -2,9 | 112.100 | 558 | 135.540 | 674 | 1,21 | 1,24 | 19,1 | 10,1 | - | + |

P = (prova di piegamento e raddrizzamento) : + Favorevole

0 4 1 9

0 4 1 9

CEO

Il presente certificato attesta la conformità del prodotto qui riportato alla normativa di riferimento specificata nell'ordine.
I legacci non sono idonei al sollevamento dei fasci

M824-52(I)Rev.5

Ferriera Valsabbia S.p.A.-Acciaierie e Ferriere
Via Marconi 13
I-25076 Odolo (BS)Italia
Tel. +39 0365 8270
Fax +39 0365 826150
www.ferriera-valsabbia.com
info@ferriera-valsabbia.com
C.C.I.A.A. di . BS - R.E.A. n° 325594
Cod. Fisc. e Reg. Imp. n° 03108690177
Cap. Soc. € 25.000.000 I.V.
Part. I.V.A. n° 02105240986

Sistema di gestione per la qualità certificato da IGQ secondo la norma ISO 9001:2015 IGQ 9006
Sistema di gestione ambientale certificato da IGQ secondo la norma ISO 14001:2015 IGQA2F09
Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato da IGQ secondo la norma ISO 45001:2018 IGQ 52L10

www.ammara.com

FCI Ferro Centro Italia
centro sagomatura ferro per cemento armato
commercio e lavorazione prodotti siderurgici

FERRO CENTRO ITALIA S.R.L.
Via C.Colombo,10 62024 MATELICA MC
Partita Iva e Codice Fiscale 02636940427
telefono 0737.787458
e-mail ferrocentroitalia@gmail.com

**CERTIFICATO ALLEGATO AL DOCUMENTO DI TRASPORTO n.1499 / MAT del 12/11/2024**

***INTESTATO A SPETT.LE DITTA*** **IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.**
VIA MARCHE N° 38
SENIGALLIA 60019 AN

DBPix Evaluation

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale

## ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
### 036/23-CA

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

**ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO**

***B450C**, saldabile, in barre, nei diametri da 8 a 40 mm*

Marchio di laminazione




ovvero , con diversa disposizione delle nervature




prodotto da:

**FERRIERA VALSABBIA S.p.a**
**Via Marconi, 13/15 – 25076 Odolo (BS)**

nello stabilimento di:

**ODOLO (BS), Via Marconi, 13/15**

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale DICATA-Laboratorio Prove Materiali "Pietro Pisa" di Brescia e il **Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici** ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

**D.M. 17.01.2018: "Norme tecniche per le costruzioni"**

sono state applicate.

Il presente attestato rinnova il n. **042/18-CA** ed ha validità dal **04.12.2023** al **03.12.2028** o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 27.11.2023

ALESSANDRO PENTIMALLI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
27.11.2023 15:05:22 UTC

IL DIRIGENTE DELLA DIV. I DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
*Dott. Ing. Alessandro Pentimalli*

ORGANISMO DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE AI SENSI DEL D.M. 17.01.2018

VIA NOMENTANA 2 – 00161 ROMA
www.cslp.it

www.ammara.com

FCI Ferro Centro Italia
centro sagomatura ferro per cemento armato
commercio e lavorazione prodotti siderurgici

FERRO CENTRO ITALIA S.R.L.
Via C.Colombo,10 62024 MATELICA MC
Partita Iva e Codice Fiscale 02636940427
telefono 0737.787458
e-mail ferrocentroitalia@gmail.com

**CERTIFICATO ALLEGATO AL DOCUMENTO DI TRASPORTO n.1499 / MAT del 12/11/2024**

***INTESTATO A SPETT.LE DITTA*** **IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.**
VIA MARCHE N° 38
SENIGALLIA 60019 AN

DBPix Evaluation

FerrieraValsabbia

## Certificato di collaudo
in accordo con EN 10204:2004 - tipo 3.1

Cliente: **FERRO CENTRO ITALIA SRL**
**VIA C.COLOMBO 10 - 62024 MATELICA (MC)**

Certificato prove meccaniche: **WPM39821/2024 - 07/11/2024** **Pag. 1 di 2**
Relativo a: **FI/018362 - 06/11/2024**
Prodotto: **B450C - D.M. 17 Gennaio 2018**

| Colata | Prova n° | Dn mm | De mm | Area mm² | Tol % | Fy N | fy N/mm² | Ft N | ft N/mm² | t/y | Fy/450 | $A_5$ % | $A_{gt}$ % | Ir | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z4973 | 1 | 18,0 | 17,76 | 254,47 | -2,7 | 134.240 | 528 | 165.020 | 648 | 1,23 | 1,17 | 20,3 | 11,1 | 0,080 | + |
| Z4973 | 2 | 18,0 | 17,79 | 254,47 | -2,3 | 138.910 | 546 | 167.860 | 660 | 1,21 | 1,21 | 19,4 | 10,7 | 0,073 | + |
| Z4973 | 3 | 18,0 | 17,72 | 254,47 | -3,1 | 133.940 | 526 | 163.070 | 641 | 1,22 | 1,17 | 19,6 | 10,9 | - | + |
| Z4973 | 4 | 18,0 | 17,74 | 254,47 | -2,9 | 138.080 | 543 | 164.860 | 648 | 1,19 | 1,21 | 18,8 | 10,7 | - | + |
| Z5517 | 1 | 12,0 | 11,82 | 113,10 | -3,0 | 59.860 | 529 | 71.100 | 629 | 1,19 | 1,18 | 21,0 | 10,7 | 0,077 | + |
| Z5517 | 2 | 12,0 | 11,84 | 113,10 | -2,6 | 61.180 | 541 | 72.190 | 638 | 1,18 | 1,20 | 20,2 | 10,7 | 0,076 | + |
| Z5517 | 3 | 12,0 | 11,81 | 113,10 | -3,1 | 59.510 | 526 | 71.120 | 629 | 1,20 | 1,17 | 20,0 | 10,3 | - | + |
| Z5517 | 4 | 12,0 | 11,84 | 113,10 | -2,6 | 60.740 | 537 | 72.310 | 639 | 1,19 | 1,19 | 19,5 | 10,0 | - | + |
| Z5595 | 1 | 12,0 | 11,86 | 113,10 | -2,3 | 61.420 | 543 | 74.420 | 658 | 1,21 | 1,21 | 20,0 | 10,3 | 0,077 | + |
| Z5595 | 2 | 12,0 | 11,86 | 113,10 | -2,4 | 61.640 | 545 | 74.540 | 659 | 1,21 | 1,21 | 20,0 | 10,7 | 0,077 | + |
| Z5595 | 3 | 12,0 | 11,75 | 113,10 | -4,2 | 58.390 | 516 | 70.350 | 622 | 1,20 | 1,15 | 20,3 | 10,8 | - | + |
| Z5595 | 4 | 12,0 | 11,78 | 113,10 | -3,6 | 59.250 | 524 | 70.570 | 624 | 1,19 | 1,16 | 20,2 | 10,7 | - | + |

P = (prova di piegamento e raddrizzamento) : + Favorevole

0 4 1 9

0 4 1 9

CEO

Il presente certificato attesta la conformità del prodotto qui riportato alla normativa di riferimento specificata nell'ordine.
I legacci non sono idonei al sollevamento dei fasci

M824-52(I)Rev.5

Ferriera Valsabbia S.p.A.-Acciaierie e Ferriere
Via Marconi 13
I-25076 Odolo (BS)Italia
Tel. +39 0365 8270
Fax +39 0365 826150
www.ferriera-valsabbia.com
info@ferriera-valsabbia.com
C.C.I.A.A. di . BS - R.E.A. n° 325594
Cod. Fisc. e Reg. Imp. n° 03108690177
Cap. Soc. € 25.000.000 I.V.
Part. I.V.A. n° 02105240986

Sistema di gestione per la qualità certificato da IGQ secondo la norma ISO 9001:2015 IGQ 9006
Sistema di gestione ambientale certificato da IGQ secondo la norma ISO 14001:2015 IGQA2F09
Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato da IGQ secondo la norma ISO 45001:2018 IGQ 52L10

www.ammara.com

H2 Bordo Ponte

# ACCIAIO CLASSE H2 BORDO PONTE W4

DISPONIBILE ANCHE CON CORRIMANO PEDONALE

| | |
|---|---|
| ACCIAIO | ZINCATO S355JR |
| CERTIFICAZIONE | CE |
| LARGHEZZA DI FUNZIONAMENTO | W4 |
| ALTEZZA FUORI TERRA | 89 - 110 cm |
| INGOMBRO TRASVERSALE | 20,2 cm |
| INTERASSE PALI | 200 cm |
| ESTENSIONE BARRIERA TESTATA | 72 ml terminali inclusi |
| DIMENSIONI PALO | C120 x 60 x 20 x 778 mm |
| DIMENSIONI PIASTRA | 300 x 300 x 15 mm |



METAL WOOD SRL
38121 TRENTO (TN) - VIA INNSBRUCK 23 - LOC. INTERPORTO - TEL. 0461.827432 - INFO@METALWOOD.IT - WWW.METALWOOD.IT

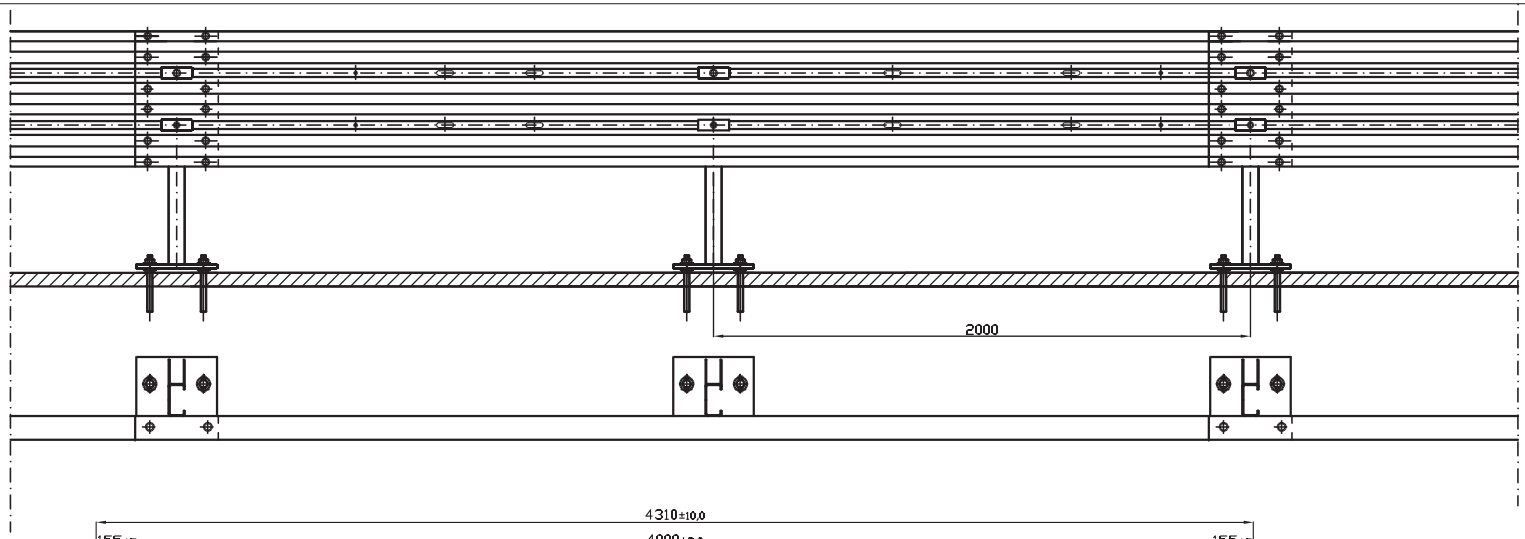


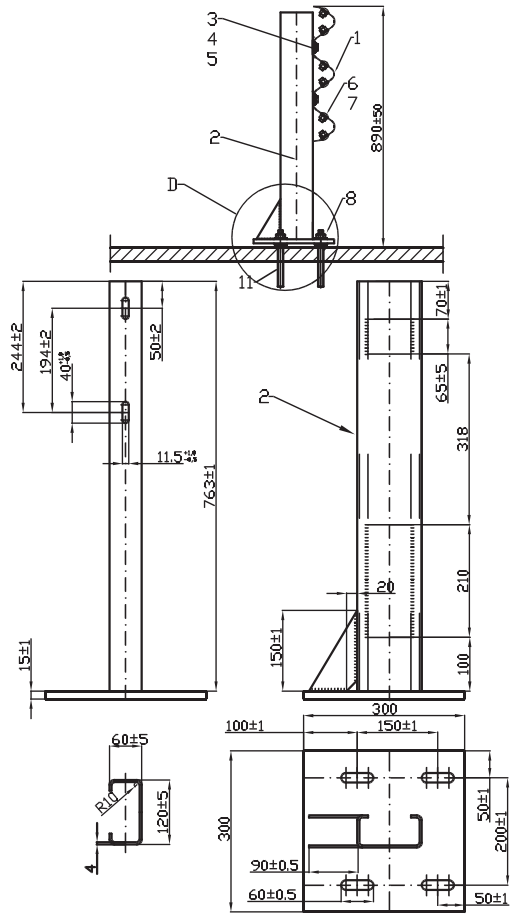


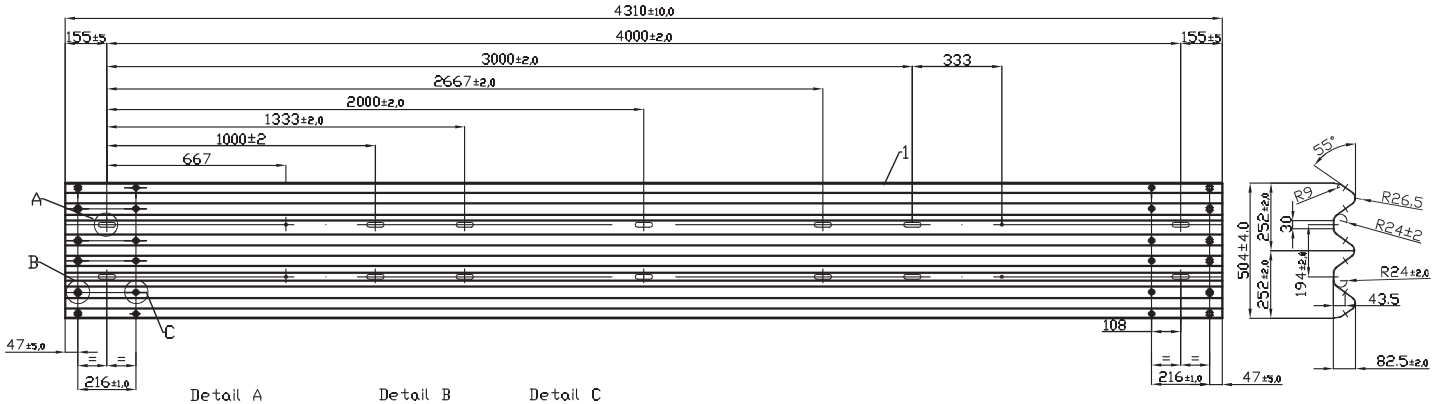


Detail A




Detail B




Detail C




Technical requirements:
1) Nominal thickness of steel δ= 2.5 ± 0.17
2) Coating - hot dip zinc galvanizing, according to EN 1461:2009

Fish plate thickness 5mm ± 0.5mm










Detail D

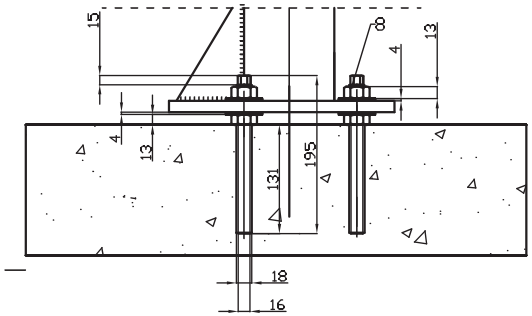


| Part Nr. | Quantity | Description | Dimension | Single-weight | Overall weight | Material / Quality | Norm | Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Beam type A with three waves | L=4310, δ=2.5 | 62.59 | 938.88 | S355JR | EN 10025-2/EN 1461 | 2.1 |
| 2 | 30 | Post, δ=2.5 with plate 300x300x15 | C120x60x20x778 | 18.03 | 540.90 | S355JR/S235JR | EN 10025-2/EN 1461 | 3.1 |
| 3 | 60 | Fish plate with hole ø11 | 100x40x5 | 0.16 | 9.42 | S235JR | EN 10025-2/EN 1461 | 5.1 |
| 4 | 60 | Hexagon bolt M10x45 with nut | M10x45 | 0.05 | 3.00 | 6.8 | EN ISO 898-1, ISO 4032 | 5.2 |
| 5 | 60 | Washer ø25 | ø25x11.5x4 | 0.013 | 0.78 | S235JR | ISO 7091 | 5.2 |
| 6 | 180 | HRK bolt M16x35 with nut | M16x35 | 0.10 | 18.00 | - | ROUND HEAD OVAL, NECK BOLT | 5.2 |
| 7 | 180 | Washer ø40 | ø40x18x4 | 0.048 | 8.64 | S235JR | ISO 7091 | 5.3 |
| 8 | 8 | Chemical anchor wit 2 nuts and 2 washers | - | - | - | - | - | |

Weight of the construction: 1519.62 kg
Weight/Running meter: 25.33 kg
Test length: 60 m

| | | |
|---|---|---|
| Surface: galvanized | General tolerance | Material: S355JR\|S235JR\|4.6\|8.8 |
| Remarks | Created by: T. Baracz | Part number |
| | Title, Additional title: passco L2 H2-A-W4 (BW-ES 2.00) 3n | Document |
| | Scale: 1:20(1:10) (1:5) | She.: 00 |
| | Date of issue: 05.05.2016 | Form.: A3 |

| *Installation Manual* | **Manuale d'installazione** |
|---|---|

# PASSCO 3N

## H2-A-W4 (BW-ES 2.00)

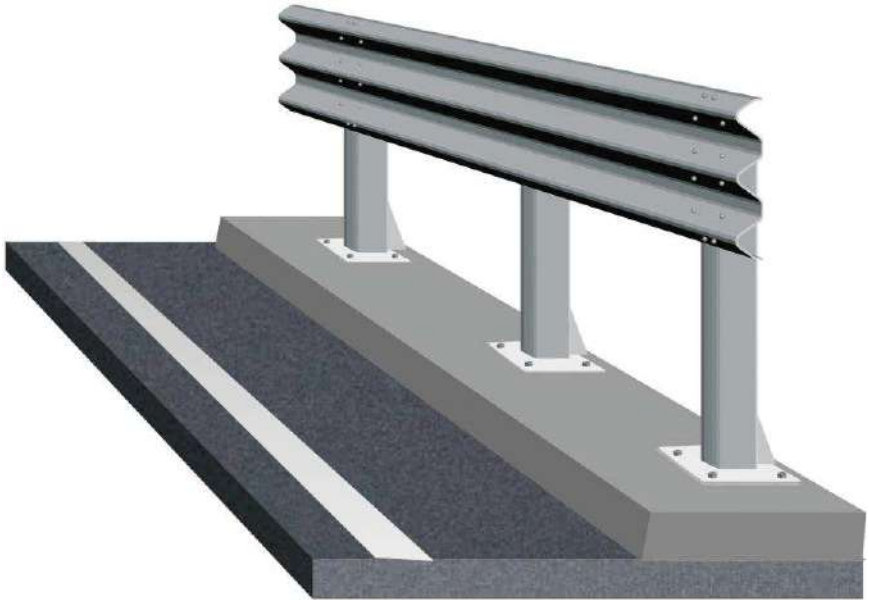


**PASS+CO INTERNATIONAL GMBH**

GRUBE NEUE HAARDT 8

57076 SIEGEN

DEUTSCHLAND

WWW.PASSCO.INTERNATIONAL


Distribuito in Italia da

metalwood.it

## 1. Content


**1. Content** ..... **3**

**2. General Information** ..... **4**

2.1 General Information for installation ..... 5

2.2 Transport and storing ..... 5

**3. Foundation** ..... **6**

**4. System assembly** ..... **6**

4.1 Fasteners ..... 8

4.2 End terminals and Transitions ..... 9

**5. Durability** ..... **9**

**6. Repair work** ..... **10**

**7. Recycling** ..... **10**

**8. Inspection and Maintenance** ..... **10**

**9. Further Information** ..... **11**

9.1 Approved Modifications ..... 11

9.2 Additional safety devices ..... 11

**10. Data sheet** ..... **12**

**11. Installation Manual** ..... **13**

**12. System drawing** ..... **14**

**13. Single part drawings** ..... **15**

**14. Part list** ..... **16**

# 1. Sommario

**1. Sommario ..... 3**

**2. Informazioni generali ..... 4**

2.1 Informazioni generali per linstallazione ..... 5

2.2 Trasporto e deposito ..... 5

**3. Fondazione ..... 6**

**4. Sistema di assemblaggio ..... 6**

4.1 Elementi di fissaggio ..... 8

4.2 Terminali e transizioni ..... 9

**5. Durabilità ..... 9**

**6. Riparazioni ..... 10**

**7. Riciclo ..... 10**

**8. Ispezioni e mantenimento ..... 10**

**9. Informazioni aggiuntive ..... 11**

9.1 Modifiche approvate ..... 11

9.2 Aggiunta sistemi di sicurezza ..... 11

**10. Scheda dati ..... 12**

**11. Manuale d'installazione ..... 13**

**12. Disegno del sistema ..... 14**

**13. Disegni parti del sistema ..... 15**

**14. Lista delle diverse parti ..... 19**

| 2. *General Information* | *2. Informazioni generali* |
|---|---|
| *The Road Restraint System (RRS) is designed for installation on road traffic areas.* | Il Sistema di Ritenuta Stradale è progettato per l'installazione su aree di traffico stradale. |
| *It is intended to protect occupants of errant vehicles on the roadway, to protect third parties and objects and can be installed in medians and side lanes as well as on verges.* | Viene creato al fine di proteggere le persone a bordo di veicoli circolanti, nonchè per proteggere terze parti e oggetti. Può essere installato sia ai lati che al centro delle corsie e ai margini della carreggiata. |
| *The construction product has been fully tested according to EN 1317. The test results have been reached by the conditions mentioned in the test report.* | Il prodotto costruito è stato pienamente testato secondo gli accordi EN 1317.I risultati di tali test sono stati raggiunti seguendo le condizioni menzionate nei rapporti di prova (crashtest). |
| *There was no parts > 2 kg that detached from the RRS when crash testing according to EN 1317.* | Secondo gli accordi EN 1317 non c'erano parti > 2 kg che si sono distaccate dal Sistema di Ritenuta Stradale quando il crash test è stato svolto. |
| *The construction product is CE certified. The CE-certification is available at the manufacturer.* | Il prodotto costruito è certificato CE. La certificazione CE può essere richiesta al produttore. |
| *The construction product does not contain toxic substances nor is subject to control of such kind.* | Il prodotto costruito non contiene alcuna sostanza tossica ne tracce di esse. |
| *The RRS is without any dangerous parts.* | Il Sistema di Ritenuta Stradale non contiene parti pericolose. |
| *The crash test does not register proof of use in restricted conditions.* | Il crash test non registra prova d'usura in condizioni limitate. |
| *A-profile and B-profile beams can be installed equivalent.* | L'utilizzo di nastri orizzontali con profilo A o B è equivalente. |

| **2.1 *General Information for installation*** | ***2.1 Informazioni generali per l'installazione*** |
|---|---|
| *The installation instructions (B-VA-TK-12) of the company PASS+CO is to be taken into consideration for installation.* | Le istruzioni d'installazione della azienda PASS+CO devono essere prese in considerazione quando è effettuata l'installazione. |
| *Trained and qualified personnel must only make the installation work. Installation companies obtain a copy of the installation manual by the holder of the test reports.* | Il personale qualificato deve unicamente occuparsi del lavoro dinstallazione. Le imprese d'installazione ottengono una copia del manuale dai titolari dei rapporti di prova. |
| *Personal protective clothing must be used when installing the RRS.* | Bisogna utilizzare abbigliamento protettivo quando si installano i Sistemi di Sicurezza Stradale. |
| *The defects liability switches from manufacturer to installer, if any changes to the specified installation requirements are made, without approval of the manufacturer.* | La responsabilità per vizi passa dal produttore all'installatore se viene fatto qualsiasi cambiamento sulle specifiche di installazione, avvenute senza l'approvazione del produttore. |
| **2.2 *Transport and storing*** | ***2.2 Trasporto e deposito*** |
| *All RRS parts are to be handled and stocked professionally.* | Tutte le parti del Sistemi di Ritenuta Stradale devono essere gestite e rifornite professionalmente. |
| *Storage and handling has to comply to manufacturer requirements, e.g. process and instructions of transport and stocking. RRS parts are to be protected against dirt, corrosion and damage. RRS parts on-site for installation have to be installed immediately.* | Deposito e gestione devono soddisfare i requisiti del produttore es.: procedimento d'installazione, istruzioni di trasporto e deposito. Le parti del Sistemi di Ritenuta Stradale devono essere protette da sporco, corrosione e altri danni. Le parti sul cantiere e pronte all'installazione devono essere installate immediatamente. |
| *There should only be material at short worksite areas (on the road, in medians or on roadsides) that will be installed within the duration of provided worksite safety. During delivery of the RRS parts, personal protective clothing must be used accordingto European regulations. When delivering the RRS parts to stock or site by truck, theload must be secured and prevent to slip* | I materiali presenti sul cantiere (sulla carreggiata, nella striscia centrale o lati della strada) verranno installati garantendo la sicurezza del cantiere.Durante la spedizione delle parti dei Sistemi di Ritenuta Stradale dev'essere utilizzato vestiario protettivo come richiesto dalla regolamentazione Europea Quando vengono spedite tramite camion le parti destinate a magazzini o cantieri, il carico/scarico dev'essere realizzato insicurezza e in modo tale da prevenire eventuali cadute. |

| **3. *Foundation*** | ***3. Fondazione*** |
|---|---|
| *The RRS was tested in soil condition 3 according to regulation DIN 18300 VOB/C.* | I Sistemi di Ritenuta Stradali sono stati testati in classi di terreno 3 secondo la regolamentazione DIN 18300 VOB/C. |
| *The areas in front and under RRS are to be installed for enough load capacity (for a car).* | Le aree in cui vengono installati i Sistemi di Ritenuta Stradale devono rispettare una determinata capacità di carico (per un'auto). |
| *Posts are driven into the soil by pneumatic or hydraulic piling machine with corresponding hammering tools for the post in question. Pneumatic piling hammer should have energy of 6 bar and minimum 420 Nm.* | I pali sono fissati al suolo da appositi strumenti di palificazione idraulica o pneumatica. Il martello pneumatico deve essere a energia d'urto 6 bar e minimo 420Nm. |
| *Hydraulic piling machines should have a pressure of minimum 70 bar.* | Il battipalo deve avere una pressione di minimo 70 bar. |
| *Before starting piling works, the area should be checked for cables, pipes or other underground objects. When driving the post into the ground, the post should not deform, especially not at contact part to the piling tool.* | Prima dell'inizio dei lavori di infissione bisogna ottenere informazioni sul sottosuolo (presenza cavi, tubi o altri oggetti). Quando i pali vengono infissi al terreno non devono essere deformati. |
| *The posts are to be installed vertical with a maximum deviation of +/- 10%.* | I pali devono essere infissi verticalmente con una massima deviazione di +/- 10 %. |
| *Shortening of the posts and special adjustments are only permitted with written approval of the customer.* | Modifiche o eventuali aggiustamenti sono permessi salvo previa approvazione scritta del cliente. |
| **4. *System assembly*** | ***4. Sistema di assemblaggio*** |
| *Before assembling the system on site, the necessary work zone safety requirements are to be implemented.* | Prima di iniziare i lavori di assemblaggio è necessario che il cantiere rispetti i requisiti di sicurezza sul lavoro. |
| *The following tools are required:*<br>– *Piling machine*<br>– *Tool to pull post*<br>– *Drill until 23 mm with drill bits*<br>– *Level* | Per il montaggio saranno necessari:<br>– Battipalo<br>– Estrattore<br>– Trapano da 23 mm con punte<br>– Livellatrice |

| | |
|---|---|
| – *Sledgehammer*<br>– *Torque key to 140 Nm with sockets*<br>– *Etc.* | – Martello<br>– Chiave dinamometrica da 140 Nm con prese<br>– Etc. |
| *The RRS does not include any pre-mounted parts and is not installed preloaded.* | I Sistemi di Ritenuta Stradale non contengono componenti precedentemente installati o usati. |
| *Beams have to overlap in the direction of traffic.* | I nastri orizzontali devono sovrapporsi nella direzione di marcia. |
| *Posts have to be installed with the closed section in direction of traffic (see paragraph 10. Data sheet).* | I pali devono essere montati con il lato chiuso parallelo al senso di marcia (guarda paragrafo 10 sulla scheda dati). |
| *In principle, the distance between the posts is not to be exceeded. If the worksite conditions do not allow a regular installation of the post distance, the post spacing may be reduced.* | Principalmente, la distanza tra un palo e l'altro non dev'essere superata. Se le caratteristiche strutturali non ne consentono la spaziatura regolare, l'interasse del palo può essere accorciata. |
| *Tolerances for installation can be seen in the relevant drawings (available at manufacturer).* | Tolleranze riguardo l'installazione vengono riportate sui disegni (disponibili presso il produttore). |
| *The height of the system is 73 cm +/- 3 cm referring to the road surface or top of curb. The distance from the system to the road surface shall be 50 cm.*<br>*Curbs with height more than 10,00 cm are to be avoided. If the curbs are higher than that (up to 20 cm), and they cannot be dismantled, an agreement must be found with the customer. If possible, the front of the beam should be in line with the curb of the surface.* | L'altezza d'installazione del sistema è di 73 cm +/- 3 rispetto al bordo superiore della carreggiata Di norma la distanza tra il bordo anteriore del sistema e il bordo stradale dev'essere di 50 cm. Cordoli con un altezza superiore a 10,00 cm devono essere evitati. Se questi fossero superiori a tale altezza e vi sia l'impossibilità di ridurli, dev'essere trovato un accordo con il cliente. Se possibile il sistema dovrebbe essere sistemato in modo che il bordo anteriore del nastro sia a filo col bordo anteriore del cordolo. |
| *In curved road sections of more than radius < 30 m, pre-bended radius beams must be used. Radius beams are available in 2,5 m graduation.* | Nelle curve devono essere utilizzati nastri calandrati con un raggio di < 30 m. Sono disponibili nastri calandrati con raggio fino a 2,5m. |
| *Beams can be cut to fit on site (cut pieces). The following conditions need to be taken into consideration:* | I nastri in alternativa possono essere modificati sul cantiere (tagliati). Durante ciò devono essere rispettate le seguenti condizioni: |

| | |
|---|---|
| – *Minimum length 750 mm*<br>– *The post distance of the system mustnot be exceeded*<br>– *Professional cuts using angle grinderor saw*<br>– *Professional drilling for bolt holes*<br>– *Professional maintenance of cuts and drilled holes using zinc spay overlay material.* | – Lunghezza minima 750 mm<br>– Non superare l'interasse dei pali che viene specificata dal Sistema di Ritenuta Stradale<br>– I tagli professionali devono essere effettuati utilizzando smerigliatrice o sega<br>– Foratura professionale per i fori di bulloni e viti<br>– Ritocco professionale di interfacce e fori mediante l'utilizzo di materiale di rivestimento in polvere di zinco. |
| *The system can also be used on embankments. On falling embankments with a slope of more than 1:20, extended posts must be used in relation to the extent of the slope.*<br><br>*Flaring of the system is possible, if structural situations demand it.*<br><br>*Details and special adjustments have to be arranged with the customer.* | Il sistema può essere realizzato anche su argini in pendenza. Nel caso di argini con una pendenza superiore a 1:20, devono essere utilizzati pali più lunghi, a seconda dell'inclinazione del pendio.<br><br>In particolari situazioni strutturali è possibile una rotazione laterale dei sistemi.<br><br>Dettagli e misure speciali devono essere accordati col cliente. |
| **4.1 *Fasteners*** | ***4.1 Elementi di fissaggio*** |
| *Nuts must fit manually and be tightened with torque wrench tools (minimum 70 Nm).*<br><br>*All fixtures must be fitted vertically to the connecting parts.*<br><br>*The nose tip of the bolts at joint connections of the beam must be fitted at drop hole. In principle, only galvanized fasteners are to be used.*<br><br>*The grade 4.6 and 8.8 are not be changed. Fasteners that have been mounted once, are not allowed to be used again.* | I dadi devono essere serrati a mano e poi con chiave dinamometrica (minimo 70 Nm).<br><br>Tutti i sistemi di montaggio devono essere montati verticalemente.<br>Il bullone dev'essere infilato nel foro e deve appoggiare sulla parte esterna del nastro. In particolare, vanno itlizzati solo bulloni zincati a caldo<br>.<br>Le classi di resistenza 4.6 e 8.8 non devono essere cambiate. Gli elementi di fissaggio che vengono montati una volta non possono essere utilizzati nuovamente. |

| **4.2 *End terminals and Transitions*** | ***4.2 Terminali e transizioni*** |
|---|---|
| *The RRS was tested with 12 meters sloped down end terminal. Other end terminals canbe connected to the RRS in correspondence with the customer and the manufacturer. In principle, it is recommended to use tested end terminals.*<br><br>*The RRS qualifies to be transitioned to other RRS according to NF058.*<br><br>*Specific information can be requested from the manufacturer.* | Il Sistema si Ritenuta Stradale è stato testato con un abbassamento di 12 metri. Gli altri terminali possono essere collegati previo accordo tra cliente e produttore. Principalmente, si raccomanda di utilizzare terminali testati.<br><br>Tale sistema è qualificato per poter essere collegato ad altri Sistemi di Ritenuta stradale secondo NF058.<br><br>Informazioni specifiche possono essere richieste dal produttore. |
| **5. *Durability*** | ***5. Durabilità*** |
| *The minimum coating thickness for fasteners at respective measuring points must be 40 µm in accordance with EN ISO 10684.*<br><br>*Galvanising of bolts and steel is made according to EN ISO 1461 and 1179.*<br><br>*Depending on the atmospheric corrosion, a durability of 25 years can be expected.*<br><br>*Further information is available by the manufacturer declaration according to CPR 305/2011.* | Lo spessore minimo per gli elementi di fissaggio nei rispettivi punti di misurazione deve essere di 40 µm secondo quanto specificato in ENISO 10684.<br><br>La zincatura dei bulloni d'acciaio è realizzata secondo quanto stabilito da EN ISO 1461 e 1179.<br>La durabilità dei sistemi è solitamente di 25 anni, ma dipende dalla condizione atmosferica.<br><br>Maggiori informazioni sono disponibili nella dichiarazione del produttore secondo CPR 305/2011. |

| **6. *Repair work*** | ***6. Riparazioni*** |
|---|---|
| *In principle, only those components that have residual (plastic) deformation need to be replaced.*<br><br>*If there are merely minor deformations of components, replacement is not necessary.*<br><br>*If posts are damaged, they need to be replaced.*<br><br>*If straightening the system is not possible, and if more than one component is damaged, the damaged parts of the system must be replaced completely but modular in4-meter sections. All dismounted fasteners must be replaced with new ones.*<br><br>*Galvanised surfaces shall not be damaged. Minor defective sports of the galvanised surfaces must be threatened with application of zinc dust coating.*<br><br>*Any professional contractor can easily undertake repair work.* | Principalmente, tutti i componenti del sistema che presentano permanenti deformazioni devono essere sostituiti.<br><br>Se invece sui componenti sono presenti minime deformazioni la sostituzione non è necessaria.<br>Se i pali sono danneggiati devono essere sostituiti.<br><br>Se raddrizzare il sistema non è possibile e se cè più di una componente danneggiata, le parti danneggiate devono essere completamente sostitutite con moduli da sezioni di 4 metri. Tutti gli elementi di fissaggio smontati devono essere sostituiti da nuovi elementi.<br>È importante evitare danni alle superfici zincate. Piccoli difetti sulle superfici zincate devono essere trattati con polvere di zinco.<br><br>Ogni installatore professionale può facilmente intraprendere lavori di riparazione. |
| **7. Recycling** | ***7. Riciclo*** |
| *All damaged parts can be recycled according to legal and local waste disposalregulations.* | Tutte le parti danneggiate possono essere riciclate in accordo con le regolamentazioni legali e locali riguardanti il riciclo. |
| **8. *Inspection and Maintenance*** | ***8. Ispezione e mantenimento*** |
| *The system is maintenance free. If possible,a visual check should be made annually.* | Il sistema non necessita di manutenzione.<br>Se possibile può essere effettuato un controllo visivo annuale |

| | |
|---|---|
| **9.*Further Information*** | ***9. Informazioni aggiuntive*** |
| **9.1 *Approved Modifications*** | ***9.1 Modifiche approvate*** |
| *Approved modifications are mentioned onthe relevant CE-certification.* | Le modifiche approvate vengono menzionate nella certificazione CE |
| **9.2 *Additional safety devices*** | ***9.2 Aggiunta sistemi di sicurezza*** |
| *The customer must plan the installation of additional safety devices and get information by the manufacturer.* | Il cliente può pianificare l'installazione di dispositivi di sicurezza aggiuntivi e chiedere informazioni al produttore |

## 10. Data sheet

*10. Scheda dati*

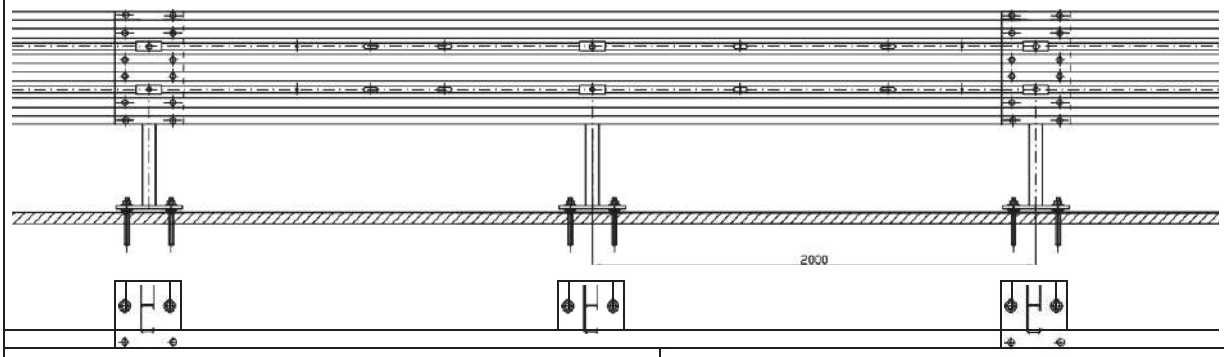


| | | |
|---|---|---|
| **Descrizione del sistema**<br>*System description* | **Passco 3N H2-A-W4 (BW-ES 2.00)** | |
| **Prova iniziale**<br>*Initial Type Testing* | TB11 | TB51 |
| | 0092\ME\HRB\15 | 0091\ME\HRB\15 |
| **Certificazione EU /Produttore**<br>*EU Certificate/Manufacturer* | 1020-CPR-090-036038 | |
| **Caratteristiche materiali del sistema**<br>*Characteristic material of system* | S355JR, S235JR | |
| **Larghezza del sistema [m]**<br>*Construction width* | 0,22 | |
| **Altezza de sistema [m]**<br>*Construction height* | 0,90 | |
| **Lunghezza degli elementi del sistema [m]**<br>*Length of system elements* | 2,00 | |
| **Peso per ml di lunghezza del sisema [kg/m]**<br>*Weight per meter* | 26,0 | |
| **Lughezza dei test [m]**<br>*Tested length* | 60 | |
| **Fondazione del sistema testato**<br>*Tested system foundation* | **su calcestruzzo**<br>*On bridge* | |
| **Osservazioni**<br>*Remarks* | - | |
| **Larghezza del alvoro normalizzata [m]**<br>*Normalised working width* | 1,3 | |
| **Intrusione veicolo normalizzata $VI_N$ [m]**<br>*Normalised vehcile intrusion* | VI5 = 1,7 | |
| **Deflesisone $D_N$ [m]**<br>*Normalised dyn. deflection* | 1,3 | |

| **Livello di contenimento**<br>*Containment level* | **Larghezza di lavoro**<br>*Working width* | **Severità d'urto**<br>*Impact severity* |
|---|---|---|
| **H2** | **W4** | **A** |

## Passco H2-A-W4 (BW-ES 2.00)

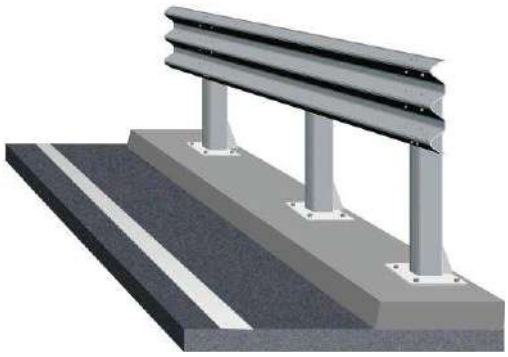

| Parti-Nr. | Quantità per unità | Quantità per metri | Denominazione |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0,25 | Nastri orizzontali 3N |
| 2 | 2 | 0,50 | Pali C120x60x20x778x4 mm con piatto 300x300x15 |
| 3 | 2 | 0,50 | Piastrina 100x40x5 con foro a cerchio per M10 |
| 4 | 2 | 0,50 | Bullone M10x45, 5.8 con dado M10 |
| 5 | 18 | 4,50 | Bullone M16x35, 8.8 con dado M16 |
| 6 | 8 | 2 | Vite M16x195, 8.8 o equivalente |
| 7 | 8 | 2 | Ancorante chimico |
| 8 | 2 | 0,50 | Rondella 25x11,5x4 |
| 9 | 18 | 4,50 | Rondella 40x18x4 |

Infissione pali:

Distanza del palo dal bordo della strada 0,5 m

Altezza del sistema: H = 900 mm +/- 30 mm
Distanza tra i pali: 2,00 m

Disporre i pali con il lato chiuso verso la carreggiata.

Fare un buco per infissare il palo.
Mettere i pali nel buco. Utilizzzare ancorante chimico per fissare.

Installazione dei nastri:

1 x vite M10x45 per connettersi al palo con piastrina M10.

Sovrapporre M16x35 per connettere i nastri

Sovrapporre in direzione del traffico.

Serraggio min. 70 Nm.

## 12. System drawing

## 12. Disegno del sistema

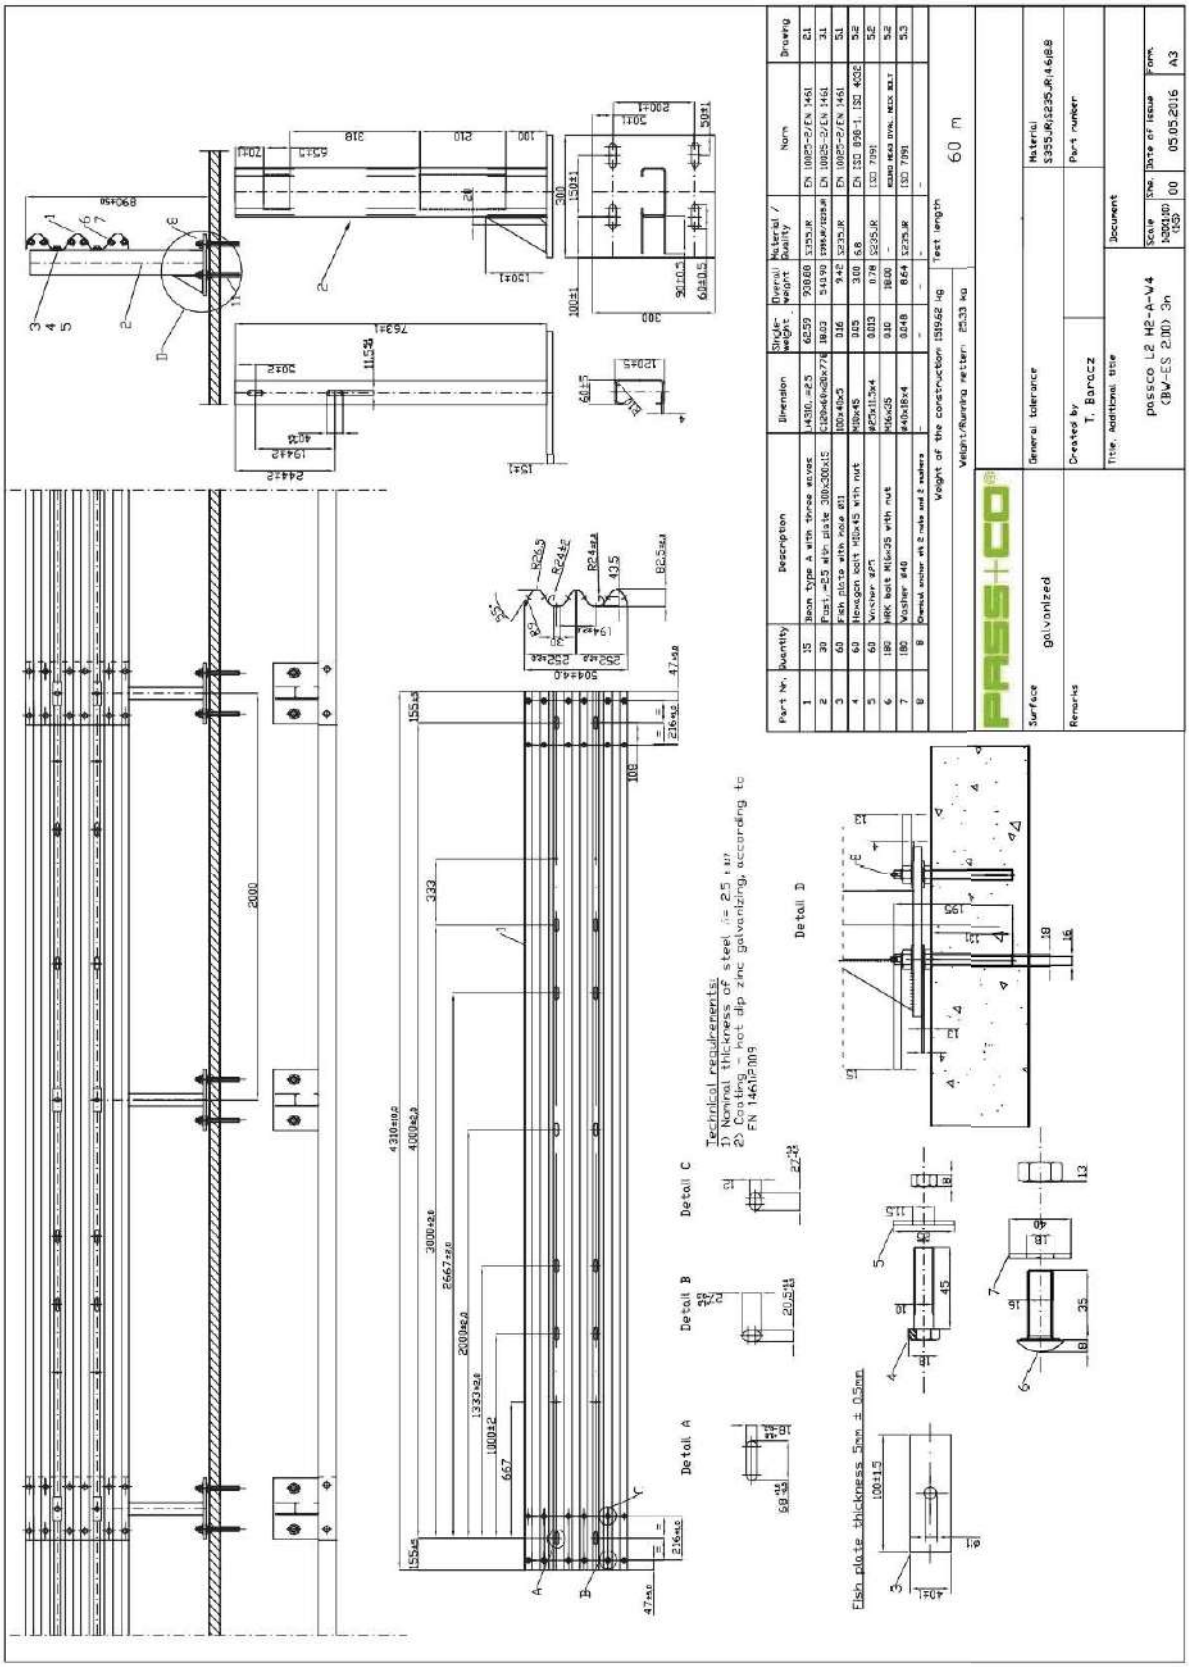


| Part Nr. | Quantity | Description | Dimension | Sticker weight | Overall weight | Material / quality | Norm | Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Beam type A with fence wires | L4310, =2.5 | 60.59 | 908.88 | S355JR | EN 10025-2/EN 1461 | 2.1 |
| 2 | 30 | Post, =2.5 with plate 300x300x15 | C120x60x20x2.5 | 18.03 | 540.90 | S355JR/S235JR | EN 10025-2/EN 1461 | 3.1 |
| 3 | 60 | Fish plate with nose Ø11 | 100x40x5 | 0.16 | 9.42 | S235JR | EN 10025-2/EN 1461 | 5.1 |
| 4 | 60 | Hexagon bolt M8x45 with nut | M8x45 | 0.05 | 3.00 | 6.8 | EN ISO 898-1, ISO 4032 | 5.2 |
| 5 | 60 | Washer Ø25 | Ø25x1.5x4 | 0.013 | 0.78 | S235JR | ISO 7091 | 5.5 |
| 6 | 180 | KRK bolt M16x35 with nut | M16x35 | 0.10 | 18.00 | - | KOMO HEAD DYN. MEC. SLT. | 5.2 |
| 7 | 180 | Washer Ø40 | Ø40x18x4 | 0.048 | 8.64 | S235JR | ISO 7091 | 5.3 |
| 8 | 8 | Chemical anchor M8 2 nuts and 2 washers | - | - | - | - | - | - |

# 13. Single part drawing

## 13. Disegni parti del sistema

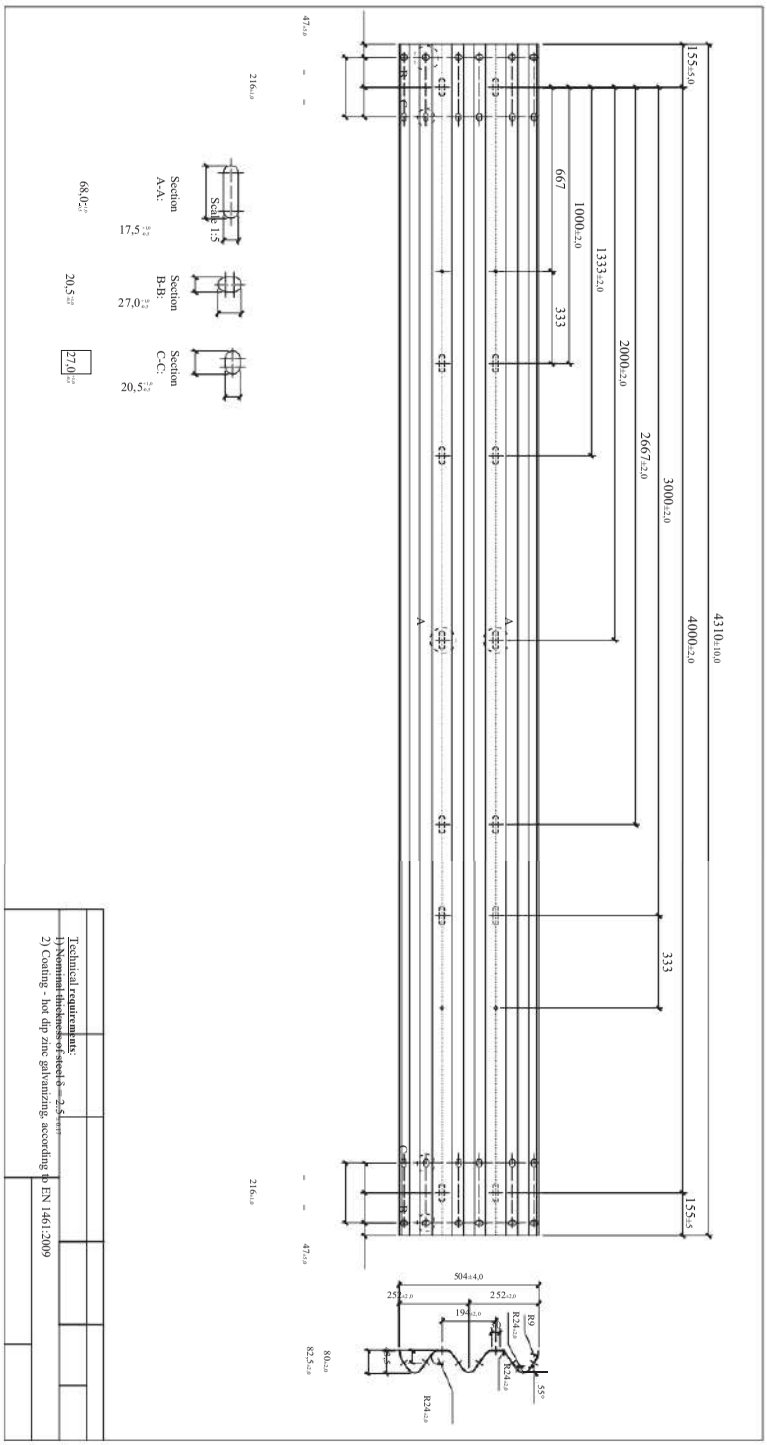

| **14. Part list** | *14. Lista delle diverse parti* |
|---|---|

**Profilo 3N per 4-metri**

***Profile 3N for 4-Meters***

| **Art. Nr**.<br>*Art. No.* | **Articolo**<br>*Description* | **Quantità**<br>*Quantity* |
|---|---|---|
| **1** | **Piastrina M10**<br>*Butt plate M16* | 2,00 |
| **2** | **Bullone M 16 x 35, 8.8, con dado**<br>*Screw M 16 x 35, 8.8, with nut* | 18,00 |
| **3** | **Bullone M 10 x 45, 5.8, con dado**<br>*Screw M 10 x 45, 5.8, with nut* | 2,00 |
| **4** | **Rondella 25x11,5x4**<br>*Washer plate 25x11.5x4* | 2,00 |
| **5** | **Nastri orizzontali, 3N**<br>*Beam type 3N* | 1,00 |
| **6** | **Pali C120x60x20x1630**<br>*Post C120x60x20x1630* | 2,00 |
| **7** | **Rondella 40x18x4**<br>*Washer plate 40x18x4* | 18,00 |
| **8** | **Vite M16x195, 8.8 o equivalente**<br>*Stud bolt M16x195, 8.8. or equivalent* | 8,00 |
| **9** | **Ancorante chimico**<br>*Chemical anchor* | 8,00 |

PASS+CO®

# Declaration of Performance

Product type Nr. VRS H2-BW-ES-2.00-3N

according to Construction Products Regulation Nr. 305/2011

| | |
|---|---|
| Identification code: | **passco H2-A-W4 (BW-ES 2.00) 3N** |
| Serial number: | **passco (BW-ES 2.00) 3N** |
| Intended use: | The Vehicle Restraint System **passco H2-A-W4 (BW-ES 2.00) 3N** is a roadside safety barrier with high containment to be used on structures. |
| Manufacturer: | PASS+CO INTERNATIONAL GmbH<br>Grube Neue Haardt 8<br>57076 Siegen<br>Germany |
| Manufacturer of parts/elements: | LINDEM Sp: z o.o.<br>ul. Partyzantów 4<br>42-300 Myszkow/Poland |
| System of assessment and verification of constancy of performance: | System 1 |
| Harmonized Standard: | EN 1317-5:2007 + A2:2012/AC:2012 |
| Notified Body: | TZUS Prag<br>Prosecká 811/76a<br>190 00 Prag 9 – Prosek, CZ |
| EU Identification number: | 1020 |
| Ref. No. of Certificate of Constancy of Performance: | 1020-CPR-090-036038 |

| Declared performance: | H2-A-W4 |
|---|---|
| Essential characteristics | Performance |
| Containment level: | H2 |
| Impact severity: | A |
| | |
| Normalised working width H2: | $W_N$ = 1,3 m (W4) |
| | |
| Normalised dynamic deflection H2: | $D_N$ = 1,3 m |
| Normalised vehicle intrusion H2: | VI5 = 1,7 m |
| Resistance to snow removal: | NPD |
| Durability: | S355JR/S235JR, galvanized acc. to EN ISO 1461 resp. weather resistant structural steel S355JOW/S355J2W/P The expected working life span of the VRS is 25 years. The real life span, however, depends on parameters on which the manufacturer has no influence. |
| Assembly conditions: | 1.) The assembly must follow the assembly manual of PASS+CO.<br>2.) Only completely installed VRS may be put into operation. |
| The manufacturer hereby declares that the performance of product No. VRS H2-BW-ES-2.00-3N is in conformity with the declared performance in this declaration. | |
| Signed for and on behalf of the manufacturer by: | PASS+CO® INTERNATIONAL GMBH Grube Neue Haardt 8 57076 Siegen |
| | Wilnsdorf, 20.07.2020 |
| J. M. Hiekmann (General Manager) | (place and date of issue) |

# PASS+CO® *Dichiarazione di prestazione*

Tipo di prodotto Nr: VRS H2-BW-ES-2.00-3N

secondo Regolamentazione prodotti da costruzione Nr: 305/2011

| | |
|---|---|
| Codice identificativo: | **passco H2-A-W4 (BW -ES 2.00) 3N** |
| Numero seriale: | **passco (BW-ES 2.00) 3N** |
| Uso previsto: | Il Sistema di ritenuta del veicolo (SRV) **passco H2-A-W4 (BW-ES 2.00) 3N** è una barriera di sicurezza stradale ad alto contenimento da utilizzare su calcestruzzo. |
| Produttore: | PASS+CO INTERNATIONAL GmbH<br>Grube Neue Haardt 8<br>57076 Siegen<br>Germania |
| Produttore di parti/elementi: | LINDEM Sp.: z o.o.<br>ul. Partyzantòw 4<br>42-300 Myszkow/Polonia |
| Sistema di assestamento e verificazione di costanza della prestazione: | Sistema 1 |
| Standard armonizzato: | EN 1317-5:2007 + A2:2012/AC:2012 |
| Corpo notificato: | TZUS Praga<br>Proseckà 811/76a<br>190 00 Praga 9-Prosek, CZ |
| Numero d'identificazione UE: | 1020 |
| Rif. del certificato di costanza della prestazione: | 1020-CPR-090-036038 |
| Prestazione dichiarata: | H2-A-W4 |
| Caratteristiche essenziali | Prestazione |
| Livello di contenimento: | H2 |
| Severità d'urto: | A |
| Larghezza di lavoro normalizzata H2: | $W_n$=1,3 m (W4) |
| Deflessione H2: | $D_n$=1,3 m |
| Intrusione veicolo normalizzata H2: | VI5=1,7 m |
| Resistenza rimozione neve: | NPD |
| Durabilità: | S355JR/S235JR, zincato secondo EN ISO 1461<br>acciaio corten S355JOW/S355J2W/P.<br>L'aspettativa di durabilità di SRV è di 25 anni.<br>La vera durabilità dipende, comunque da parametri su cui il produttore non ha alcuna influenza. |
| Condizioni di assemblaggio: | 1.) L'assemblaggio deve seguire il Manuale d'installazione PASS+CO.<br>2.) Solo SRV completamente installati possono essere messi in funzione. |
| Con la presente, il produttore dichiara che la prestazione del prodotto No. VRS H2-BW -ES -2.00-3N è conforme alle prestazioni dichiarate in questa dichiarazione. | |
| Firma per e per conto del produttore da: | |
| | |
| | Wilnsdorf, 20.07.2020 |
| J.M. Hiekmann (General Manager) | (Luogo e data emissione) |

® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán • Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body • Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Notified Body 1020

# CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

No. 1020 – CPR – 090-036038

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

## ROAD RESTRAINT SYSTEM

variant : bridge steel safety barrier one-sided

## Passco L2 H2-A-W4 (BW-ES 2.00) 3N

| | |
|---|---|
| Level of restraint | **H2** |
| Impact intensity | **A** |
| Normalised working width | **W4** |
| Normalised vehicle intrusion | **VI5** |
| Snow removal | **NPD** |

**An integral part of this certificate is annex where is specified modifications of road restraint system Passco L2 H2-A-W4 (BW-ES 2,00) 3N.**

placed on the market under the name or trade mark of

## PASS+CO INTERNATIONAL GmbH

Identification No.: DE811750759
Address: Grube Neue Haardt 8, 57076 Siegen, Germany

and produced in the manufacturing plant

## Zakład Produkcyjny LINDEM Sp. z o.o.

Identification No.: NIP: 899-27-52-812
Address: ul. Partyzantów 4, 42-300 Myszków/Poland

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

**EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012**

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

**constancy of performance of the construction product.**

This certificate was first issued on 13.06.2016 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

The stamp of the Notified Body 1020
Prague, 16 July 2020

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Oznámený subjekt 1020

Martin Pešek
Deputy Manager of the Notified Body

# Annex to certificate No. 1020 – CPR – 090-036038

## List of modification system Passco L2 H2-A-W4 (BW-ES 2.00) 3N

Modification 1: Equivalence of unalloyed structural steel S355JR and weather resistant structural steel COR-TEN B S355J2W/J0WP

The mechanical properties of the weather resistant structural steel hardly differ from similar unalloyed structural steels. Equivalent usage of unalloyed structural steel S355JR and weather resistant structural steel COR-TEN B S355J2W/J0WP is possible for the above mentioned product.

The stamp of the Notified Body 1020
Prague, 16 July 2020

Martin Pešek
Deputy Manager of the Notified Body

Firmato digitalmente da:

RICCARDO BUONCOMPAGNI

**LUOGO:** *Agugliano* **DATA:** *25.02.2025*

NON STAMPARE SE NON NECESSARIO

ADRIATICA STRADE

# DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE

**Art. 5, D.M. 2367/2004**

Il sottoscritto installatore Buoncompagni Riccardo domiciliato in via delle Genziane n.20 - 63100 Ascoli Piceno (AP), numero di telefono 3356840405 – C.F. BNCRCR70M16A271Q, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa Adriatica Strade s.r.l. con sede in loc. la Chiusa s.n.c. - 60020 Agugliano (AN), telefono/fax sede Agugliano 071906161, telefono/fax sede Ascoli Piceno 0736336052, avendo eseguito l'installazione di:

## DESCRIZIONE PRODOTTO

| Prodotto | Quantità | Classe | Applicazione | Produttore | N.Certificato |
|---|---|---|---|---|---|
| 3N H2-A-W4 (BW ES 2.00) | 168 | H2 | Manufatto | Pass+co | 1020-CPR-090-036038 |
| 3N H2-A-W4 (ES 2.66) | 60 | H2 | Rilevato | Pass+co | 1020-CPR-090-047652 |

## RIFERIMENTI CANTIERE

| | |
|---|---|
| **DENOMINAZIONE** | *Posa in opera barriere stradali di sicurezza* |
| **STAZIONE APPALTANTE** | *Provincia di Ancona* |
| **IMP. APPALTATRICE** | *Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l.* |
| **INSTALLATORE** | *Adriatica Strade s.r.l.* |
| **UBICAZIONE** | *Ponte San Lorenzo In Campo, PU* |
| **CIG** | *933605437C* |
| **CUP** | |

per i materiali dal sottoscritto installati, ovvero installati da personale specializzato operante sotto la sua supervisione, di cui il sottoscritto si fa garante, consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i. in caso di dichiarazioni attestanti fatti non rispondenti al vero, sotto la propria personale responsabilità,

**DICHIARA**

di aver correttamente posato in opera i prodotti sopra elencati nel pieno rispetto delle prescrizioni, informazioni, modalità di installazione/posa e condizioni di impiego previste dal produttore del prodotto/materiale e secondo le istruzioni da questo fornite, in accordo e nel rispetto del campo di applicazione previsto dal rapporto di classificazione ed eventuale Fascicolo Tecnico.

**DICHIARA ALTRESÌ**

**FIRMA DIRETTORE LAVORI** **FIRMA INSTALLATORE**

NON STAMPARE SE NON NECESSARIO

**LUOGO:** *Agugliano* **DATA:** *25.02.2025*

che la verifica di cui sopra è stata effettuata in contraddittorio con la committenza, nella persona del Direttore Lavori (il quale sottoscrive).

**FIRMA DIRETTORE LAVORI**

Firmato digitalmente da

**GABRIELE DEZI**

Data e ora della firma: 26/02/2025 15:23:03

**FIRMA INSTALLATORE**
